大新县城区防洪排涝排水工程（城西片区）工程一期项目

岩土工程详细勘察方案

项目负责人：　覃峭

编　　写：农华强

审　　核：莫家里

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

工程勘察专业类（岩土工程）甲级 证书编号：B245015689

编制日期：二〇二五年九月

目　录

1 工程概况 1

2 拟建场地环境、工程地质条件、附近参考地质资料 1

2.1 拟建场地环境 1

2.2 拟建场地工程地质条件 1

3 勘察目的、任务要求及需解决的主要技术问题 2

3.1 勘察目的、任务要求 2

3.2 需解决的主要技术问题 3

4 执行技术标准 3

5 选用的勘探方法 4

6 勘察工作布置 4

6.1 勘探点布置原则 4

6.2 原位测试和布置原则 5

6.3 勘探点测量要求 5

6.4 取样的要求 6

6.5 室内岩、土（水）试验内容、方法、数量 9

6.6 预计工作量 10

7 勘探完成后现场处理 10

8 拟采取的质量控制、安全保证和环境保护措施 10

8.1 拟采取的质量控制措施 10

8.2 拟采取的安全保证措施.....11
8.3 拟采取的环境保护措施.....12
9 拟投入的仪器设备、人员安排、勘察进度计划.....13
9.1 拟投入的仪器设备.....13
9.2 拟投入的人员安排.....13
9.3 勘察进度计划.....14
10 勘察安全、技术交底及验槽等后期服务.....14
10.1 勘察安全交底.....14
10.2 勘察技术交底.....15
10.3 验槽等后期服务.....15
11、拟建工程勘探点平面位置图.....15

附图：

1、建筑物和勘探点位置图……1 张

1 工程概况

拟建大新县城区防洪排涝排水工程(城西片区)工程一期项目位于大新县桃城溪（朝阳沟）桩号 K0+000～K0+842 鸡鸭市场后居民区，桃城溪（朝阳沟）桩号 K0+842～K1+450 一中桥头居民区，桃城溪（朝阳沟）桩号 K1+660～K1+920 文昌阁。拟新建 DN200mm 排水管约 109.00m，DN300～DN500mm 排水管约 6900m，DN1000mm 雨水管约 235.00m。管顶最小覆土深度按 0.70m 控制：人行道或非车行道下 0.6m，车行道下 0.7m；深度不足时采取混凝土包封加固保护措施。管材采取硬聚氯乙烯（PVC-U）管、高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管、钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管、II 级钢筋混凝土管等。拟采用明挖施工，设计承载力 120kPa。

受大新县住房和城乡建设局的委托，我公司承担了该项目的岩土工程详细勘察工作。

2 拟建场地环境、工程地质条件、附近参考地质资料

2.1 拟建场地环境

拟建场地位于崇左市大新县，属喀斯特岩溶地貌单元，现场地大部分较为平整。拟建场地处于乡镇区，周边道路及建筑物一般，高空架空线路较多。场地复杂程度一般。

2.2 拟建场地工程地质条件

经现场踏勘，结合区域地质资料及附近工程揭露地层显示，初步判断场地内的岩土层主要为第四系全新统人工填土层①素填土（Q_4^{ml}）、第四系全新冲洪积层②黏土（Q_4^{al+pl}）；下伏基岩为泥盆系③灰岩（D_2d^2）层，根据场地的地貌特点、岩土成因类型、风化程度及其物理力学特征，对场地内的岩土层进行初步划分，分述如下：

①素填土（Q_4^{ml}）：黄褐色，稍湿，主要由粘性土新近回填，结构松散，空隙大，人工堆积形成，堆积年限不超过五年，尚未完成自重固结，为新近人工填土。

②黏土（Q_4^{al+pl}）：黄色、黄褐色，硬塑状，致密状结构，主要由黏粒组成，刀切面光滑有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应。

③$_1$灰岩（D_2d^2）：灰白色，深灰色，强风化，较破碎。隐晶质结构，中厚层状构造，岩芯较破碎，裂隙发育，局部有明显溶蚀痕迹，方解石脉发育。

③$_2$灰岩（D_2d^2）：灰白色，深灰色，中风化，较完整，隐晶质结构，中厚层状构造，岩芯多呈短柱状，局部发育细微裂隙，岩芯相互敲击声音较清脆。

3 勘察目的、任务要求及需解决的主要技术问题

3.1 勘察目的、任务要求

本次勘察要求详细查明拟建管道沿线及其附属设施的水文地质及工程地质条件，为设计提供所需的各岩土层的物理力学性质指标及参数，并提出工程处理措施建议。本次勘察工作的主要任务是：

（1）查明勘察范围内的不良地质作用的分布、规模、成因，分析发展趋势，评价其对拟建场地的影响，提出防治措施的建议；

（2）查明场地地层结构及其物理、力学性质；

（3）查明特殊性岩土、河湖沟坑及暗浜的分布范围，调查工程周边环境条件，分析评价其对设计与施工的影响；

（4）查明地下水埋藏条件及其和地表水的补排关系，提供地下水位动态变化规律，根据需要分析评价其对工程的影响；

（5）判定水、土对工程材料的腐蚀性；

（6）对场地和地基的地震效应进行评价，提供抗震设计所需的有关参数；

（7）根据需要，对地基工程性质、边坡稳定性等进行分析与评价；

（8）对设计与施工中的岩土工程问题进行分析评价，提供岩土工程技术建

议和相关岩土参数；

（9）分析评价地下水对工程设计、施工的影响，提供地下水控制所需地层参数，并评价地下水控制方案对工程周边环境的影响。

3.2 需解决的主要技术问题

1、填土层难以采取原状土样进行土工试验，取样难具代表性，其物理力学指标系依据原位测试数据应结合附近的工程经验综合确定。

2、开挖揭露溶洞时，如果为浅层溶洞可直接用毛石混凝土回填至设计标高，遇深层溶洞时建议进行压力灌浆处理。

4 执行技术标准

本次勘察工作执行的规程、规范和技术标准为：

1.《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009 年版）；

2.《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）；

3.《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）；

4.《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）；

5.《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）；

6.《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）；

7.《建筑抗震设计规范》（GB/T 50011-2010）（2024 年版）；

8.《建筑与市政地基基础通用规范》（GB 55003-2021）；

9.《土工试验方法标准》（GB/T 50123-2019）；

10.《岩土工程勘察安全标准》（GB/T 50585-2019）；

11.《岩溶地区建筑地基基础技术标准》（GB/T 51238-2018）；

12.《广西壮族自治区岩土工程勘察规范》（DBJ/T45–066-2018）；

13.《广西建筑地基基础设计规范》（DBJ45/003-2015）；

14.《广西岩溶地区建筑地基基础技术规范》（DBJT45-2016）；

15.《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）；；

16.《市政工程勘察规范》（CJJ 56-2012）；

17. 其他的相关规范、规程。

5 选用的勘探方法

本次勘察以收集区域地质资料、野外地质测绘和调查，钻孔回填采用水泥砂浆回填封闭。

①钻探：现场钻探采用 GY200 型工程钻机钻进，根据不同地层采用回转或冲击钻进，严格遵守《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T 87-2012），钻孔孔径 91～130mm。

6 勘察工作布置

6.1 勘探点布置原则

本次勘察勘探点是根据《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）（2009 年版）、《市政工程勘察规范》（CJJ 56-2012）等规范相关条款和设计要求结合本工程实际，管线勘探点主要沿管线中轴线位置、转角处、连接处及工作井，本次勘察共布置钻孔 96 个，详细见勘探点布置图。

6.1.1 勘探孔深度

拟建项目勘探点深度要求：本项目为管网工程，明挖管道勘探孔深度应满足开挖、地下水控制、支护设计及施工的要求，且应达到管底设计高程以下不少于 3m；非开挖敷设管道，勘探孔深度应达到管底设计高程以下 5m～10m；当

基底下存在松软土层、厚层填土和可液化土层时，勘探孔深度应适当加深。预计钻孔平均深度 12.00m，本工程预计总进尺约 1152m。

钻孔验收、岩芯拍照后，进行钻孔回填和孔口封孔。

6.2 原位测试和布置原则

6.2.1 原位测试方法及布置原则

本次勘察拟在黏性土进行标准贯入试验，每层土不少于 6 次；在填土、破碎岩进行重型动力触探试验，每层土连续动探 0.5m 以上。

6.3 勘探点测量要求

（1）测量负责人应根据勘察大纲的要求选择适用的测量设备；

（2）勘探点测放工作程序为：测量放点前准备→基准点检查→现场测放→成果检验→测量成果移交；

（3）勘探点的测放精度应满足以下要求：

详细勘察阶段：平面位置允许偏差 $_{0}^{+0.25m}$，高程允许偏差±0.05m；对于可行性勘察阶段，城市规划勘察阶段、选址勘察阶段：可利用适当比例尺的地形图依地形地物特征确定勘探点位和孔口高程。

勘探点位应设置有编号的标志桩。开钻或掘进之前应按设计要求核对桩号及其实地位置，两者必须相符。水域勘探点位可设置浮标，并应采用测量仪器等方法，按孔位坐标定位。

（4）当调整勘探点位时，应将实际勘探孔位置及时标明在平面图上，并应注明与原孔位的偏差距离、方位和高差，必要时应重新测定孔位和高程。

（5）测量放点时应有勘察现场负责人同时在场检查，并对现场测量成果进

行签字确认；

（6）测量成果的移交应由勘察项目负责人进行签字确认。

6.4 取样的要求

6.4.1 取样方法和取样器选择

（1）对黏性土，采用锤击法，用薄壁取土器取土，土试样质量等级不低于II级；

（2）对岩石，可利用钻探岩芯制作。采用的毛样尺寸应能满足试块加工的要求。

6.4.2 取岩样及其保护运输要求

（1）对于软质岩石试样，应采用纱布条蜡封或黏胶带立即密封；对于硬质岩石试样，采用黏胶带密封；

（2）岩样标签应记载下列内容：

a、工程名称或编号；

b、孔（井、槽、洞）号、岩样编号、取样深度、岩石试验名称、颜色和状态；

c、取样日期；

d、取样人姓名；

（3）运输岩石试样，应采用专用岩样箱包装，试样之间用软柔缓冲材料填实。

（4）岩石试样采取之后至开始土工实验之间的储存时间，不宜超过两周。

6.4.3 取土样及其保护运输要求

（1）钻孔取土器提出地面之后，应小心地将土样连同容器（衬管）卸下，并应符合下列规定：

a、对于以螺钉连接的薄壁管，卸下螺钉后可立即可取下取样管；

b、对以丝扣连接的取样管、回转型取土器，应采用链钳、自由钳或专用扳手卸开，不得使用管钳之类易于使土样受挤压或使取样管受损的工具；

c、采用外管非半合管的带衬管取土器时，应使用推土器将衬管与土样从外管推出，并应事先将推土端土样削至略低于衬管边缘，防止推土时土样受压；

d、对各种活塞取土器，卸下取样管之前应打开活塞气孔，消除真空。

（2）对钻孔中采取的Ⅰ级原状土试样，应在现场测定取样回收率。使用活塞取土器取样回收率大于 1.0 或小于 0.95 时，应检查尺寸量测是否有误，土样是否受压，根据情况决定土样废弃或降低级别使用。

（3）采取的土试样应密封，密封可选用下列方法：

a、方法一、在钻孔取土器中取出土样时，先将上、下两端各去掉约 20mm，再加上一块与土样截面面积相当的不透水圆片，然后浇灌蜡液至与容器端齐平，待蜡液凝固后扣上胶皮或塑料保护帽；

b、方法二：取出土样用配合适当的盒盖将两端盖严后，将所有接缝用纱布条蜡封封口。

c、方法三：采用方法一密封后，再用方法二密封。

（4）每个土样封蜡后均匀填贴标签，标签上下应与土样上下一致，并牢固的粘贴于容器外壁。土样标签应记载下列内容：

a、工程名称或编号；

b、孔（井、槽、洞）号、岩土样编号、取样深度、岩土试验名称、颜色和

状态；

c、取样日期；

d、取样人姓名；

e、取土器型号、取样方法、回收率等。

（5）试样标签记载应与现场钻探记录相符，取样的取土器型号、取样方法、回收率等应在现场记录中详细记载。

（6）采取的岩土试样密封后应置于温度及湿度变化小的环境中，不得暴晒或冰冻。土试样应直立放置，严禁倒放或平放。

（7）运输土试样，应采用专用土样箱包装，试样之间用软柔缓冲材料填实。

（8）对易于振动液化、水分离析的砂土试样，宜在现场或就近进行试验，并可采用冰冻法保存和运输。

（9）土试样采取之后至开始土工实验之间的储存时间，不宜超过两周。

6.4.4 取水样及其保护运输要求

采取水样应符合下列规定：

（1）采取的水试样应代表天然条件下的水质情况；

（2）当有多层含水层时，应做好分层隔水措施，并应分层采取水样；

（3）取水试样前，应洗净盛水容器，不得有残留物质；

（4）取水试样过程中，应尽量减少水试样的暴露时间，及时封口；对需测定成分的水样时，应及时加入稳定剂；

（5）采取水试样后，应做好取样记录，记录内容应包括取样时间、孔号、取样深度、取样人、是否加入稳定剂等；

（6）水试样应及时送验，放置时间应符合试验项目的相关要求。（水试样应

及时试验，清洁水放置时间不宜超过 72 小时，稍受污染的水不宜超过 48 小时，受污染的水不宜超过 12 小时。）

6.5 室内岩、土（水）试验内容、方法、数量

6.5.1 室内岩样试验内容、方法、数量

（1）室内岩样试验内容： 抗压强度。

（2）室内岩样试验方法：对硬质岩做饱和单轴抗压强度试验；对软岩做天然单轴抗压强度试验。

（3）室内岩样试验数量：每一层岩样试验数量不少于 6 组。

6.5.2 室内土样试验内容、方法、数量

（1）室内土样试验内容：常规试验、膨胀试验、颗分、饱和直剪固快试验、三轴、土易溶盐等。

（2）室内土样试验方法：含水率（烘干法）、密度（环刀法）、比重（比重瓶法）、液限（圆锥仪法）、塑限（搓条法）、颗粒分析（筛分法、密度计法）、压缩（固结仪）、剪切（直剪、三轴）。

（3）室内土样试验方法的数量：每一土层试验数量不应少于 6 组，且每栋建筑每一主要土层的土试样不少于 2 件。

6.5.3 室内水样试验内容、方法、数量

（1）室内水样试验内容：工程水分析。

（2）室内水样试验方法：化学分析。

（3）室内水样试验数量：每层水不少于 2 件。

6.6 预计工作量

预计工作量情况一览表　　表 6.6-1

外业部分				内业部分			
序号	项目名称	单位	数量	序号	项目名称	单位	数量
1	钻孔	个	96	1	常规试验	组	35
2	预计进尺	米	1152	2	直剪试验	组	35
3	标准贯入试验	次	35	3	土易溶盐试验	组	4
4	重型动力触探试验	米	30	4	不固结不排水剪 UU	组	6
5	取原状土样	件	35	5	岩石点荷载试验	组	18
6	取岩样	组（件）	35	6	岩石单轴抗压试验	组	18
7	剪切波速测试	组	6	7	膨胀试验	组	6
8	测量放点	点	96				

7 勘探完成后现场处理

勘察作业完成后，应及时用废岩芯或黏土球对钻孔进行封填，并应及时处理废浆、废岩土芯、废油料、生活垃圾等，把整洁的场地环境交给业主。

8 拟采取的质量控制、安全保证和环境保护措施

我司已通过国家 ISO 9001:2016 质量管理体系,ISO 14001:2016 环境管理体系，GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系标准的认证及广西壮族自治区计量资质认证。我们将认真贯切执行公司的管理方针：“以人为本，保护环境；打造精品，顾客满意”。

8.1 拟采取的质量控制措施

针对本工程的特点，我们制定了科学严密的质量保证措施，具体见下表 8.1：

表 8.1　　质量控制措施一览表

人员组织	投入理论扎实、实践经验丰富的技术人员，作为本项勘察的实施者。
主要技术组织措施	坚持“三环节管理”和质量第一的原则，当质量和进度发生矛盾时，以质量为重，做好进度管理。野外作业与室内作业交叉进行，坚持加班加点，按时按质并力争提前提交最终勘察成果。
遵循的规程、规定或作业指导书	严格遵循我国现行有关规范、规程如《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001 2009 年版），以及我公司 ISO9001：2016 质量体系中的《岩土工程勘察控制程序》、《岩土工程检测控制程序》等质量体系文件，保证野外记录的准确性、完整性、科学性。
质量保证措施	严格按照我国现行有关规范、规程及工程建设标准强制性条文的规定以及我司 ISO9001 质量体系文件对勘察的全过程进行质量控制，最终成果的提交要经过五道工序进行过程控制，保证勘察报告符合合同和标准要求。勘察报告的编制和图表的绘制均采用计算机辅助完成，保证按时按质地向建设单位提供满意的勘察产品并保证满足设计及审图要求，在后续设计和施工的过程中，对我司的勘察成品进行全方位的跟踪服务，务必做到业主满意、设计满意、施工满意。

8.2 拟采取的安全保证措施

安全生产是根本，在我公司以往的施工过程，我们始终将安全放在第一位，每一个工程的实施，首要任务就是要明确安全责任制，并对施工人员进行必要的安全教育后方可进场施工。针对本工程的特点，我们制定了以下安全控制措施：

（1）施工前对施工人员进行三级安全教育，层层落实安全责任；

（2）进入施工现场人员必须戴安全帽；

（3）空中作业必须戴安全带，不得穿拖鞋施工；

（4）机械操作人员严格按操作要求进行；

（5）严禁野蛮施工，机械及电器设备出现故障应及时检修，不许带病运行；

（6）酗酒、吵架、情绪不稳定者不得上岗施工；

（7）严禁在施工现场宿舍内乱拉电线，烧电炉；

（8）凡有高血压、恐高症者不得进行高空作业；

（9）在施工现场应悬挂安全施工标志；

（10）现场负责人及公司安全部门不定期进行工地检查，对存在的问题及时处理，杜绝安全隐患。

8.3 拟采取的环境保护措施

针对本项目特点，制定以下环境保护措施：

（1）严禁在未探明地下管线准确位置前盲目施工；

（2）勘察作业现场钻探所用泥浆应设置排水沟、沉淀池；

（3）钻探孔用废弃岩芯或黏土球回填封孔；

（4）钻探设备和机动车辆做好尾气年检，按期维护保养，减少尾气排放；

（5）进入施工现场车辆严禁鸣笛，减少噪声；并应低速慢行，以减少扬尘；

（6）勘察作业现场严禁焚烧各类废弃物；

（7）勘察作业期间，生活废水和垃圾不得随意排放及丢弃，应集中堆放，及时处理；

（8）废弃岩土芯应及时清理，转运至土方消纳场；

（9）废油及含油废物要收集好并统一妥善处理；

（10）尽可能少的减少对植被的破坏；

（11）进场的人员应树立起环境保护意识，做到人人爱护环境，自觉保护环境。

9 拟投入的仪器设备、人员安排、勘察进度计划

9.1 拟投入的仪器设备

根据本次勘察的计划工作量和工期要求，拟投入本项目的主要设备有：GY-200 型工程钻机 4 台，工程测量 GPS-RTK 或全站仪，土工试验设备全套。为保证工程按期完成，实际施工时根据工程进度及时调整机械数量和类型。

9.2 拟投入的人员安排

本项目设总负责人 1 名，负责全过程的质量、安全及工期。总负责人根据工程需要安排现场施工人员和内业整理人员。现场施工人员应包括：

（1）现场负责人 1 名，负责协调施工现场各方关系，保证施工顺利进行；

（2）现场技术员 4 名，负责现场施工过程中的技术工作；

（3）测量工程师 1 名，负责钻孔的测放工作；

（4）钻探班组 4 个，每班组 3 个人：1 个班组长，负责本班组的钻探施工管理工作；3 个持证上岗工人，负责具体钻探工作。

内业整理人员应包括：

（1）试验负责人，负责室内试验的工作安排并及时提交试验报告；

（2）报告编写人，负责收集整理资料，对数据进行分析计算，并编写勘察报告；

（3）报告校核人，负责勘察报告的校核工作；

（4）报告审核人，负责勘察报告的审核工作；

（5）报告审定人；负责勘察报告的审定工作。

9.3 勘察进度计划

本次勘察按建设单位要求结合现场的具体情况进行，从进场野外钻探至提供合格的岩土工程勘察报告，预计总工期 45 天：其中野外作业 30 天，室内土工试验 7 天，勘察报告编写、校对、审核、审定、打印、晒图、装订等 8 天。以上部分工作可交叉进行。

10 勘察安全、技术交底及验槽等后期服务

10.1 勘察安全交底

野外勘探进场前，对进场人员进行三级安全教育后方可开始施工。

教育包括安全基本知识、法规法制教育，主要内容有：

（1）国家和地方的安全生产方针、政策；

（2）安全生产法规、标准和规范；

（3）本单位安全生产规章制度；

（4）发生事故后如何抢救伤员、排险、保护现场和及时报告。

工程项目组安全教育包括现场规章制度和遵章守纪教育，主要内容有：

（1）本单位施工特点及施工安全基本知识；

（2）本单位安全生产制度、规定及安全注意事项；

（3）本工程的安全技术操作规程；

（4）高处作业、机械设备、电气安全基础知识；

（5）防尘、防火、防暴、防毒知识及紧急情况安全处置和安全疏散知识；

（6）防护用品发放标准及防护用口用具使用的基本知识。

班组安全教育包括本工种岗位安全操作及班组安全制度、纪律教育，主要

内容有：

（1）本班组作业特点及安全操作规程；

（2）班组安全活动制度及纪律；

（3）爱护和正确使用防护装置（设施）及个人劳动防护用品

（4）本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策；

（5）本岗位的作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求。

10.2 勘察技术交底

（1）每回次钻进深度要求小于 2 米，钻探编录要注意土层分层深度并详细记录每层岩土的颜色、状态、密实度和包含物等。

（2）控制性钻孔孔深进入稳定地层 8m 以上，一般性钻孔钻孔进入稳定地土层 5m 以上，当有大面积地面堆载或软弱下卧层时，应适当加深控制性勘探孔的深度，在上述规定深度内遇基岩或厚层碎石土等稳定地层时，勘探孔深度可适当调整。

10.3 验槽等后期服务

按照我公司质量方针之一 “打造精品、顾客满意”，我们将对勘察产品进行全方位的后期跟踪服务，包括：提供中间报告（如果业主需要）；施工期间的技术咨询；地基验槽；基础验收；竣工验收等，保证为使用我公司勘察产品的用户提供周到满意的服务。


11、拟建工程勘探点平面位置图

附图：建筑物和勘探点位置图。

N

建筑（构）物与勘探点平面位置图

比例尺 1:1100

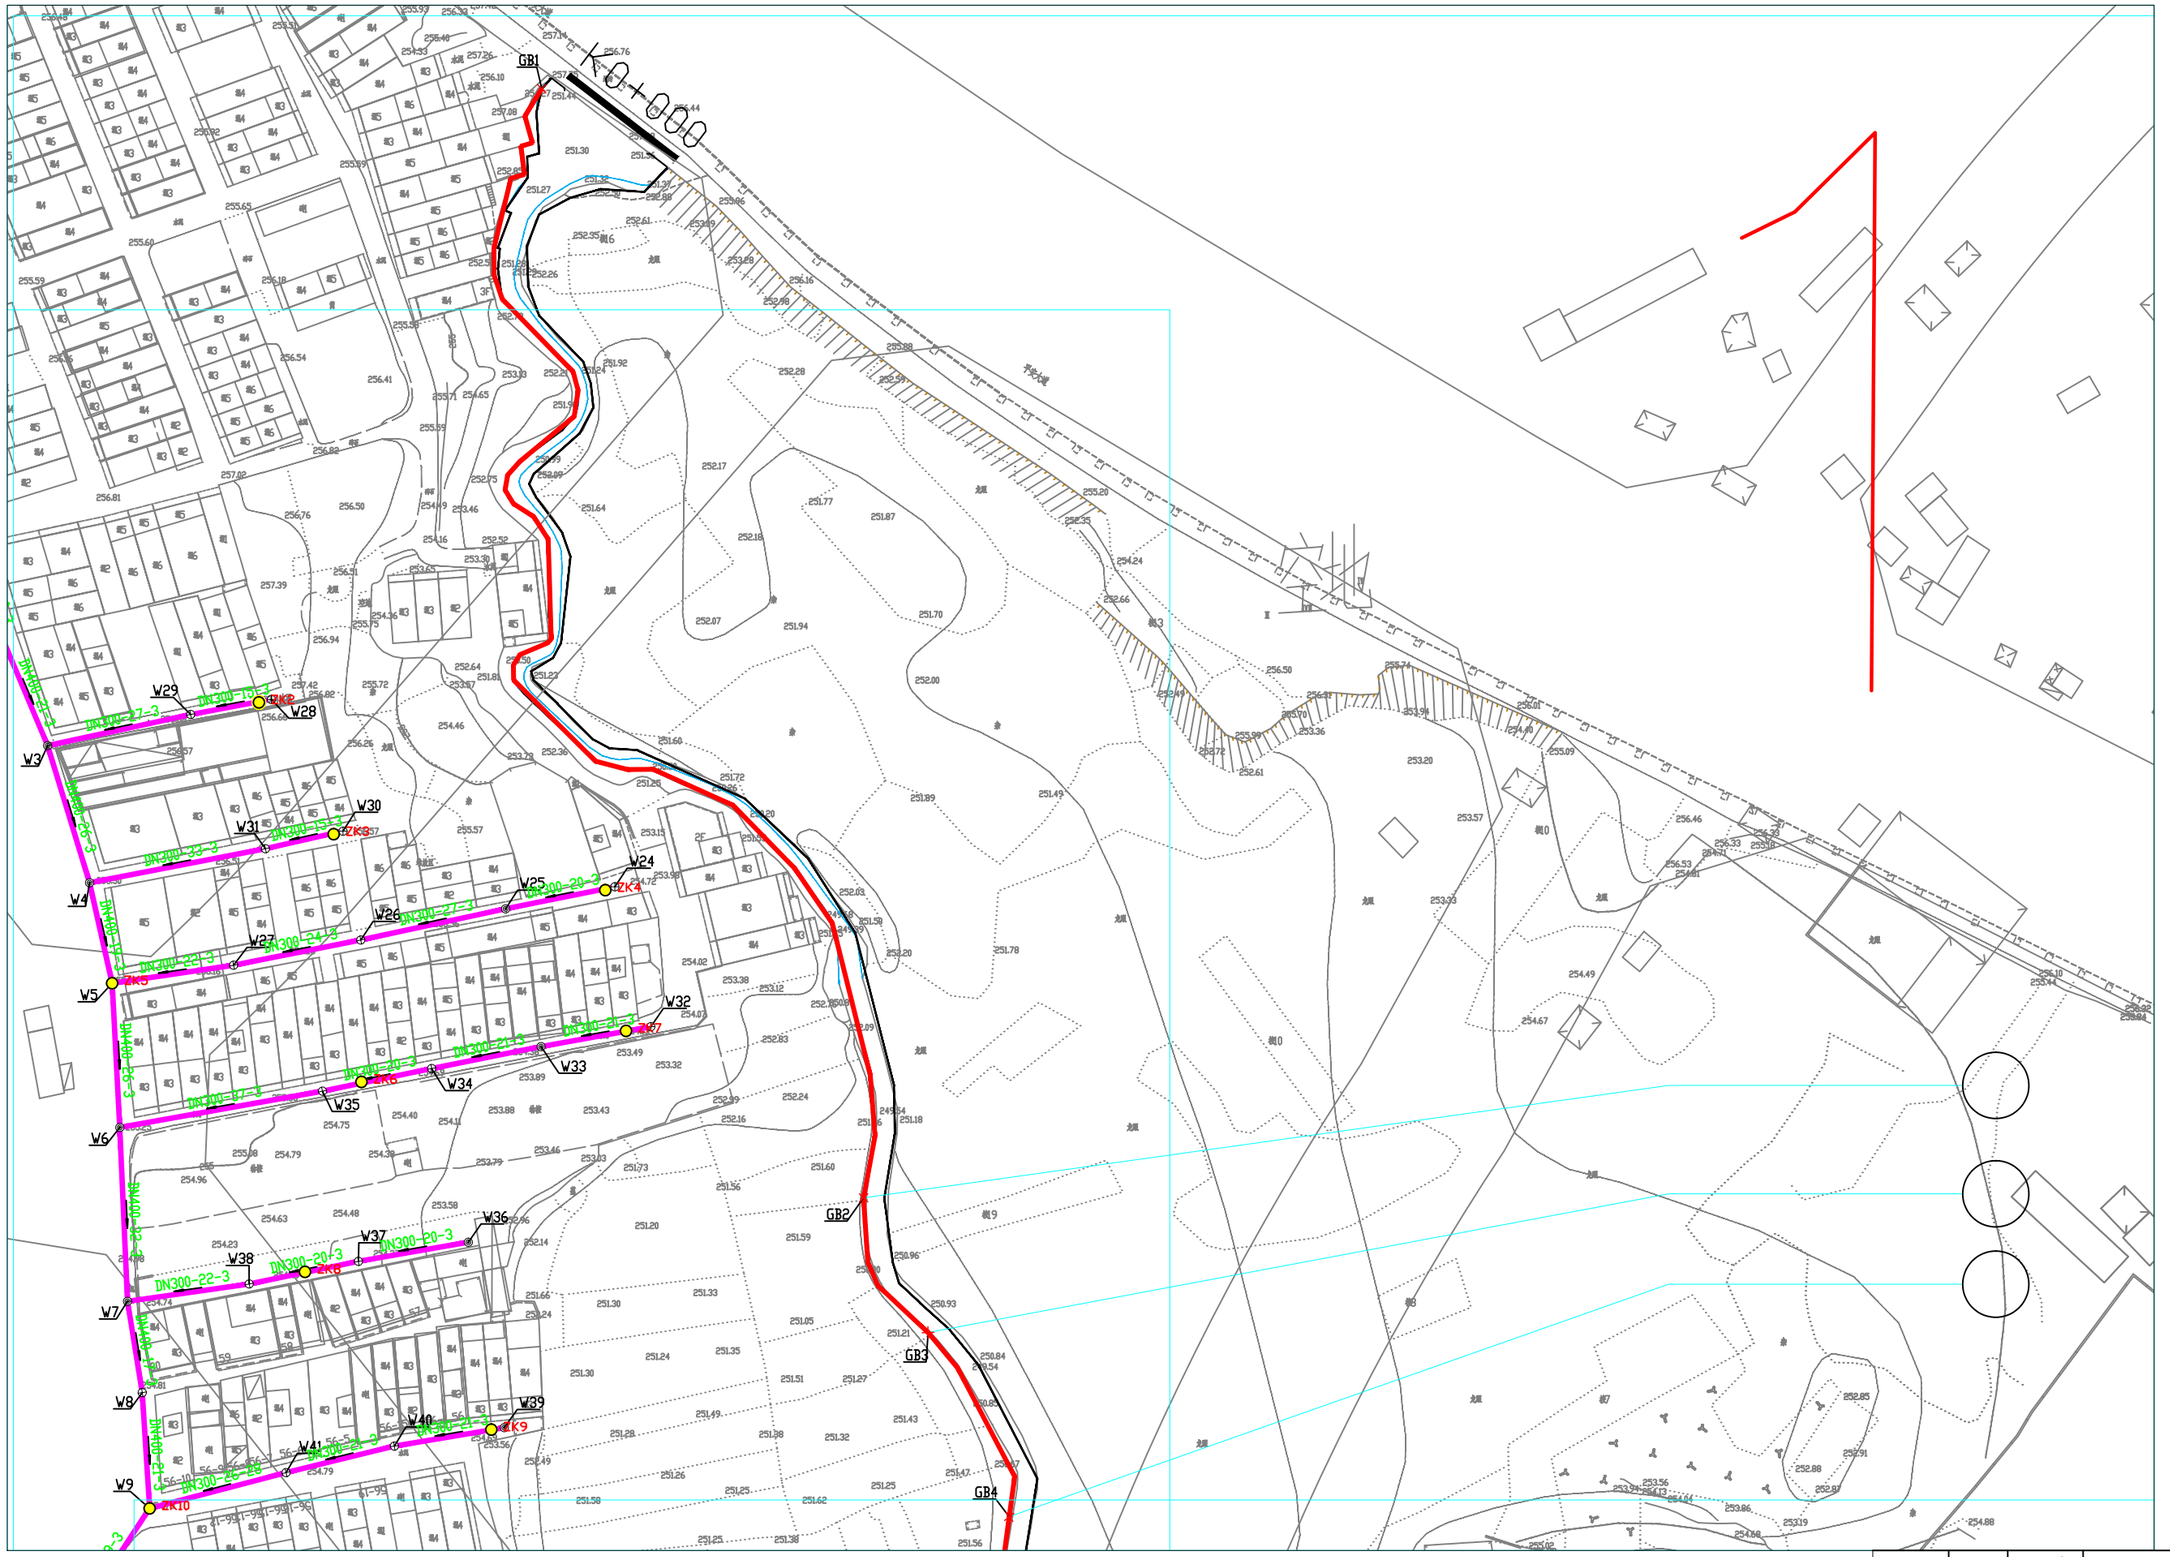


图例

ZK80 勘探位置及编号

审　定	阮成清		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司		
审　核	郑　义		资质等级：甲级　证书编号：B245015689		
项目负责	覃　峰		建设单位	大新县住房和城乡建设局	
校　对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(镇园片区)工程一期	
制　图	莫家里		平面图	图号 1	日期 2025.09

建筑（构）物与勘探点平面位置图

比例尺 1:1100

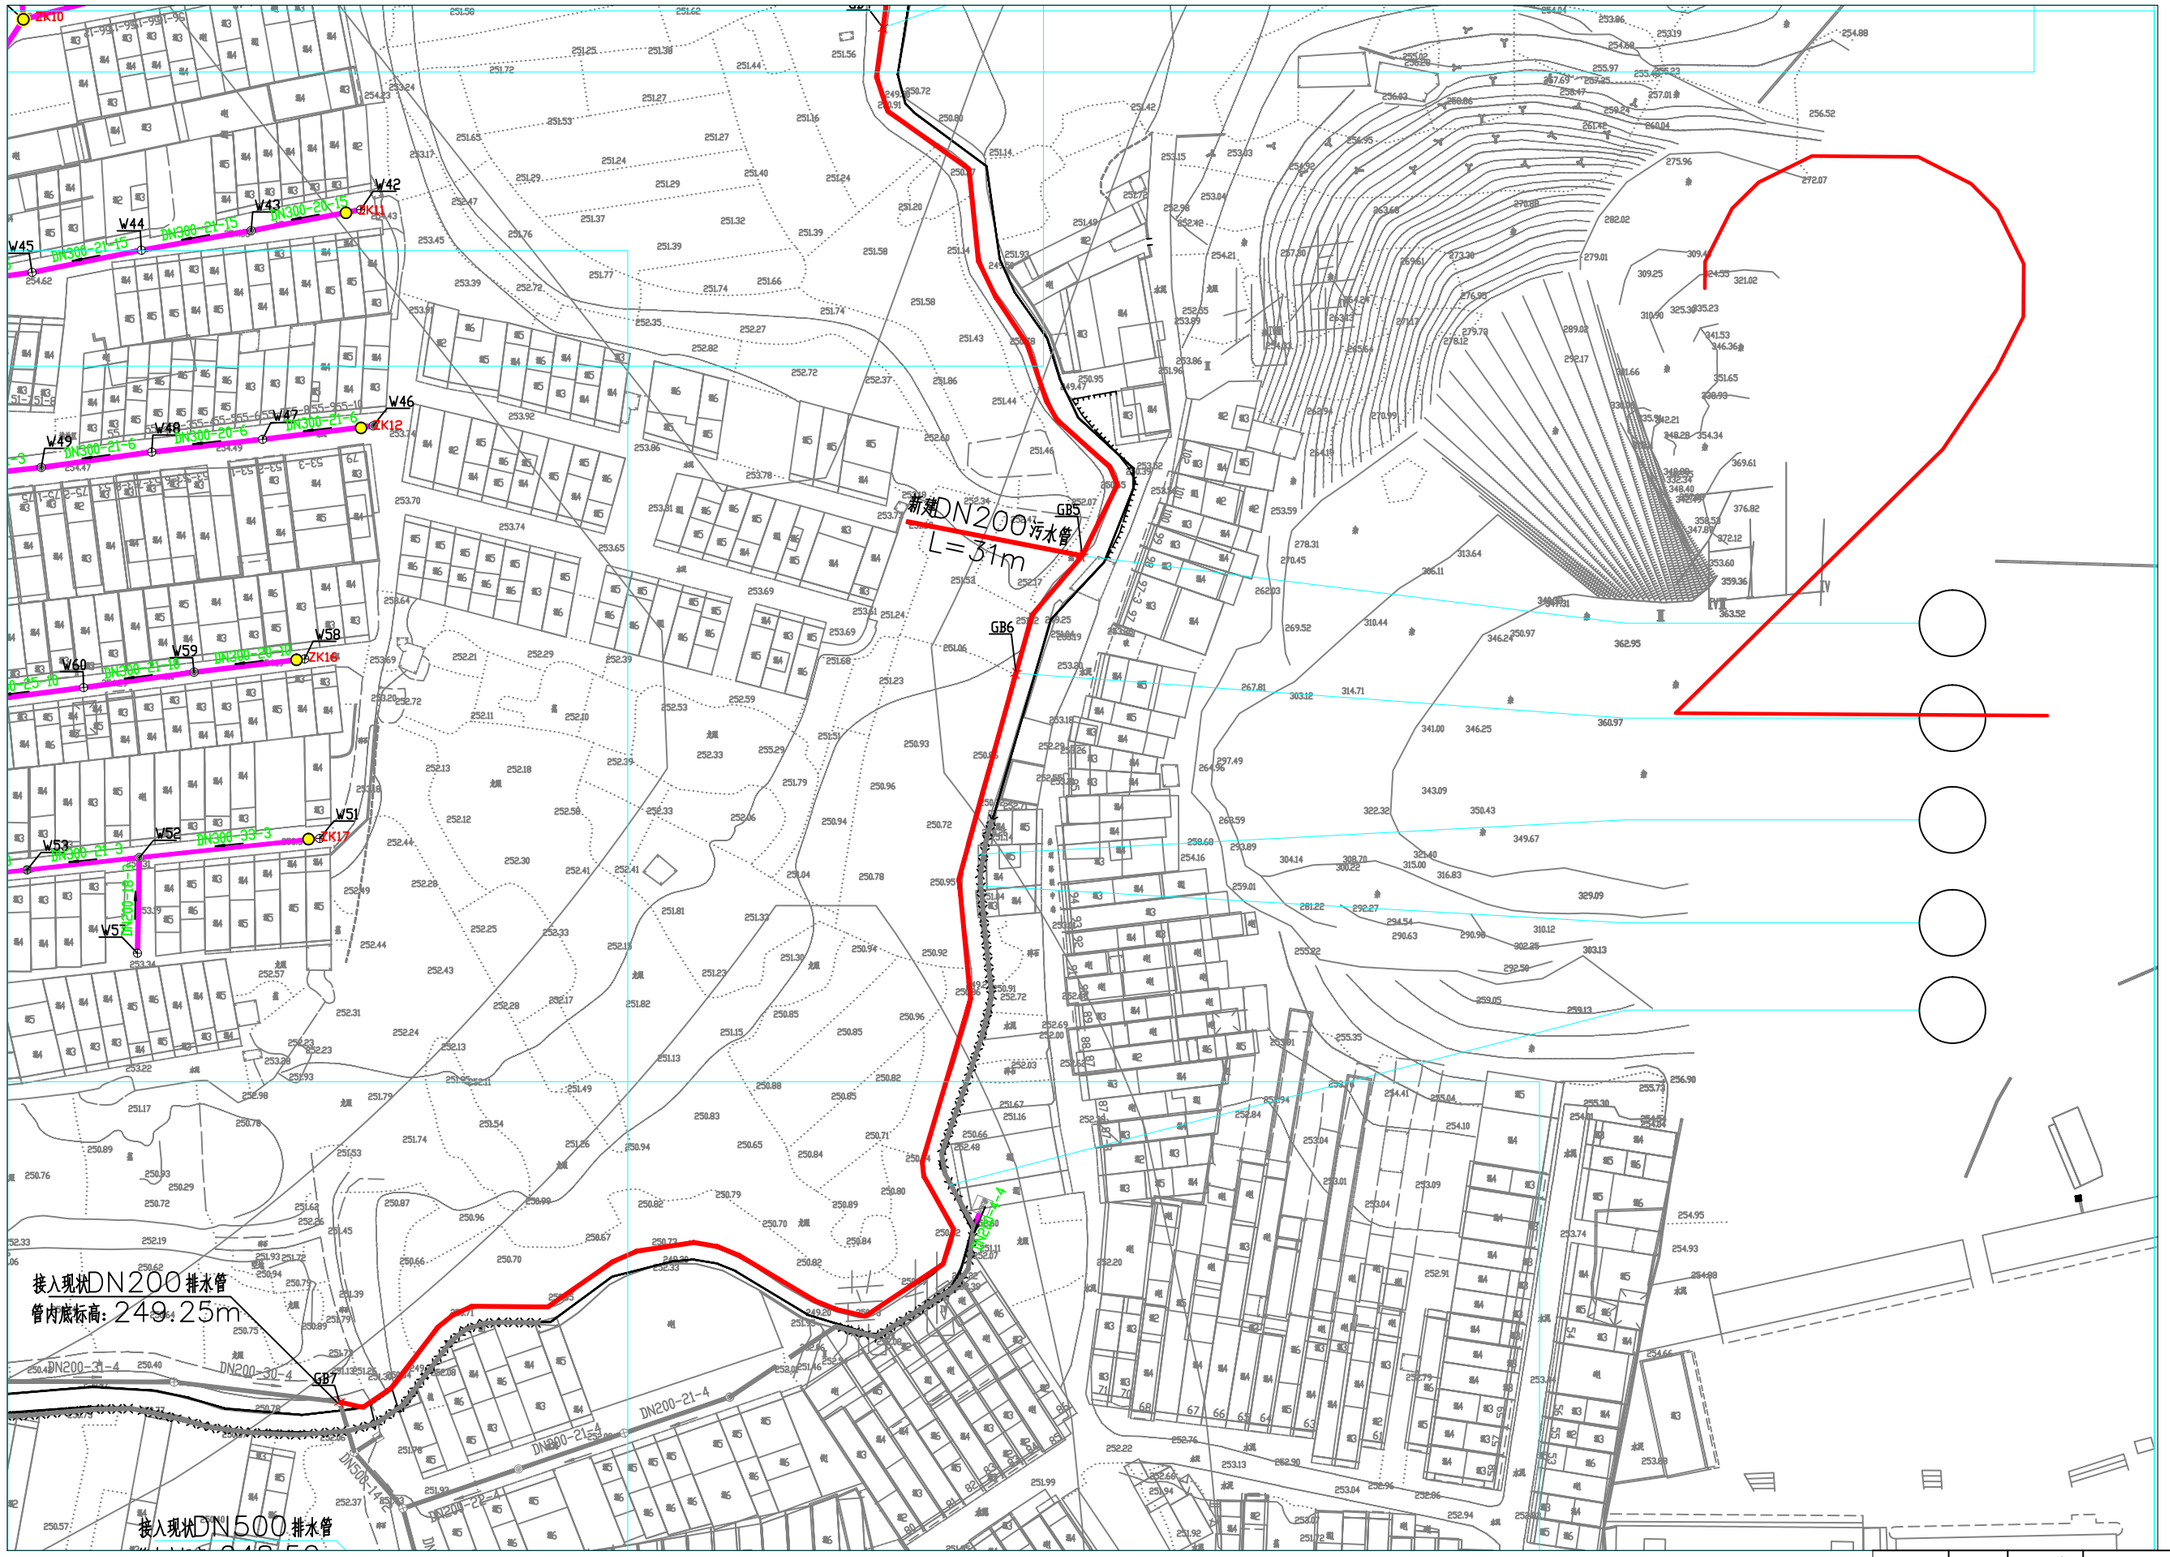


图例

ZK80 勘孔位置及编号

审　定	阮成清		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司				
审　核	郑　义		资质等级：甲级　证书编号：B245015689				
项目负责	覃　峰		建设单位	大新县住房和城乡建设局			
校　对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(镇园片区)工程一期			
制　图	莫家里		平面图	图号	2	日期	2025.09

建筑（构）物与勘探点平面位置图

比例尺 1:1100

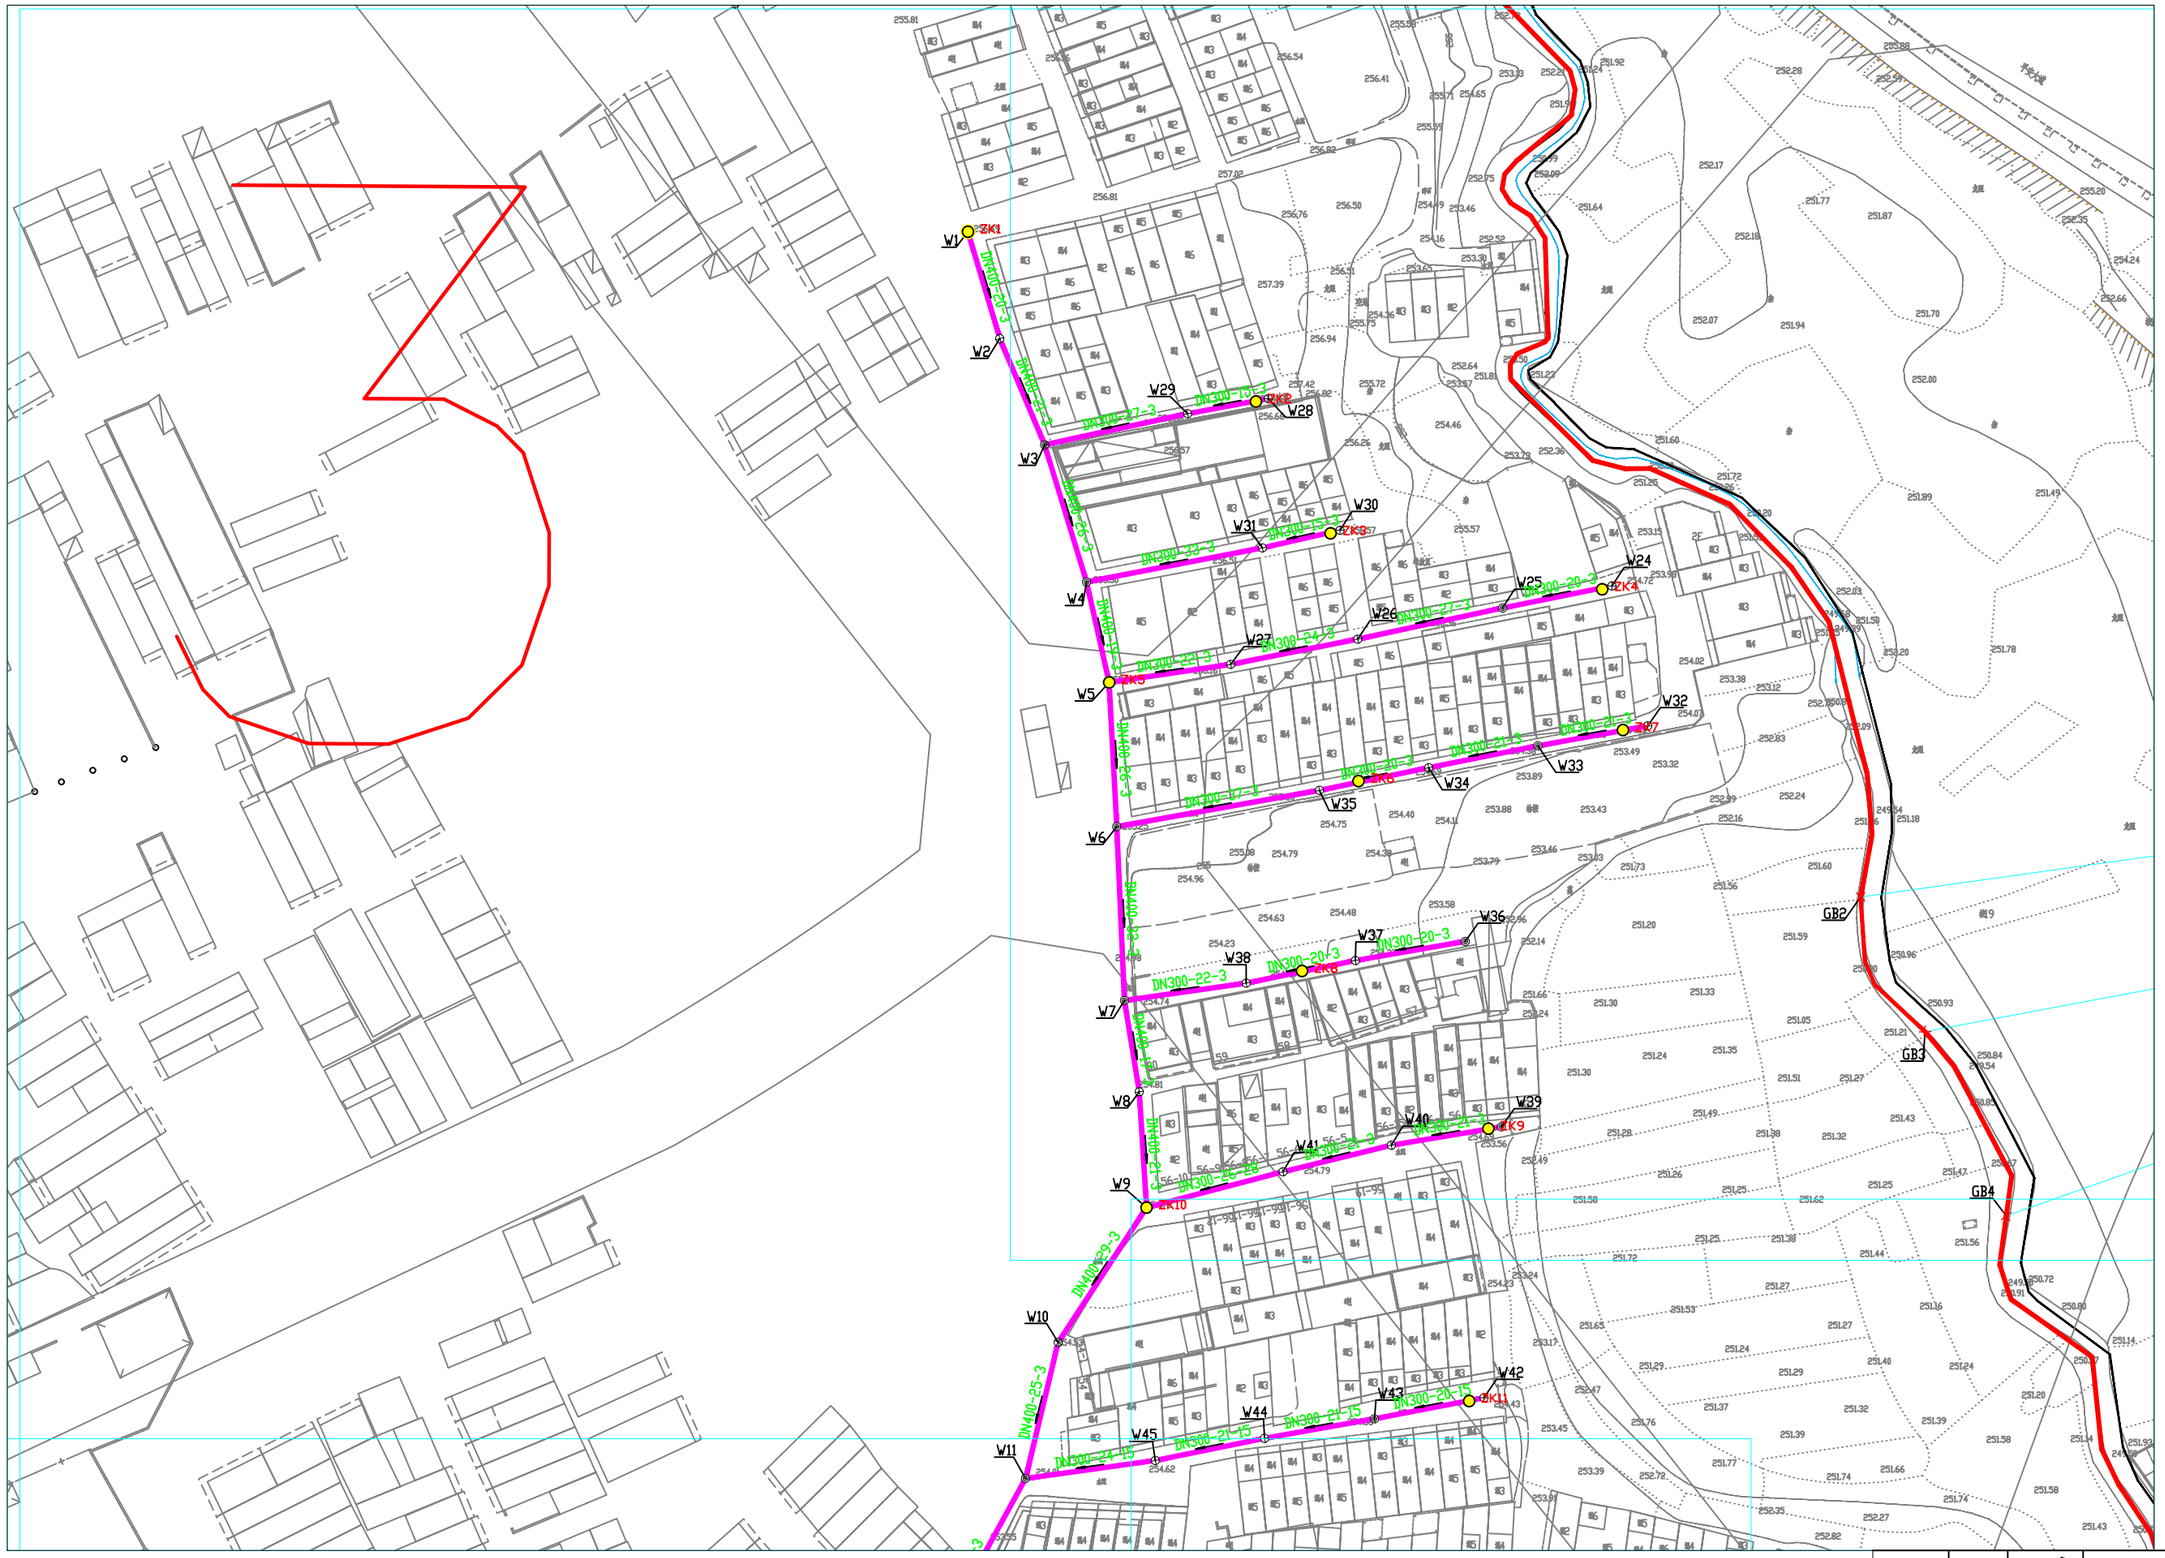


图例

ZK80 钻孔位置及编号

审　定	阮成清		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司				
审　核	郑　义		资质等级：甲级　　证书编号：B245015689				
项目负责	覃　嵴		建设单位	大新县住房和城乡建设局			
校　对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(镇园片区)工程一期			
制　图	莫家里		平面图	图号	3	日期	2025.09

建筑（构）物与勘探点平面位置图

比例尺 1:1100

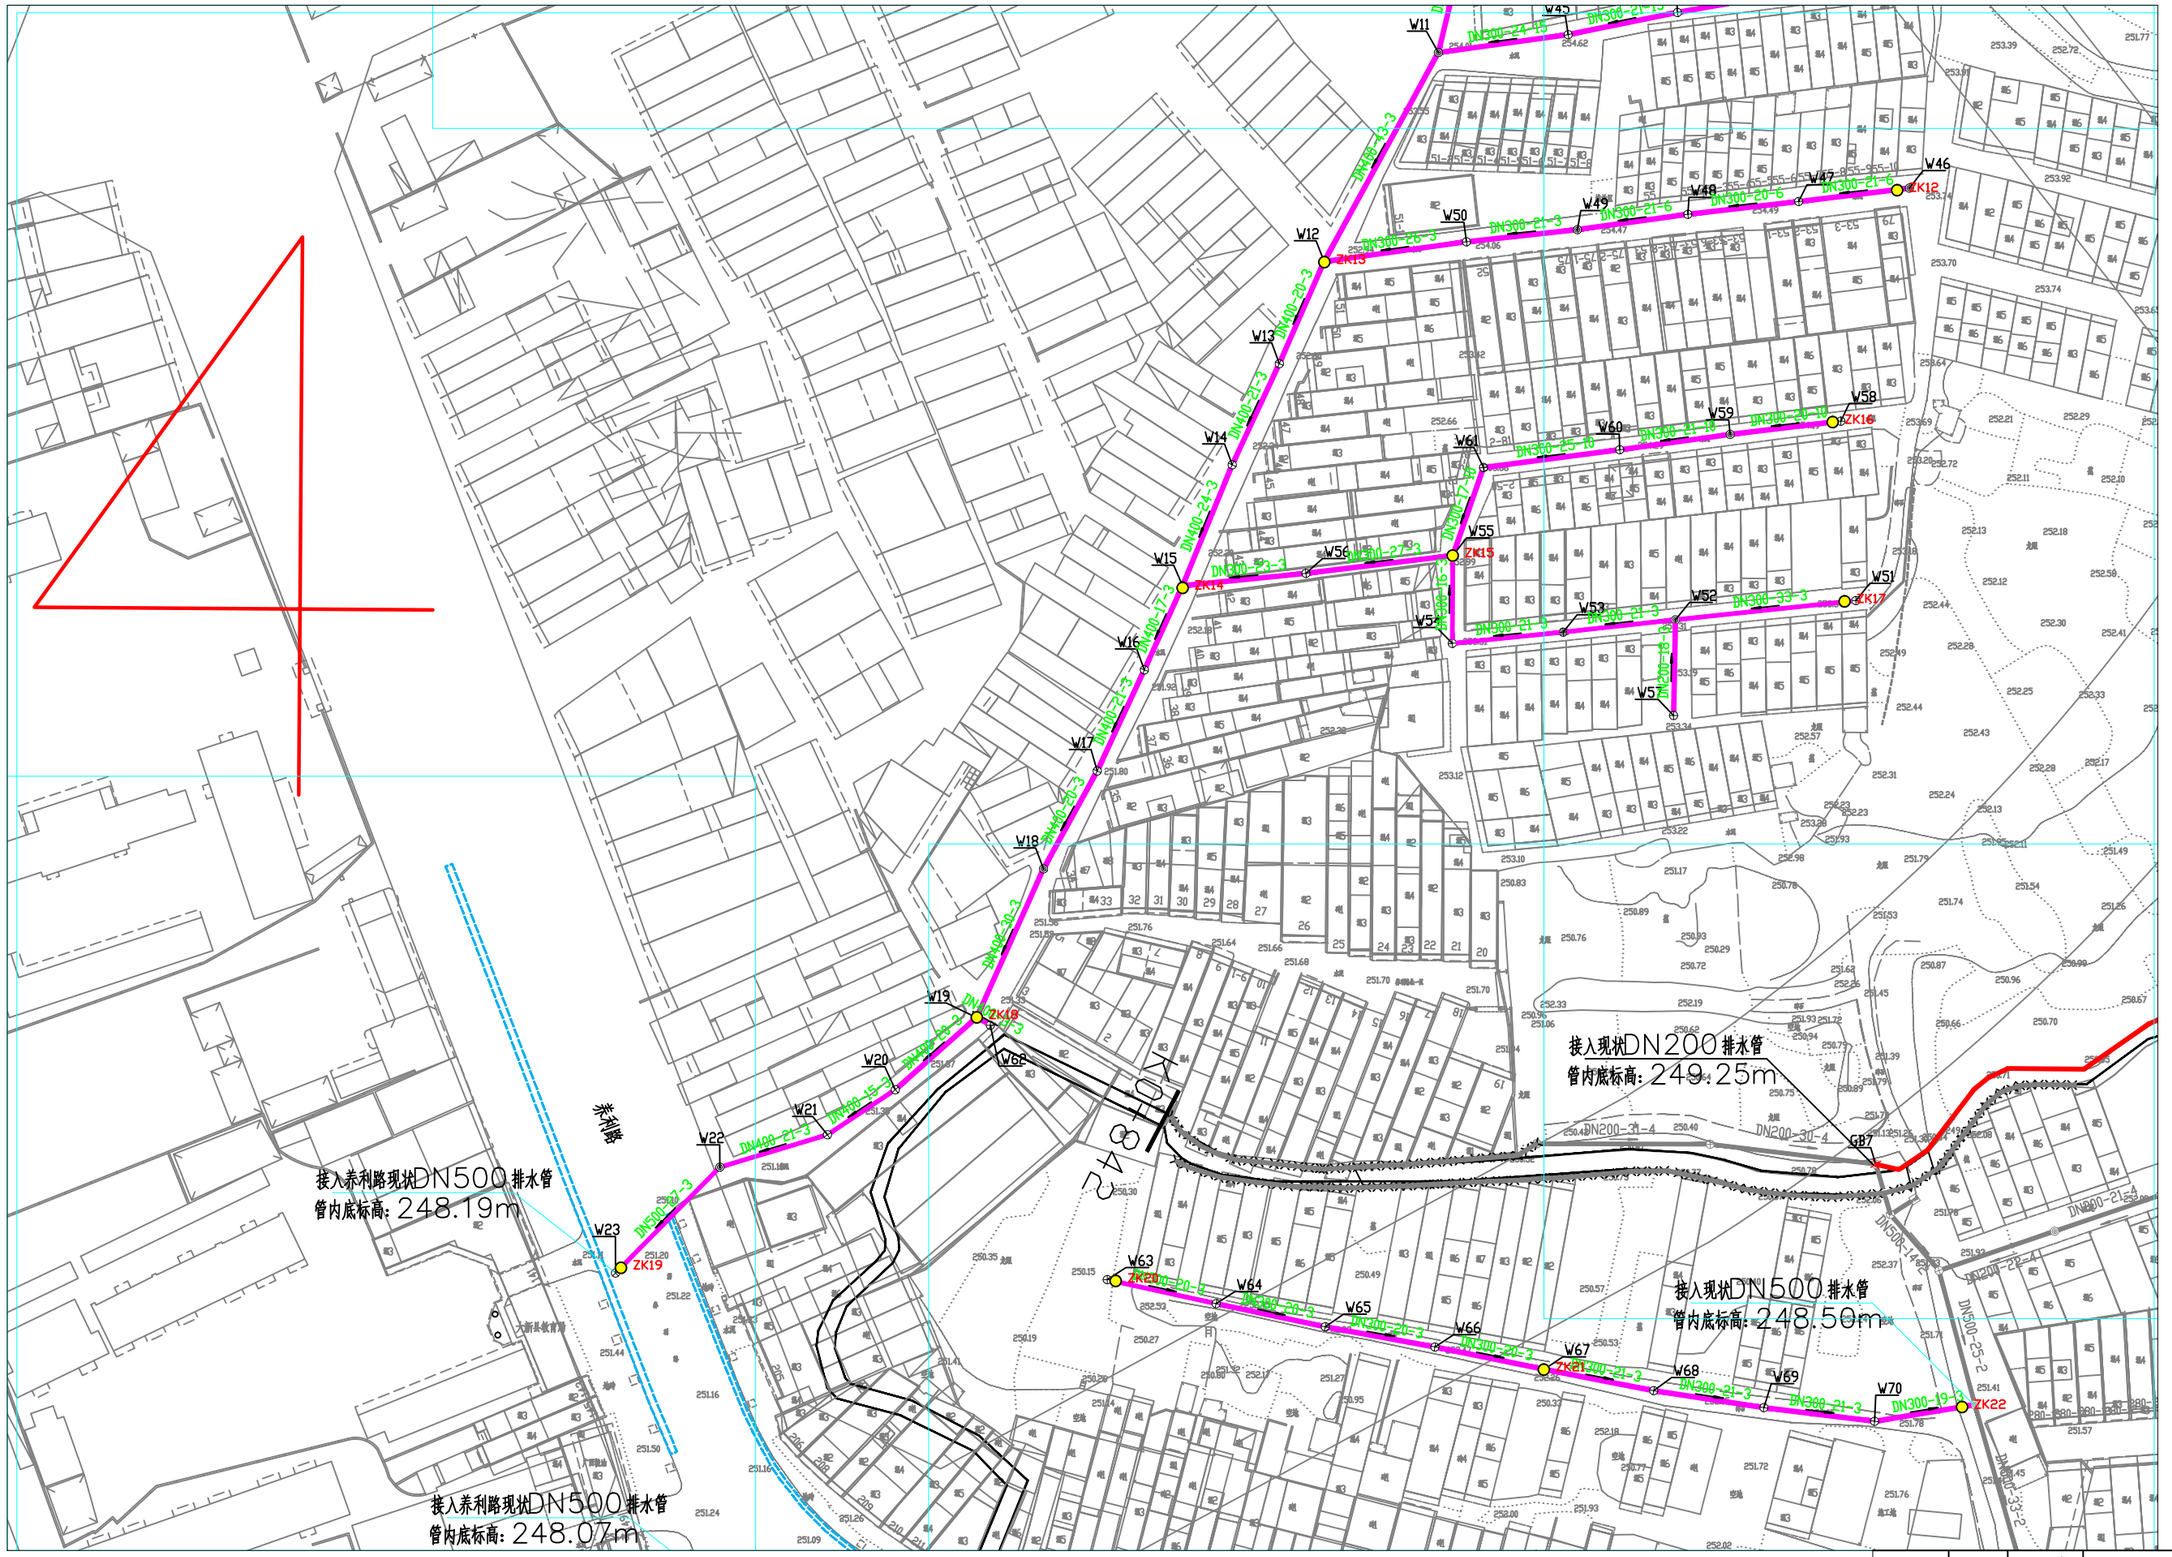


图例

ZK80 钻孔位置及编号

审　定	阮成清		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司		
审　核	郑　义		资质等级：甲级　证书编号：B245015689		
项目负责	覃　峰		建设单位	大新县住房和城乡建设局	
校　对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(镇圩片区)工程一期	
制　图	莫家里		平面图	图号 4	日期 2025.09

建筑（构）物与勘探点平面位置图

比例尺 1:1100

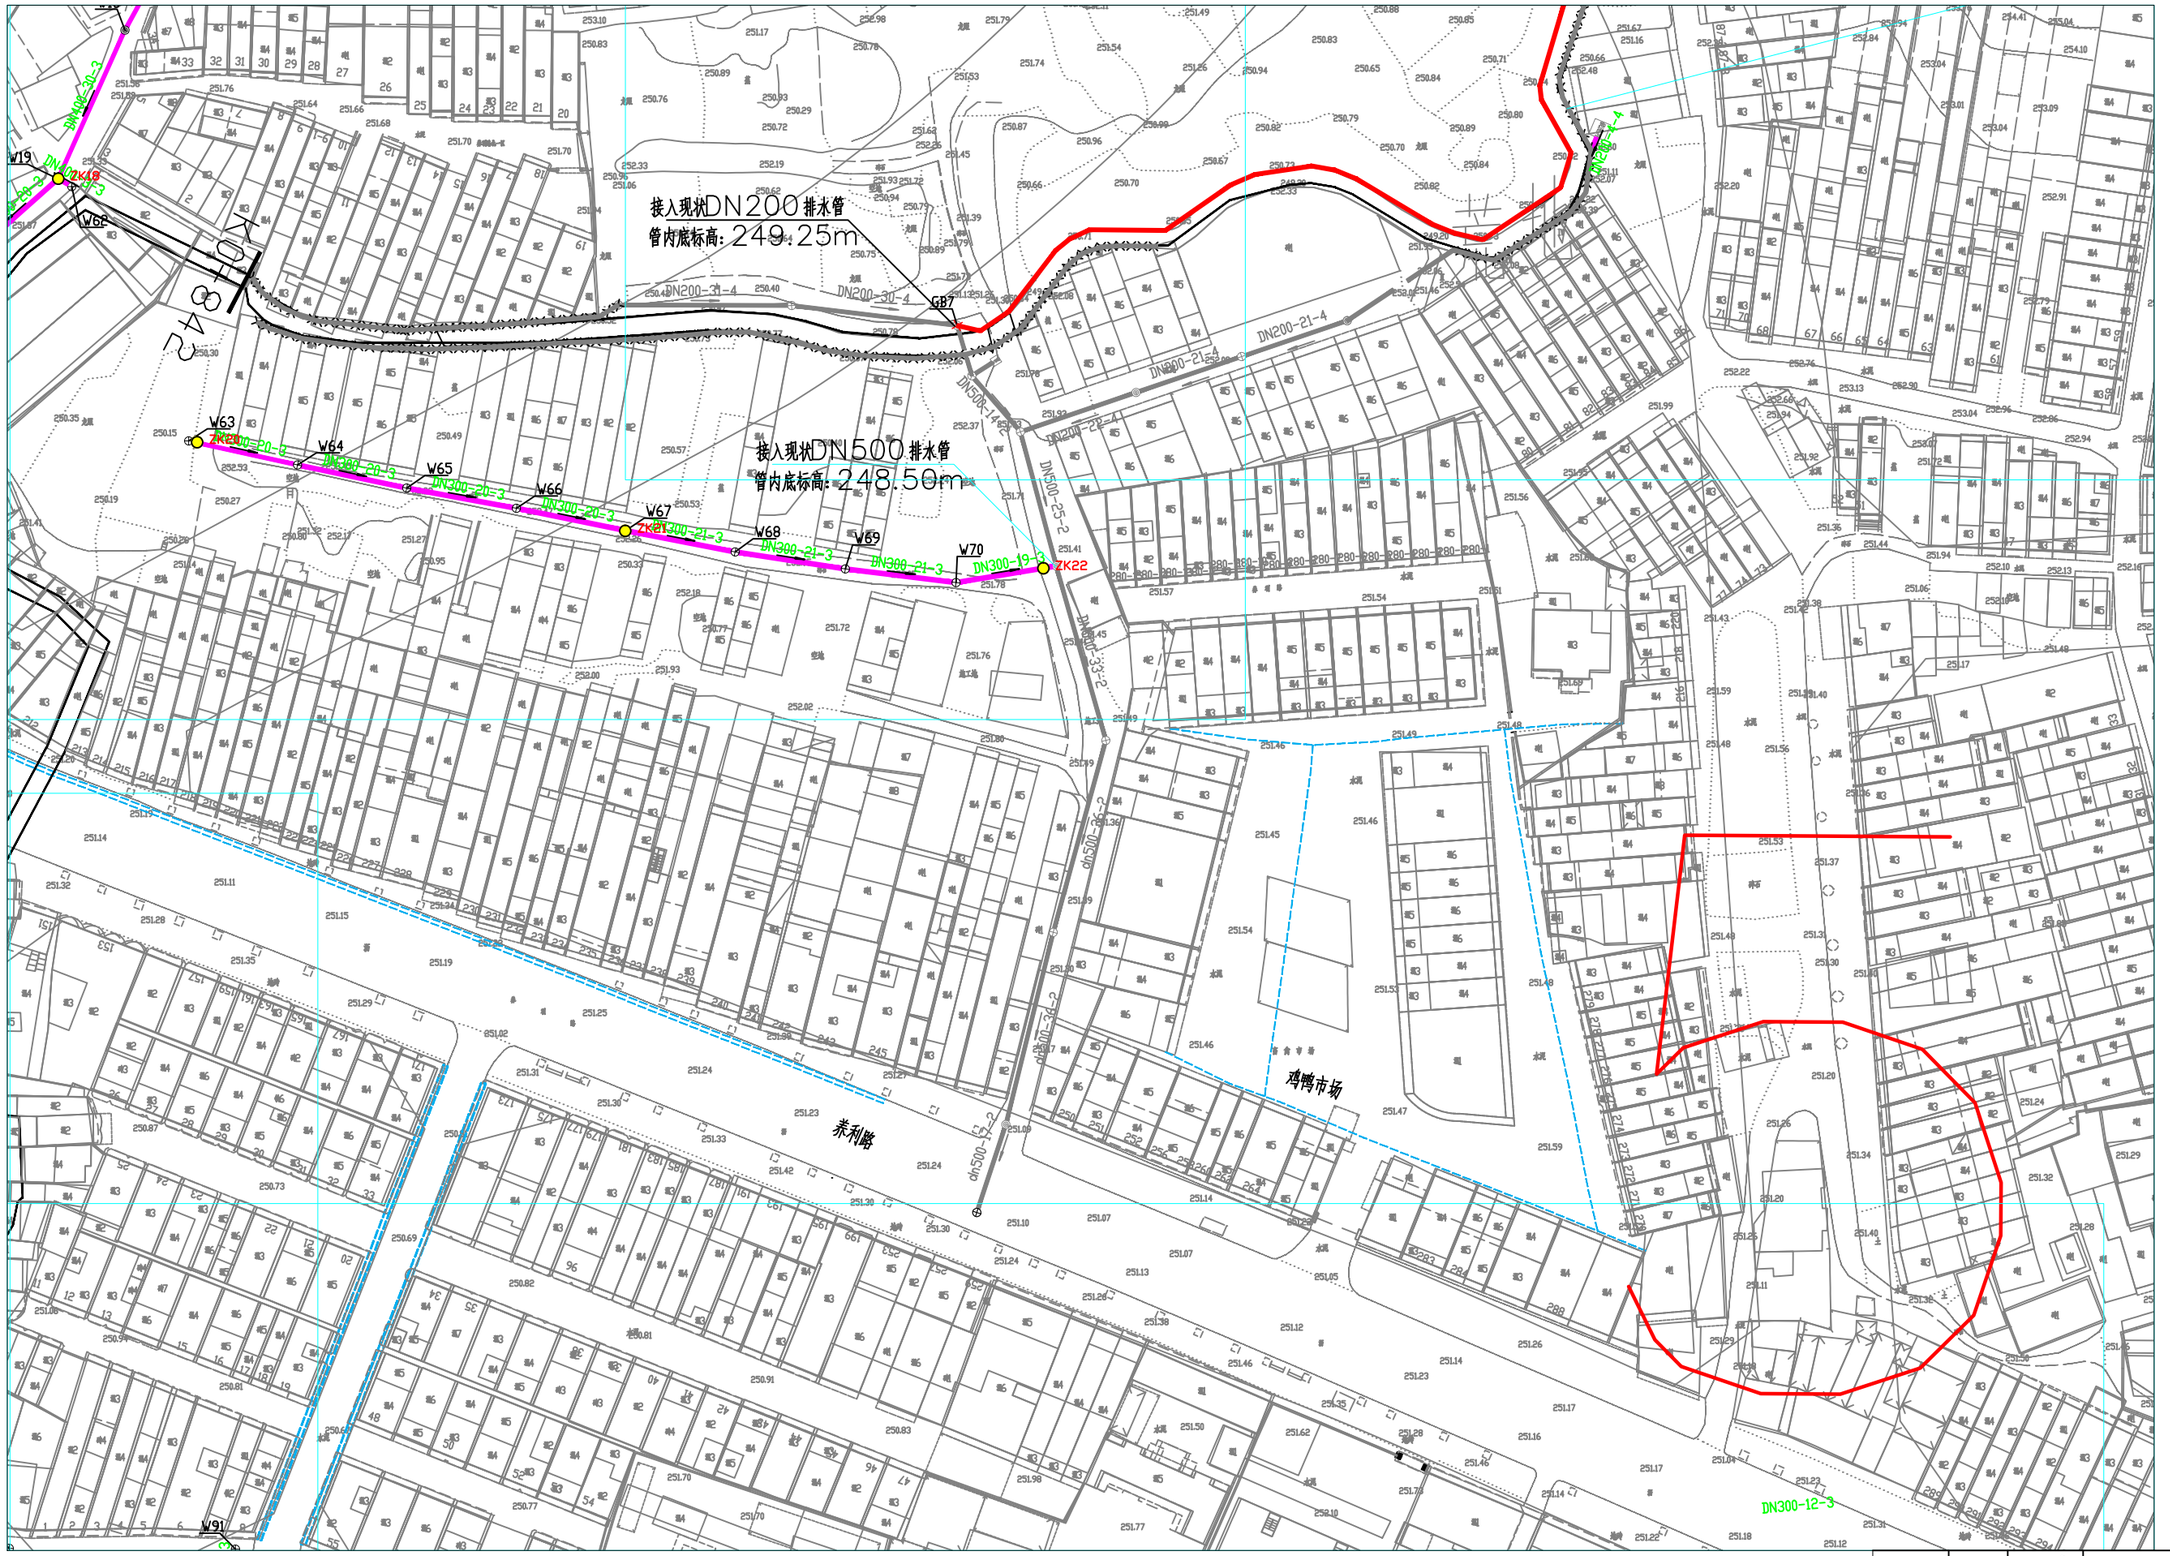


图例

ZK80 钻孔位置及编号

审　定	阮成清		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司				
审　核	郑　义		资质等级：甲级　　证书编号：B245015689				
项目负责	覃　峰		建设单位	大新县住房和城乡建设局			
校　对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(镇园片区)工程一期			
制　图	莫家里		平面图	图号	5	日期	2025.09


建筑（构）物与勘探点平面位置图

比例尺 1:1100

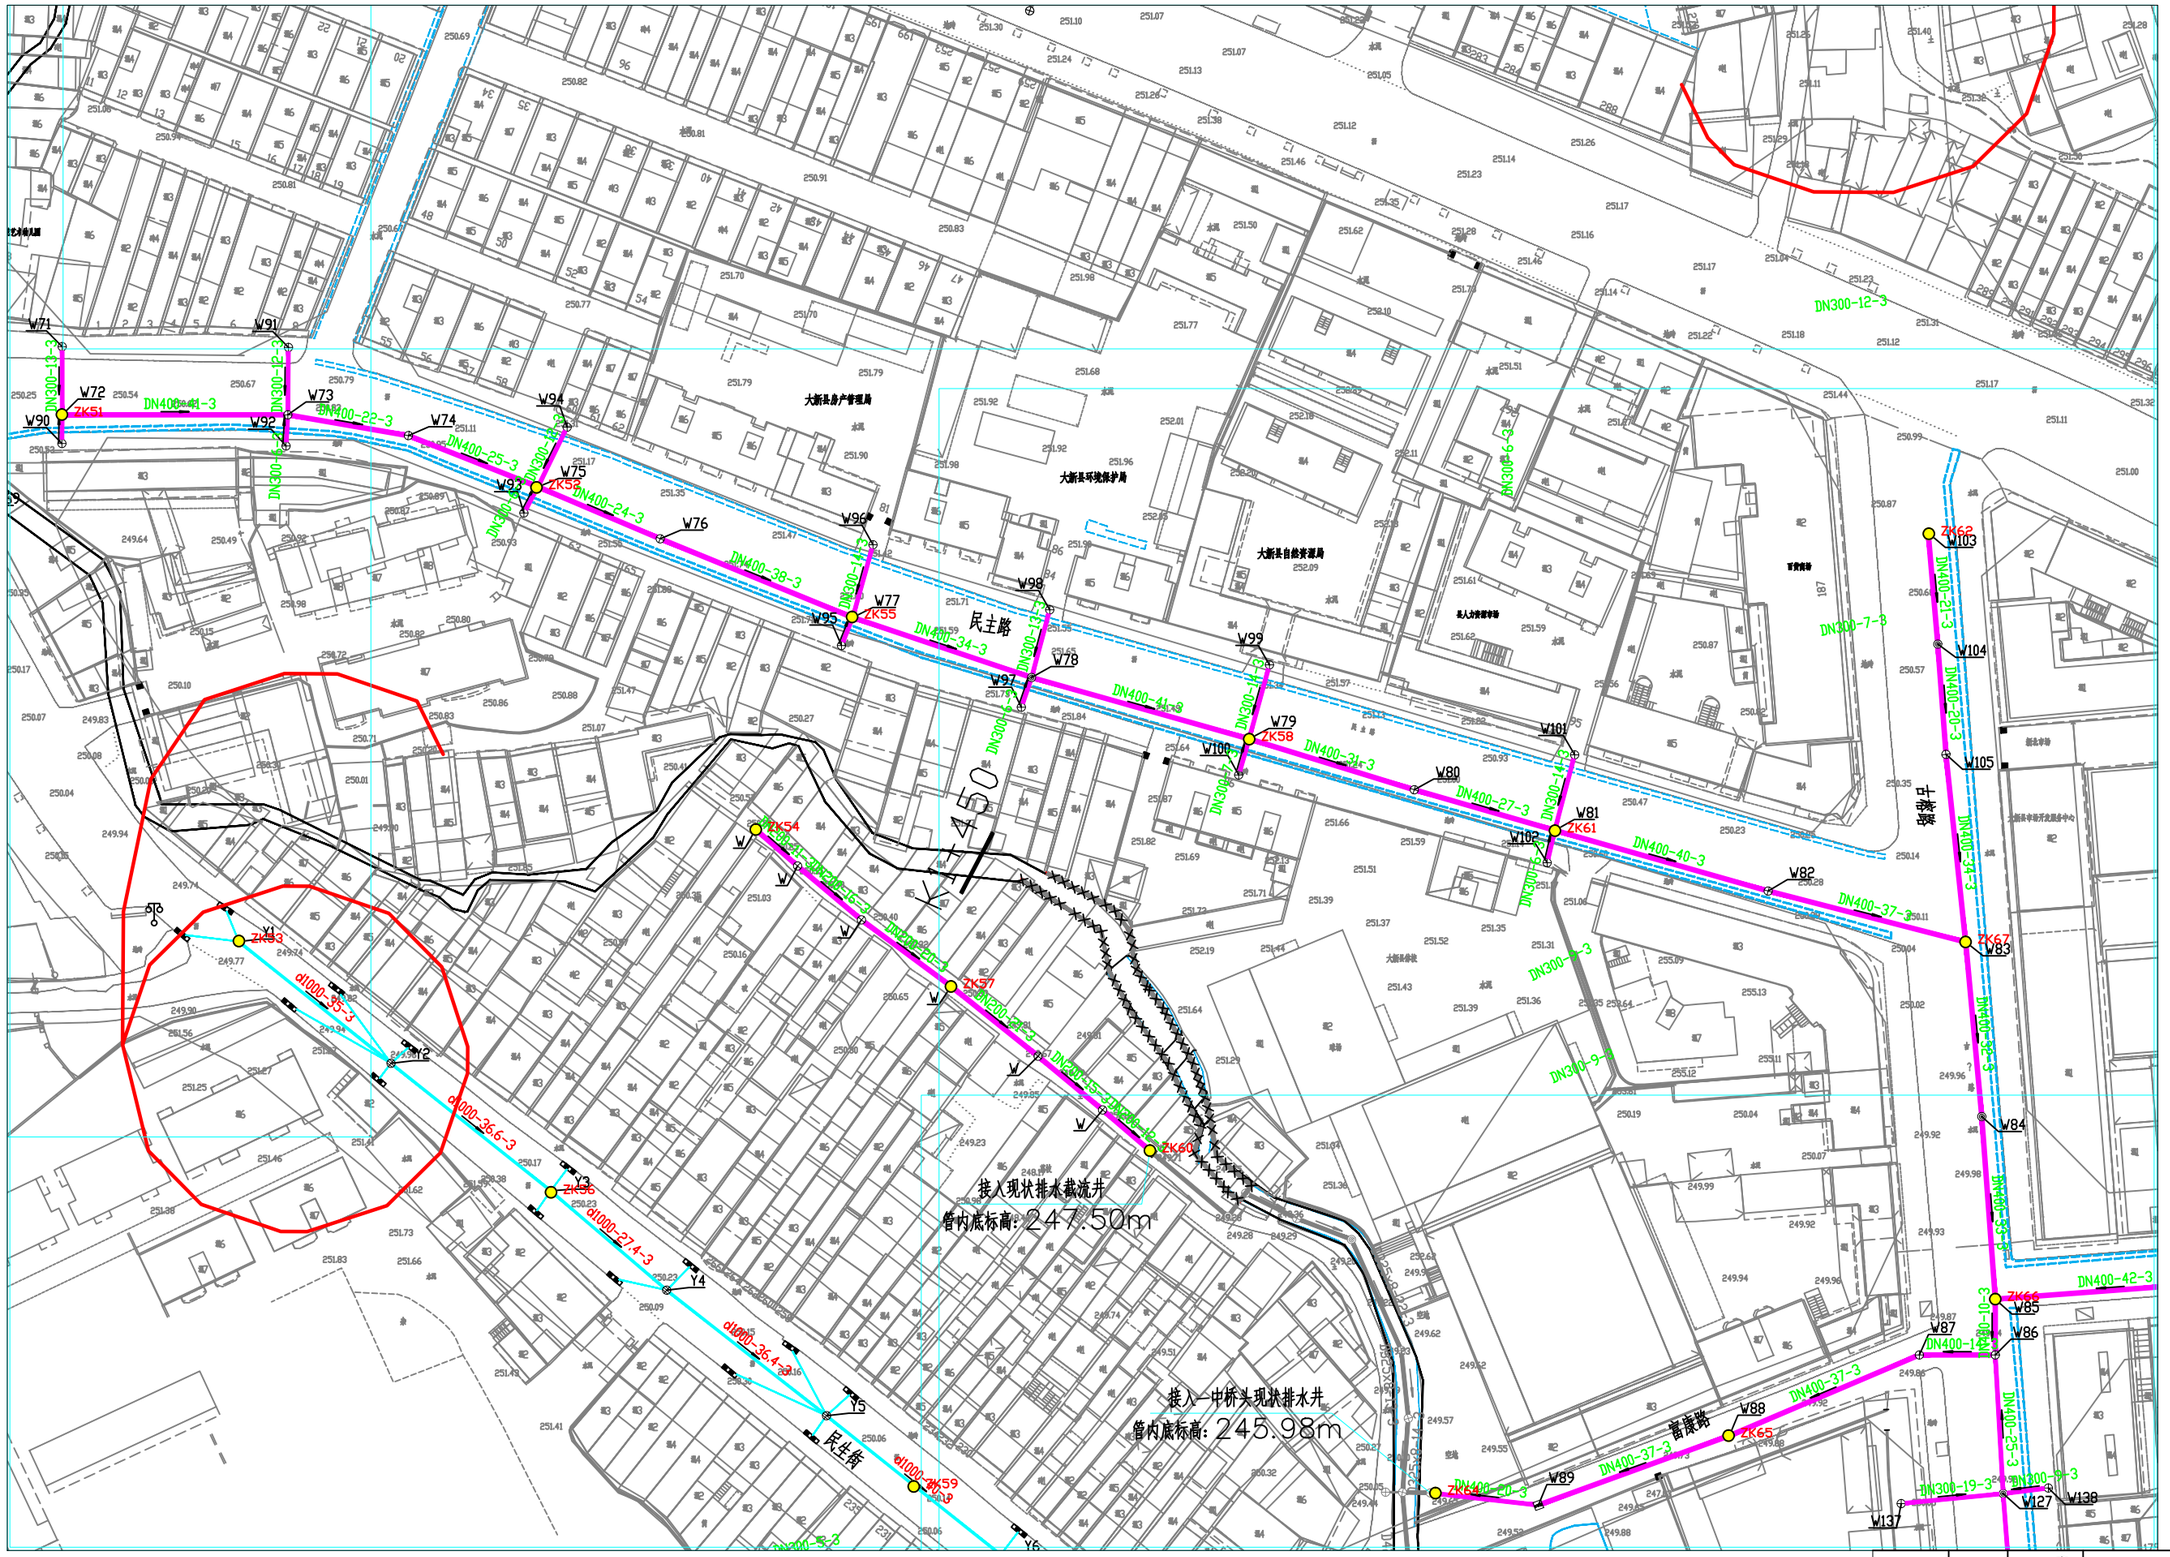
W71
W91
W72
ZK51
W73
W90
W92
W74
W94
W75
ZK52
W93
W76
W96
W77
ZK55
W95
W98
W78
W97
W99
ZK58
W79
W100
W80
W101
W81
ZK61
W102
W82
ZK67
W83
W84
W103
ZK62
W104
W105
ZK66
W85
W86
W87
W88
ZK65
W89
W127
W138
W137
ZK54
ZK57
ZK60
ZK53
ZK56
ZK59
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
DN300-12-3
DN400-41-3
DN400-22-3
DN400-25-3
DN400-24-3
DN400-38-3
DN300-14-3
DN400-34-3
DN300-13-3
DN400-41-3
DN400-31-3
DN400-27-3
DN300-14-3
DN400-40-3
DN400-37-3
DN300-6-3
DN300-7-3
DN400-21-3
DN400-26-3
DN300-9-3
DN400-38-3
DN400-42-3
DN300-10-3
DN400-14-3
DN400-37-3
DN400-20-3
DN300-19-3
DN300-8-3
DN400-23-3
DN300-35-3
DN300-34-3
DN300-33-3
DN300-32-3
DN300-31-3
DN300-30-3
DN300-29-3
DN300-28-3
DN300-27-3
DN300-26-3
DN300-25-3
DN300-24-3
DN300-23-3
DN300-22-3
DN300-21-3
DN300-20-3
DN300-18-3
DN300-17-3
DN300-16-3
DN300-15-3
DN300-12-3
DN300-11-3
DN300-10-3
DN300-9-3
DN300-8-3
DN300-7-3
DN300-6-3
DN300-5-3
DN300-4-3
DN300-3-3
DN300-2-3
DN300-1-3
d1000-35-3
d1000-36.6-3
d1000-27.4-3
d1000-36.4-3
d1000-36.4-3
大新县房产管理局
大新县环境保护局
大新县自然资源局
大新县老人大活动中心
大新县人大常委会
大新县老干部活动中心
大新县老年体育活动中心
大新县老年开发服务中心
大新县老年体育馆
大新县老年体育场
大新县老年体育馆
大新县老年体育场
大新县老年体育馆
大新县老年体育场


建筑（构）物与勘探点平面位置图

比例尺 1:1100

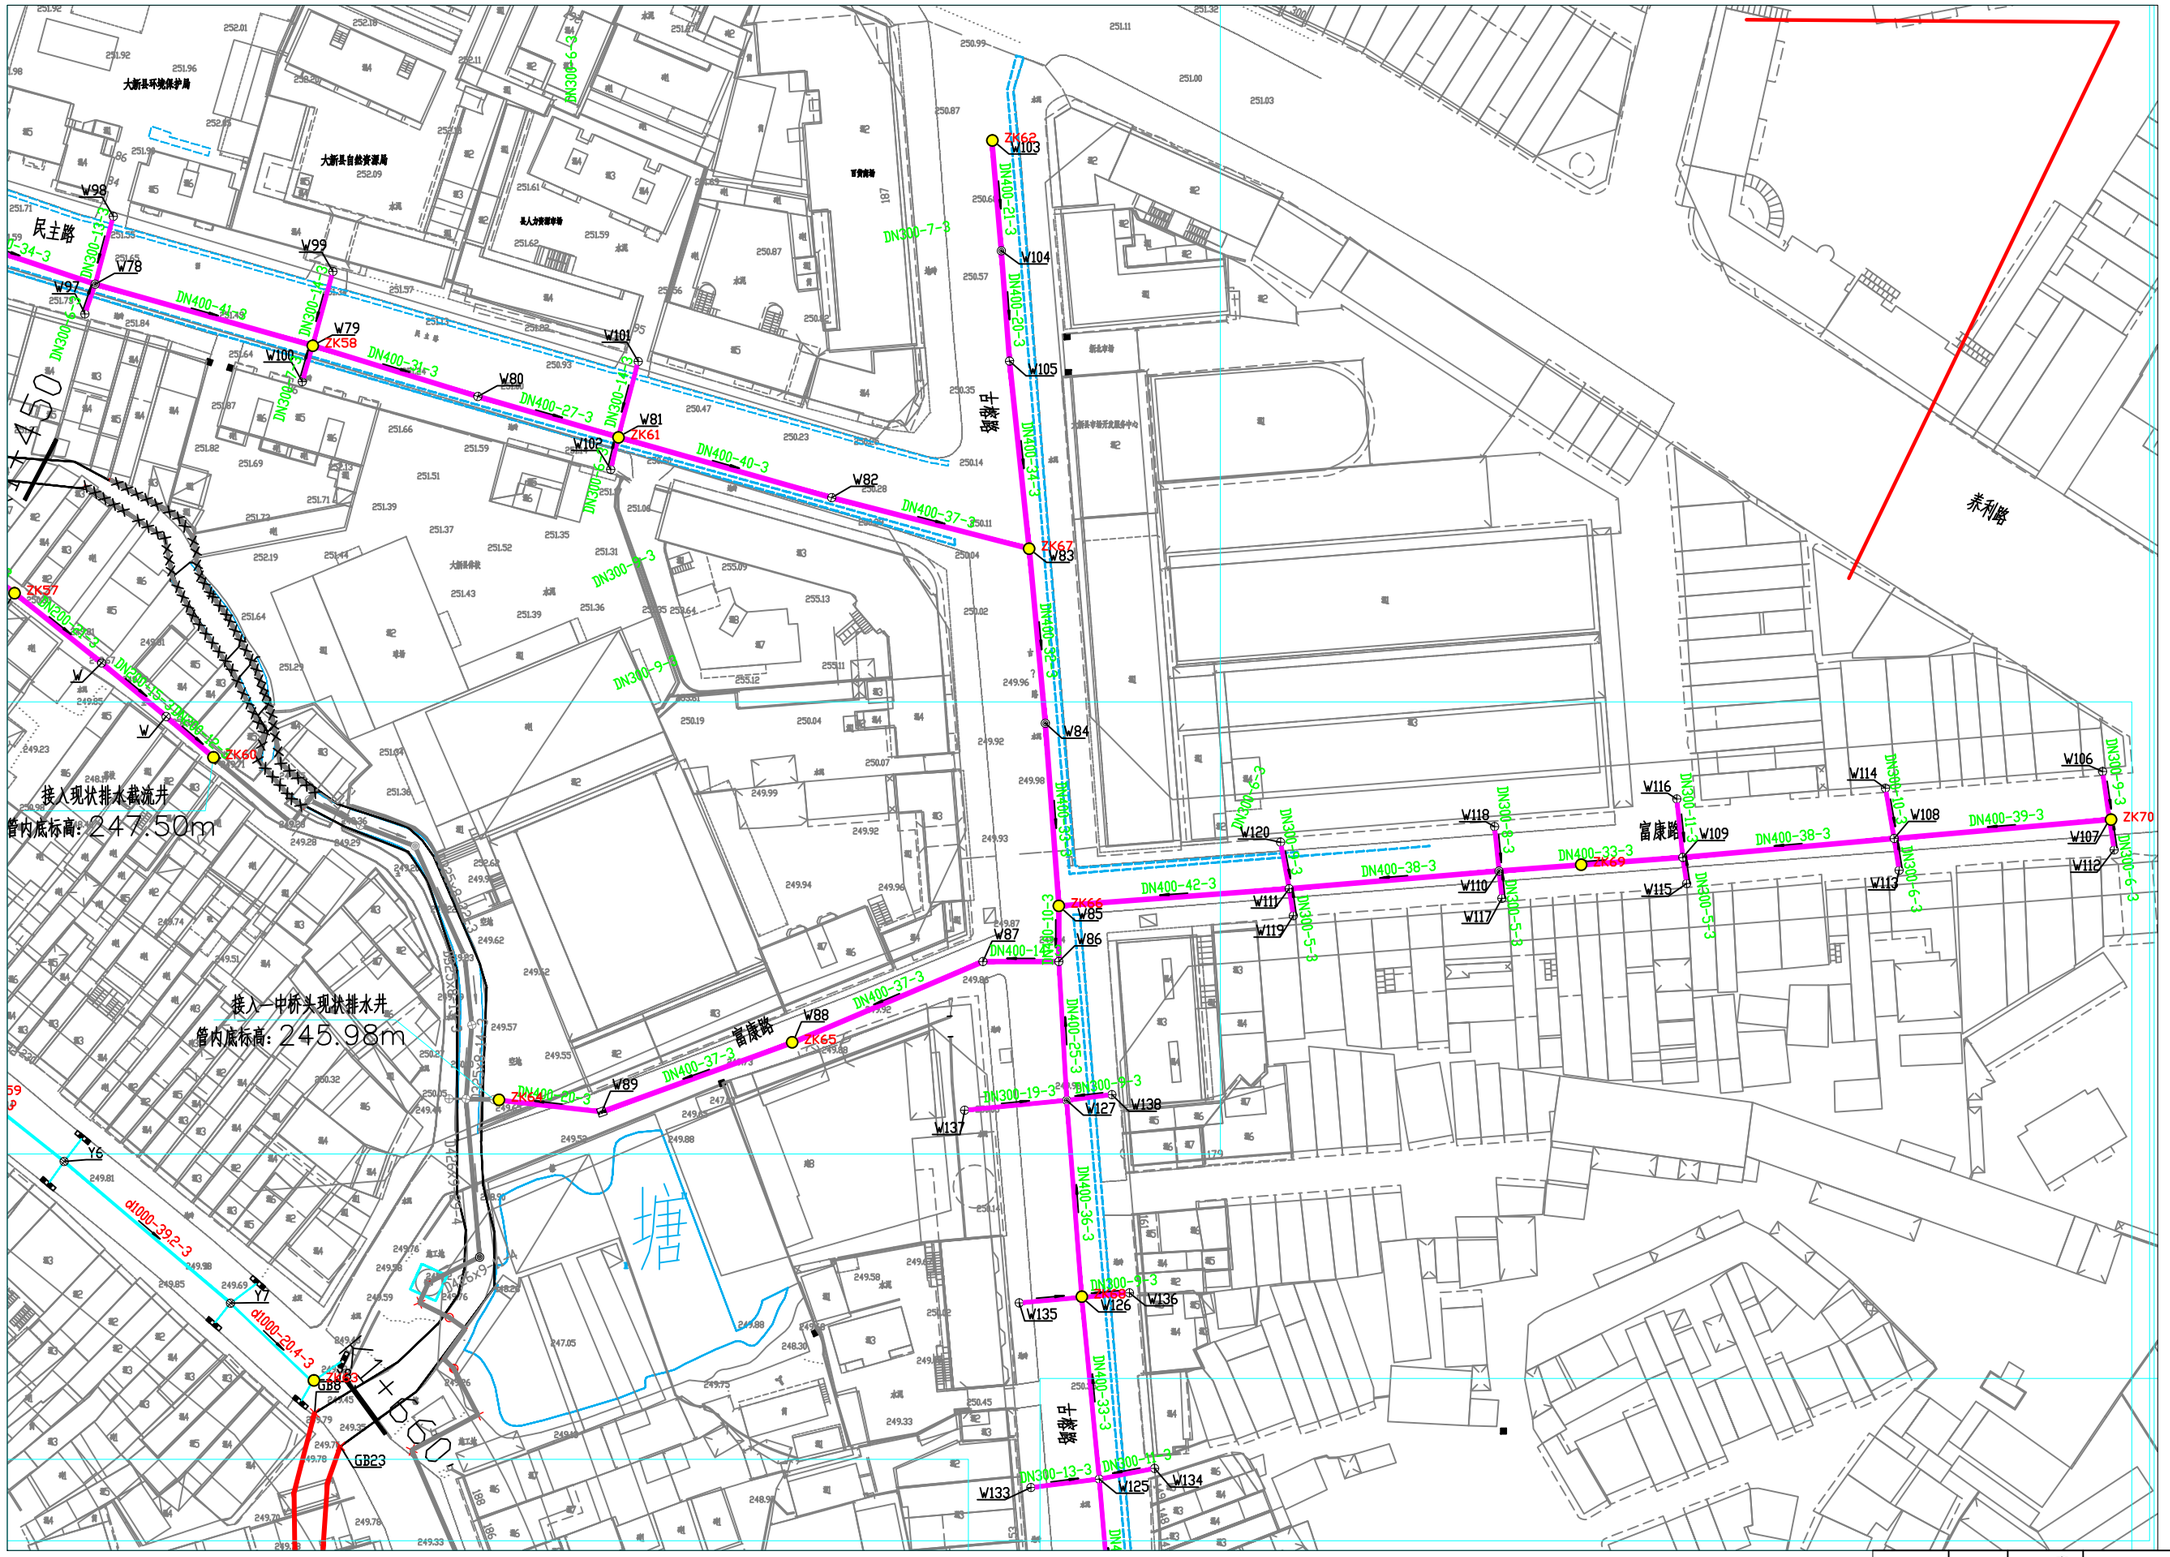
民主路
大新县环境保护局
大新县自然资源局
大新县人力资源和社会保障局
大新县市场开发服务中心
大新县审批服务局
大新县财政局
大新县住房和城乡建设局
大新县交通运输局
大新县水利局
大新县农业农村局
大新县林业局
大新县发展和改革委员会
大新县工业和信息化局
大新县教育局
大新县科学技术局
大新县民族宗教事务局
大新县司法局
大新县财政局
大新县人民检察院
大新县人民法院
大新县公安局
大新县人民政府
大新县人民政府办公室
大新县人民政府办公室
大新县人民政府办公室


建筑（构）物与勘探点平面位置图

比例尺 1:1100

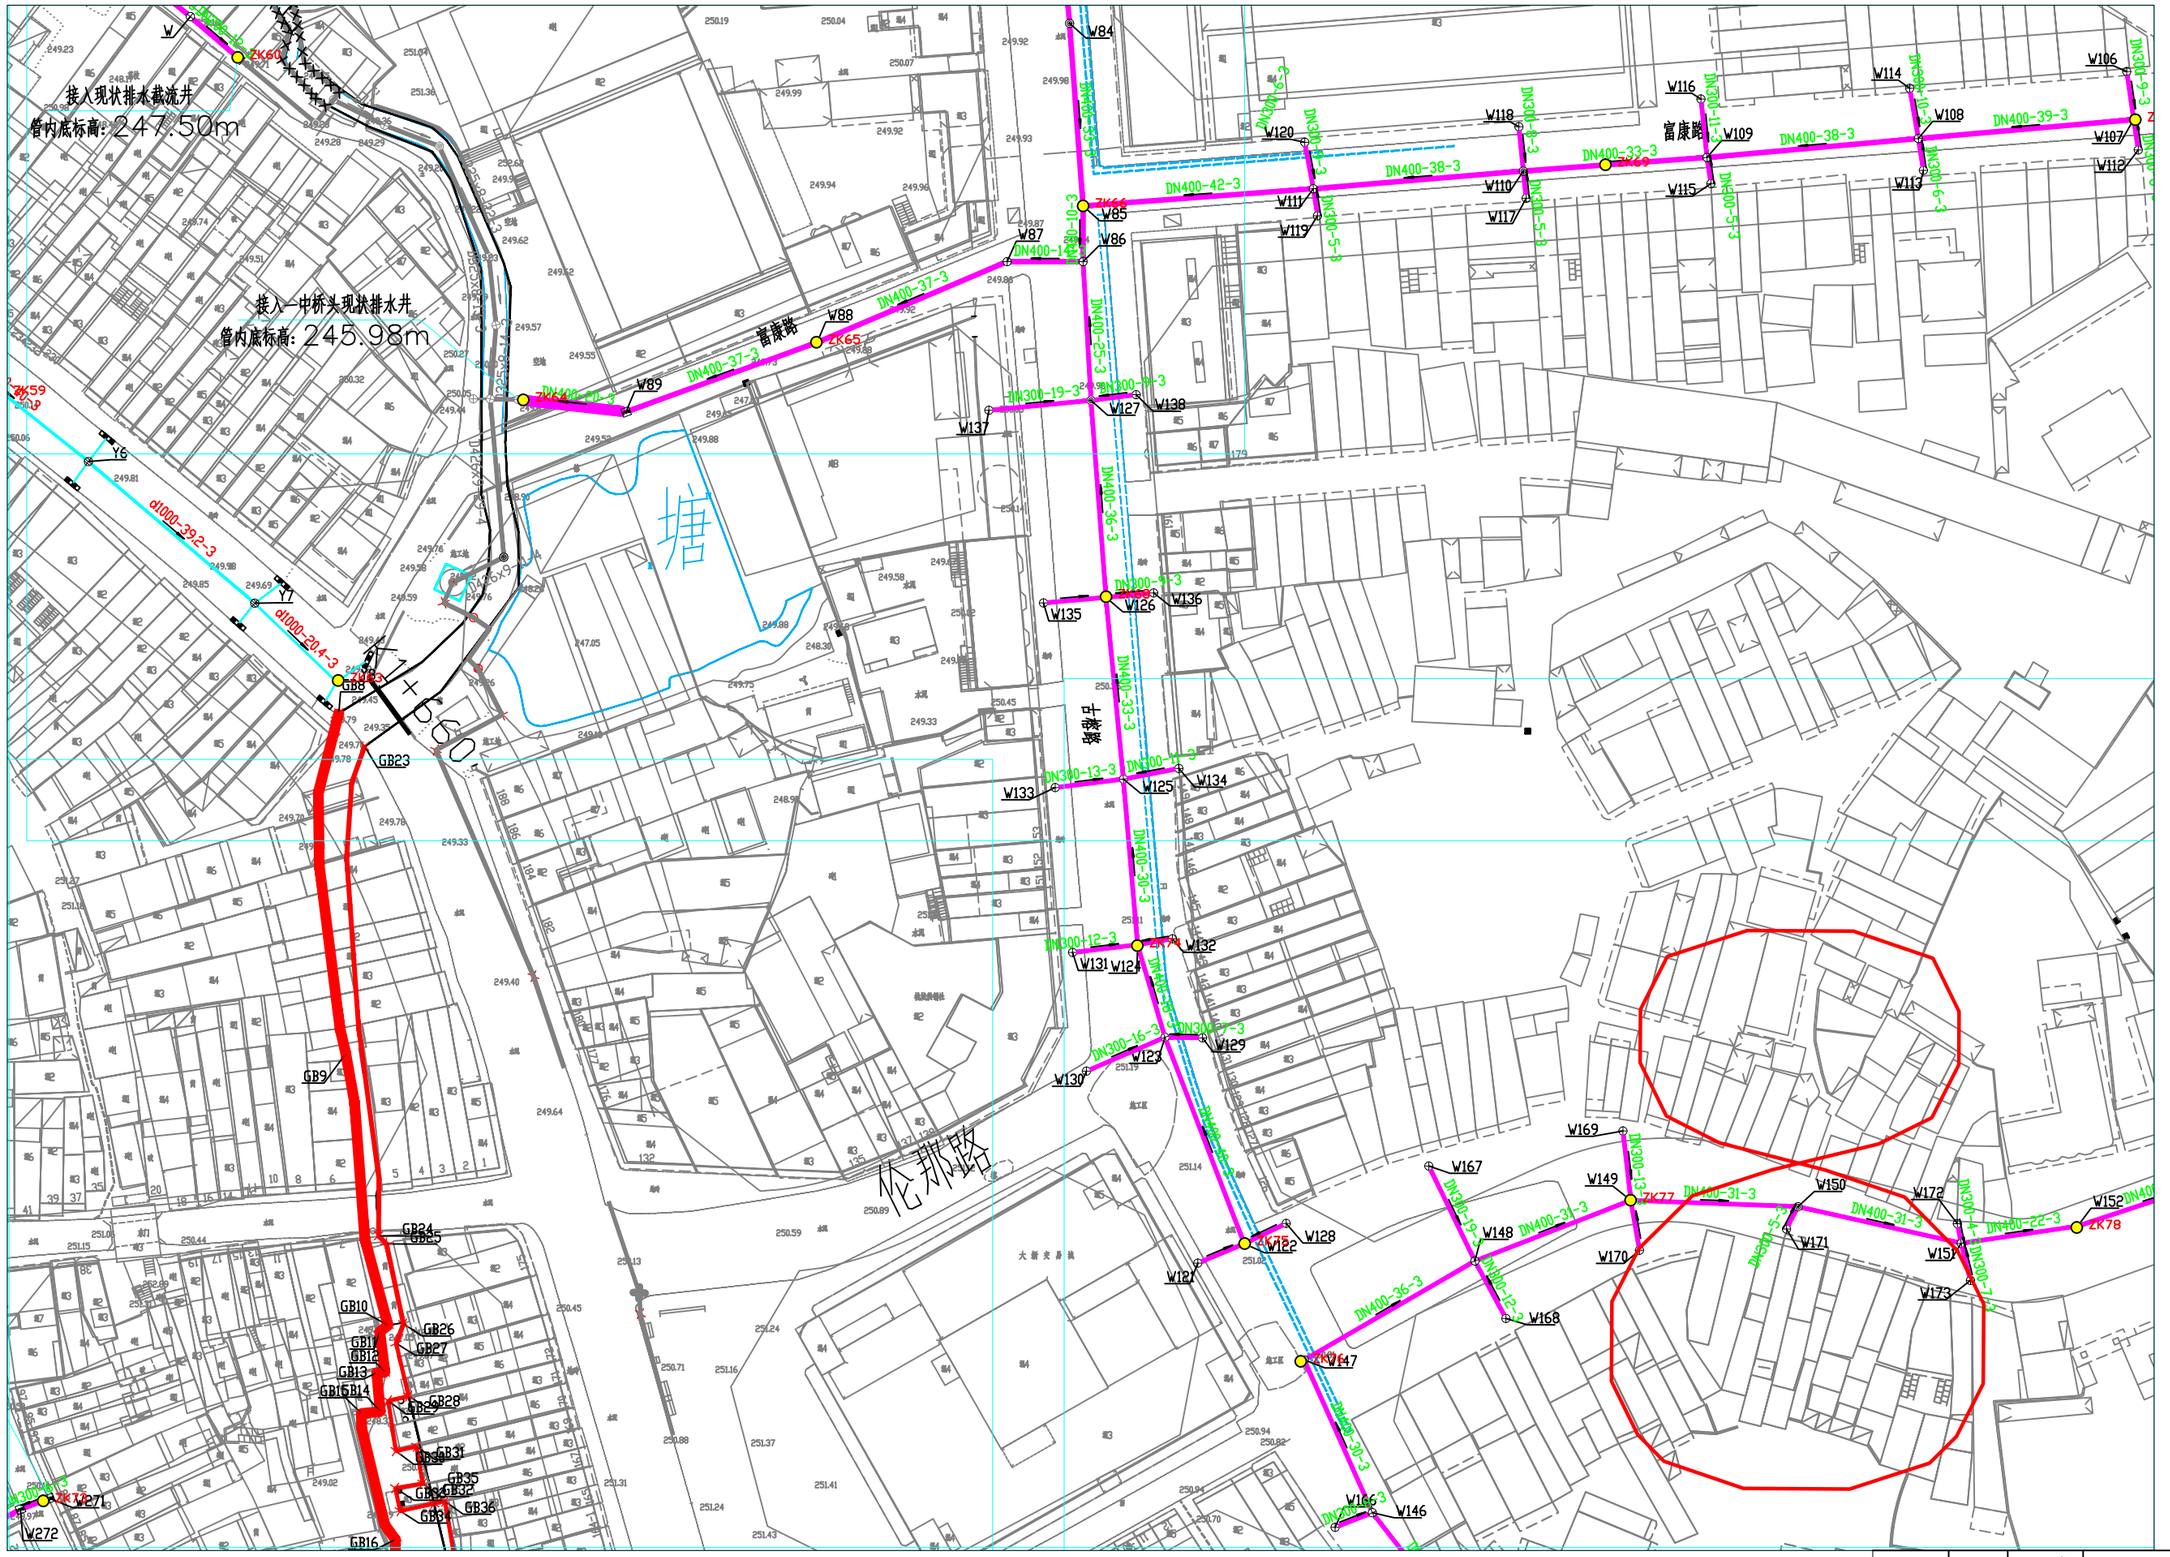
接入现状排水截流井
管内底标高：247.50m
接入一中桥头现状排水井
管内底标高：245.98m
富康路
伦邦路
塘
ZK59
ZK60
ZK61
ZK62
ZK63
ZK64
ZK65
ZK66
ZK67
ZK68
ZK69
ZK70
ZK71
ZK72
ZK73
ZK74
ZK75
ZK76
ZK77
ZK78
W84
W85
W86
W87
W88
W89
W106
W107
W108
W109
W110
W111
W112
W113
W114
W115
W116
W117
W118
W119
W120
W121
W122
W123
W124
W125
W126
W127
W128
W129
W130
W131
W132
W133
W134
W135
W136
W137
W138
W146
W147
W148
W149
W150
W152
W157
W167
W168
W169
W170
W171
W172
W173
GB8
GB9
GB10
GB11
GB12
GB13
GB14
GB15
GB16
GB17
GB23
GB24
GB25
GB26
GB27
GB28
GB29
GB30
GB31
GB32
GB33
GB34
GB35
GB36
Y6
Y7
W271
W272
DN400-42-3
DN400-38-3
DN400-37-3
DN400-33-3
DN400-39-3
DN400-31-3
DN400-36-3
DN400-30-3
DN400-22-3
DN300-19-3
DN300-16-3
DN300-13-3
DN300-12-3
DN300-11-3
DN300-9-3
DN300-7-3
DN300-6-3
DN300-5-3
DN300-4-3
DN300-12-2
DN300-19-2
DN300-13-2
DN300-5-2
DN300-4-2
DN300-6-2
DN300-7-2
DN300-8-2
DN300-9-2
DN300-10-2
DN300-11-2
DN300-12-2
DN300-13-2
DN300-14-2
DN300-15-2
DN300-16-2
DN300-17-2
DN300-18-2
DN300-19-2
DN300-20-2
DN300-21-2
DN300-22-2
DN300-23-2
DN300-24-2
DN300-25-2
DN300-26-2
DN300-27-2
DN300-28-2
DN300-29-2
DN300-30-2
DN300-31-2
DN300-32-2
DN300-33-2
DN300-34-2
DN300-35-2
DN300-36-2
DN300-37-2
DN300-38-2
DN300-39-2
DN300-40-2
DN300-41-2
DN300-42-2
DN300-43-2
DN300-44-2
DN300-45-2

建筑（构）物与勘探点平面位置图

比例尺 1:1100

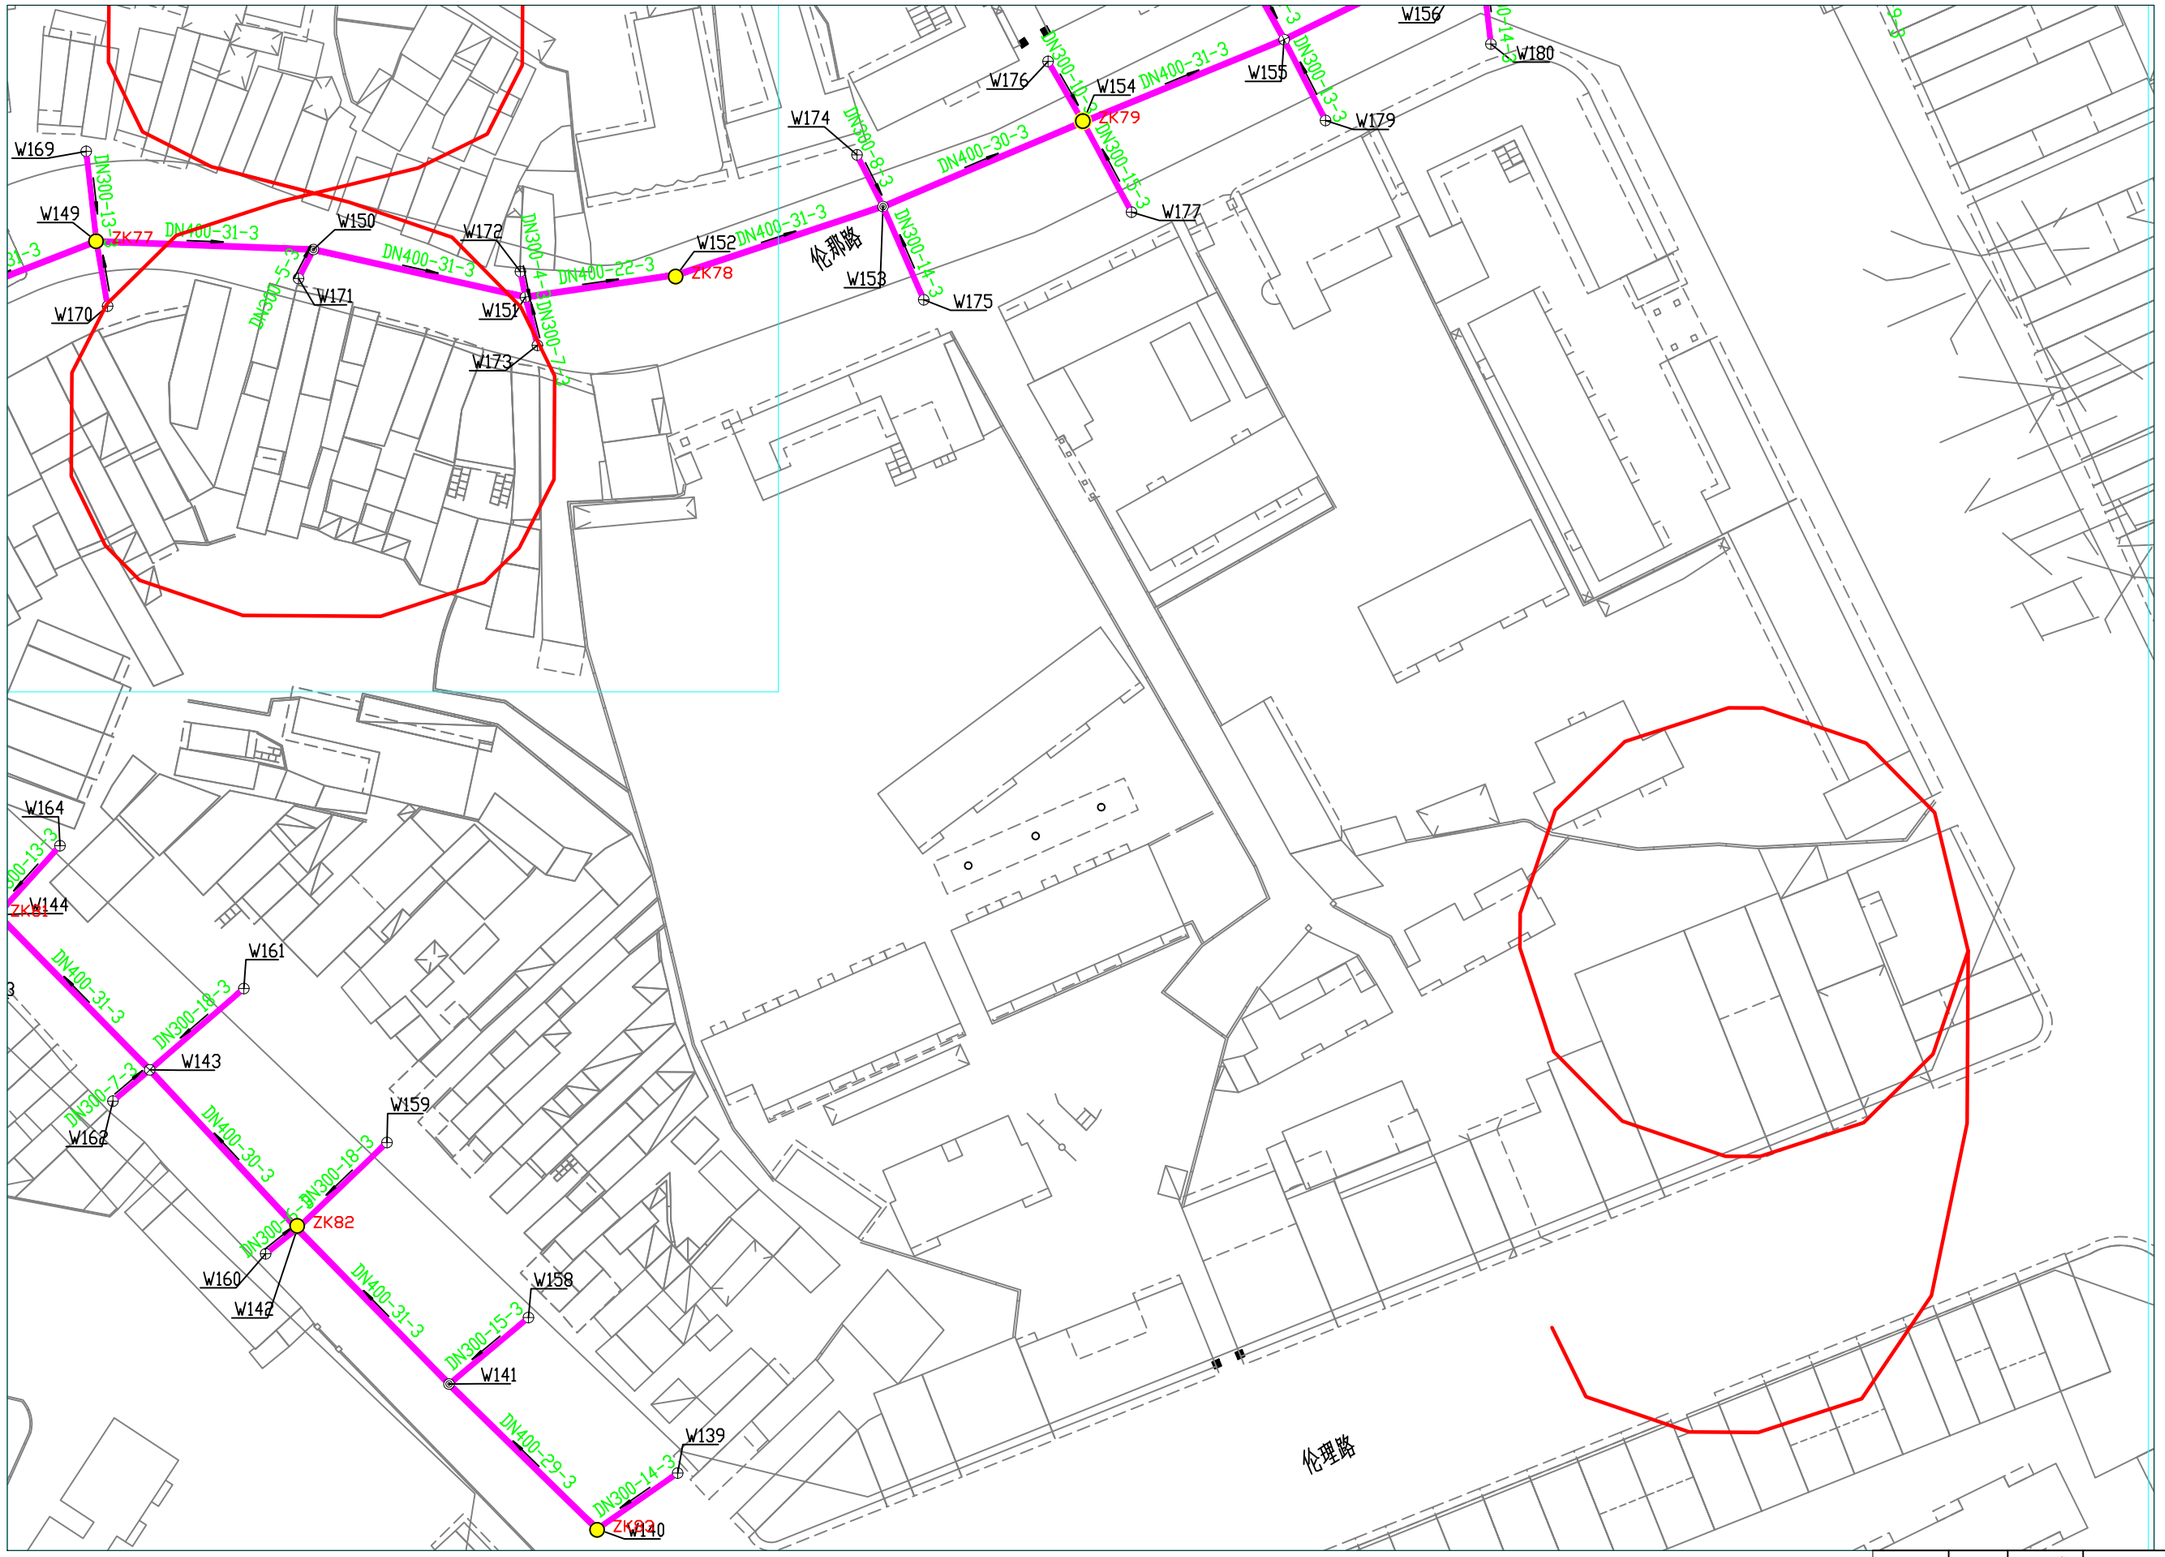


图例

ZK80 钻孔位置及编号

审　定	阮成清		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	
审　核	郑　义		资质等级：甲级　证书编号：B245015689	
项目负责	覃　峰		建设单位	大新县住房和城乡建设局
校　对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(城园片区)工程一期
制　图	莫家里		平面图	图号 9　日期 2025.09


建筑（构）物与勘探点平面位置图

比例尺 1:1100

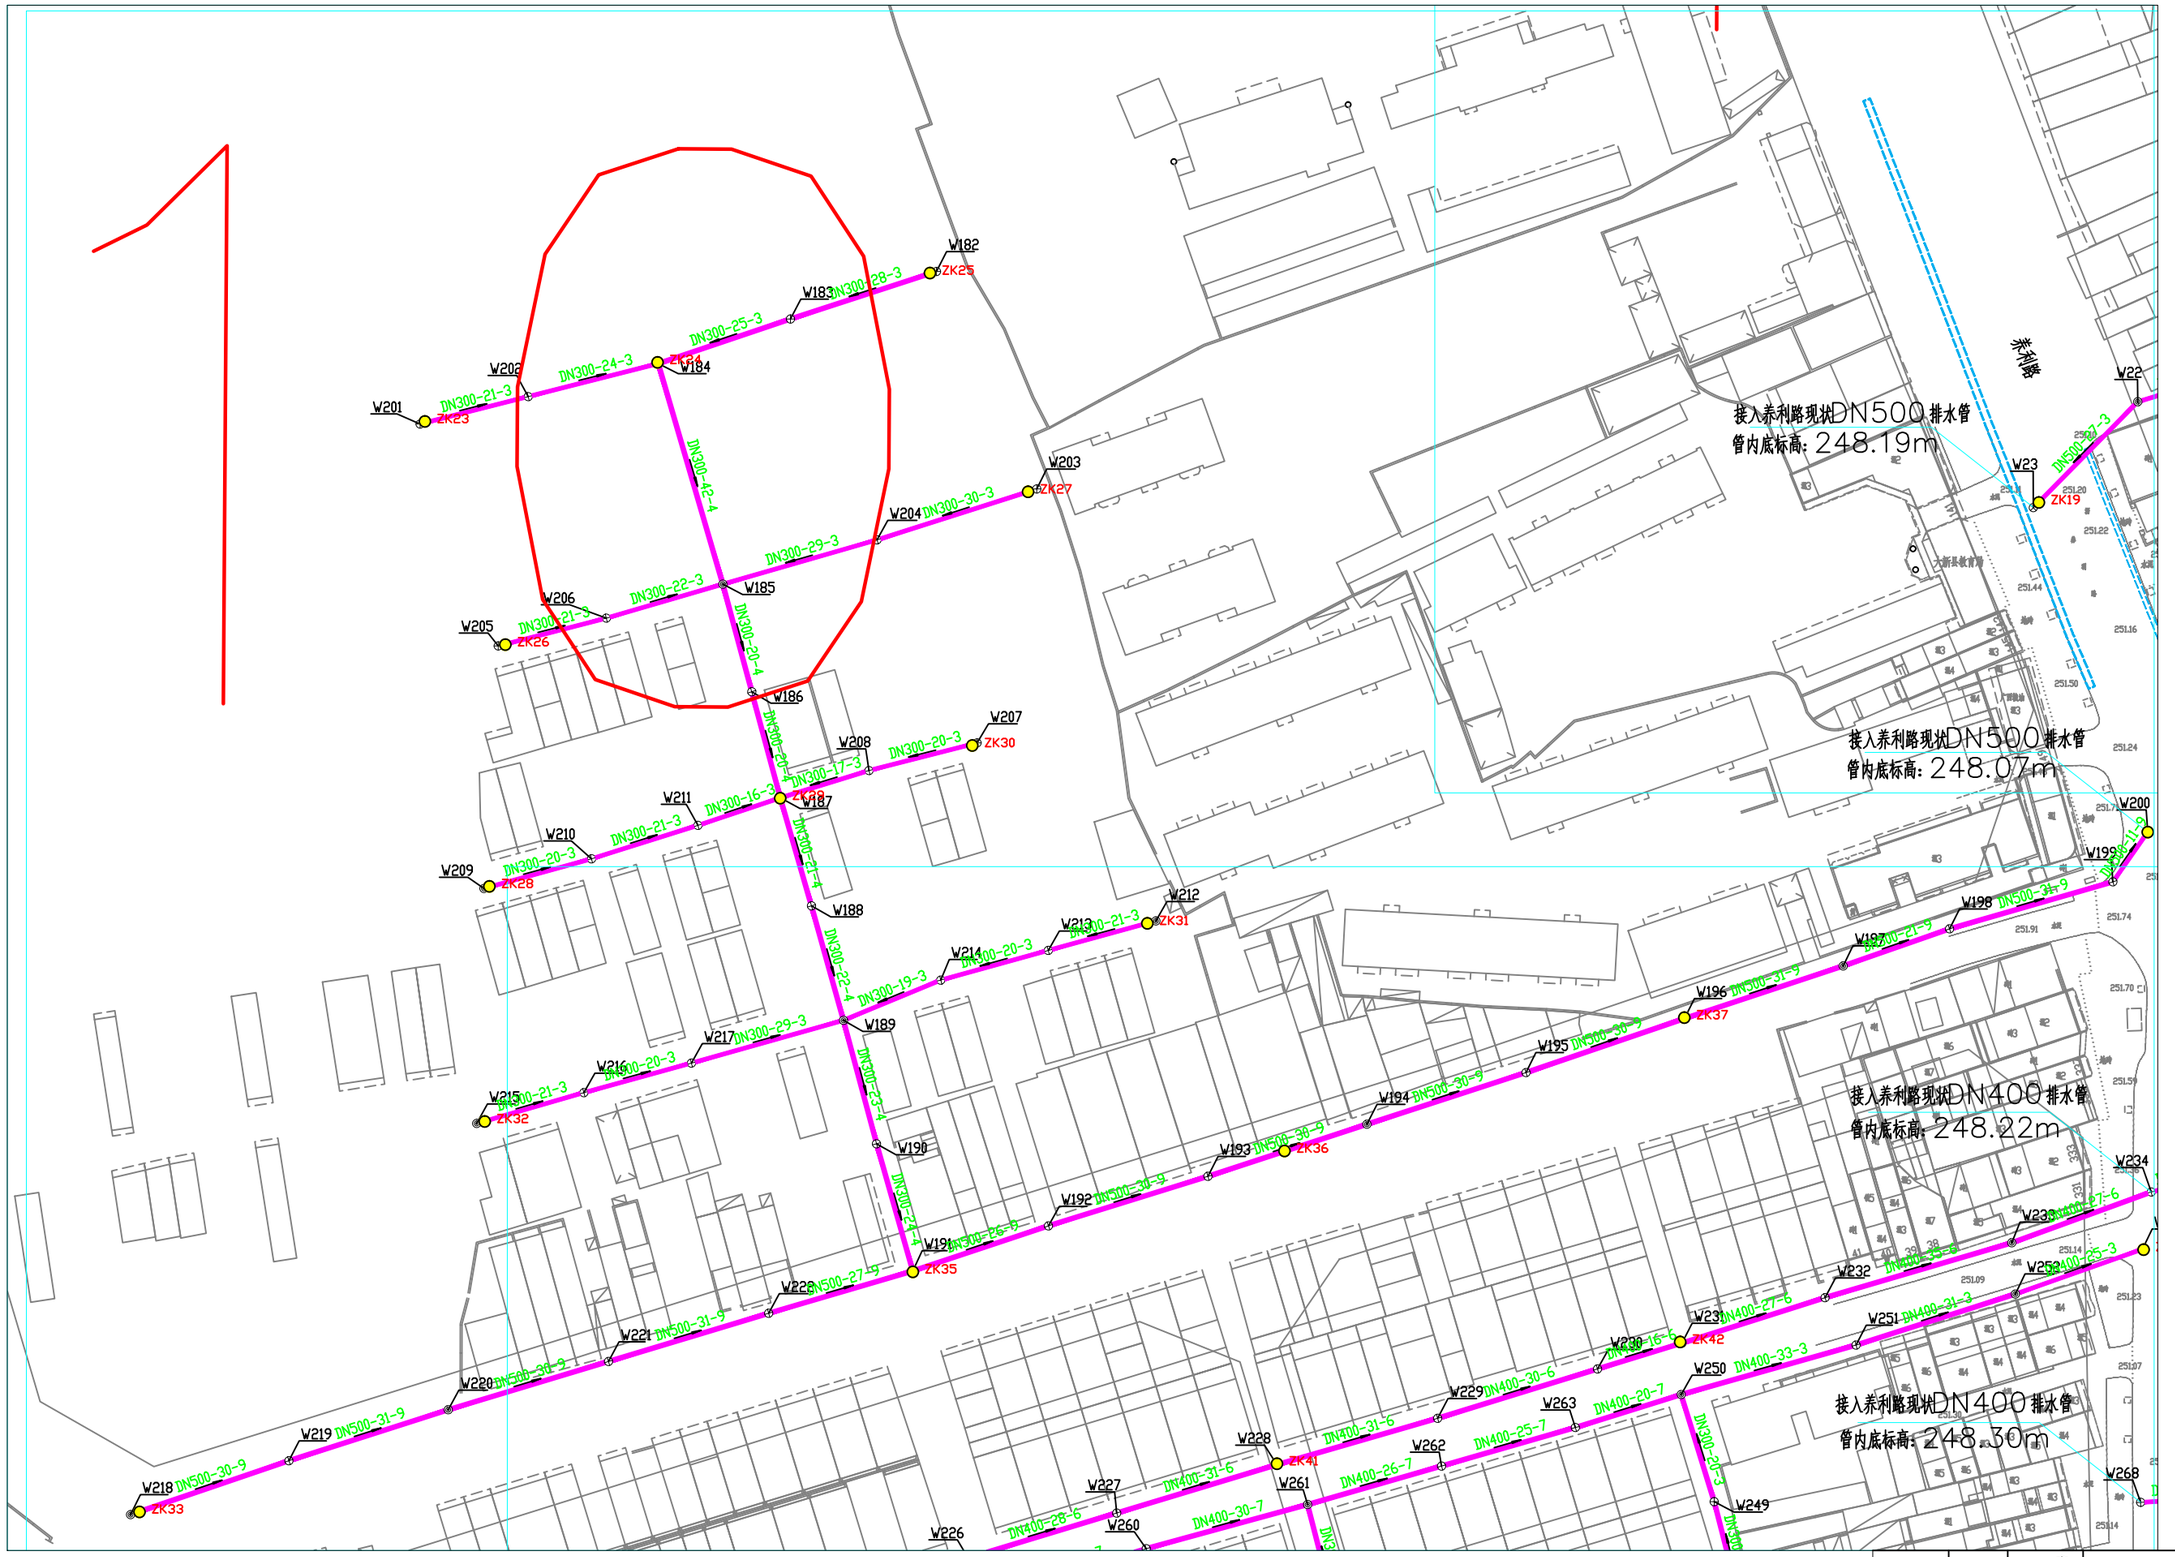

建筑（构）物与勘探点平面位置图

比例尺 1:1100

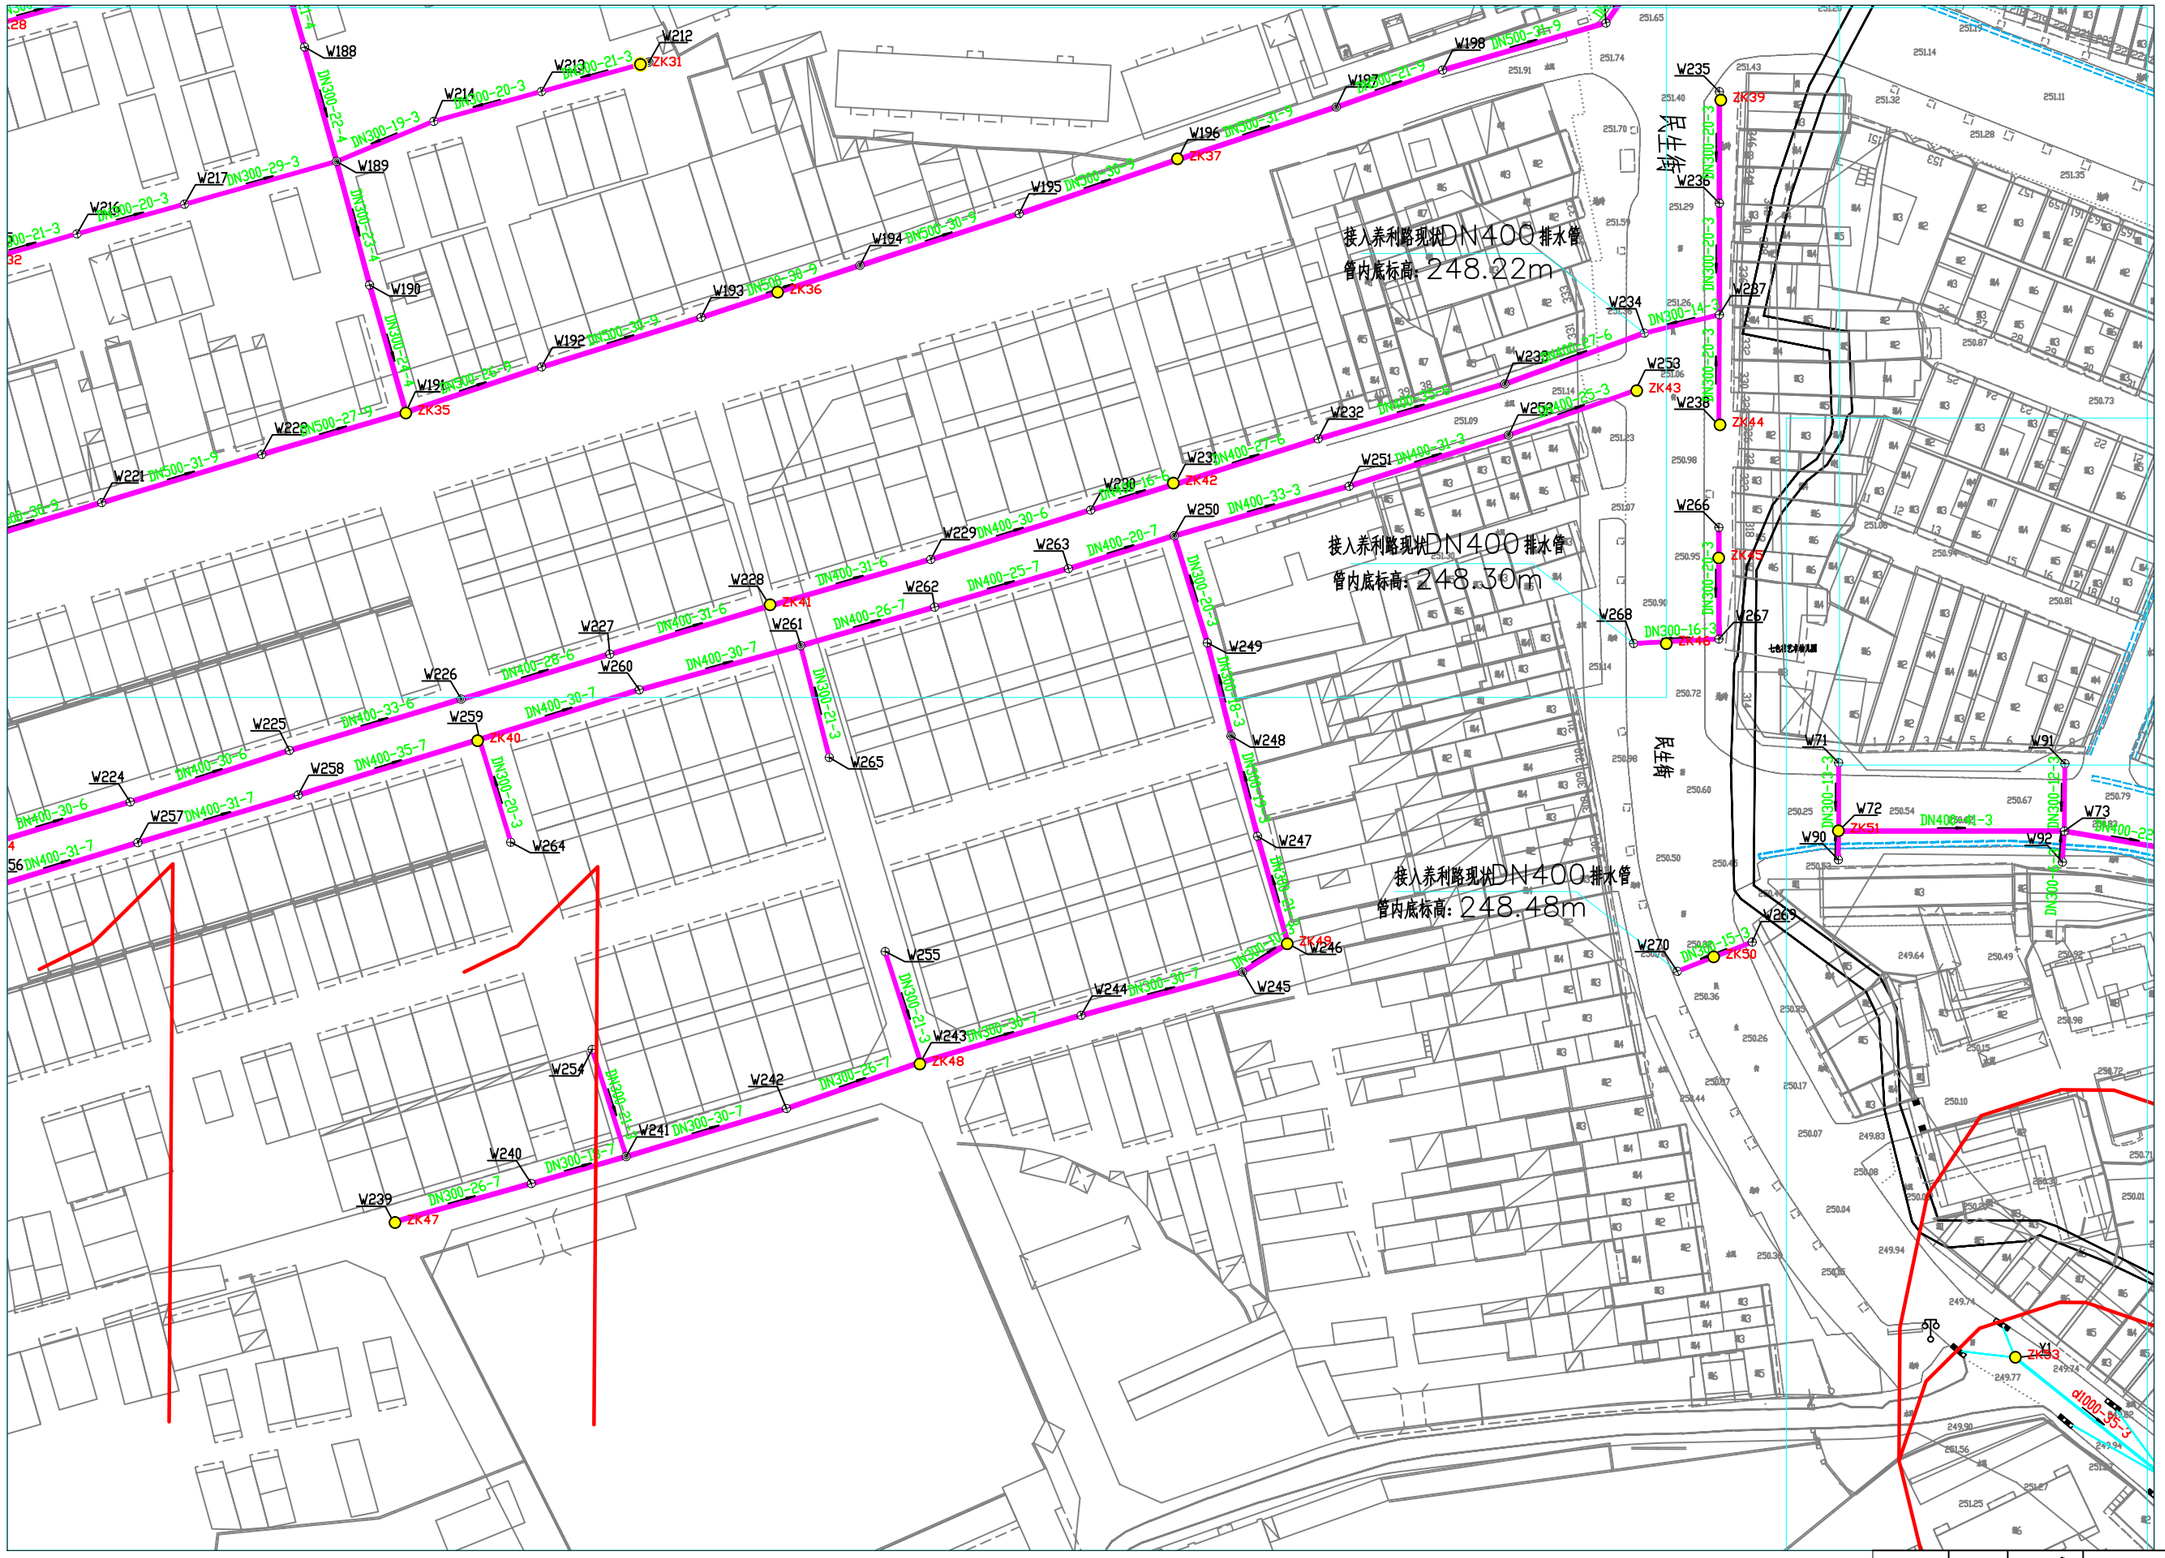


图例

ZK80 钻孔位置及编号

审　定	阮成清		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司				
审　核	郑　义		资质等级：甲级　　证书编号：B245015689				
项目负责	覃　峰		建设单位	大新县住房和城乡建设局			
校　对	李可茂		项目名称	大新县城区铁桥排涝排水工程(镇园片区)工程一期			
制　图	莫家里		平面图	图号	11	日期	2025.09


建筑（构）物与勘探点平面位置图

比例尺 1:1100

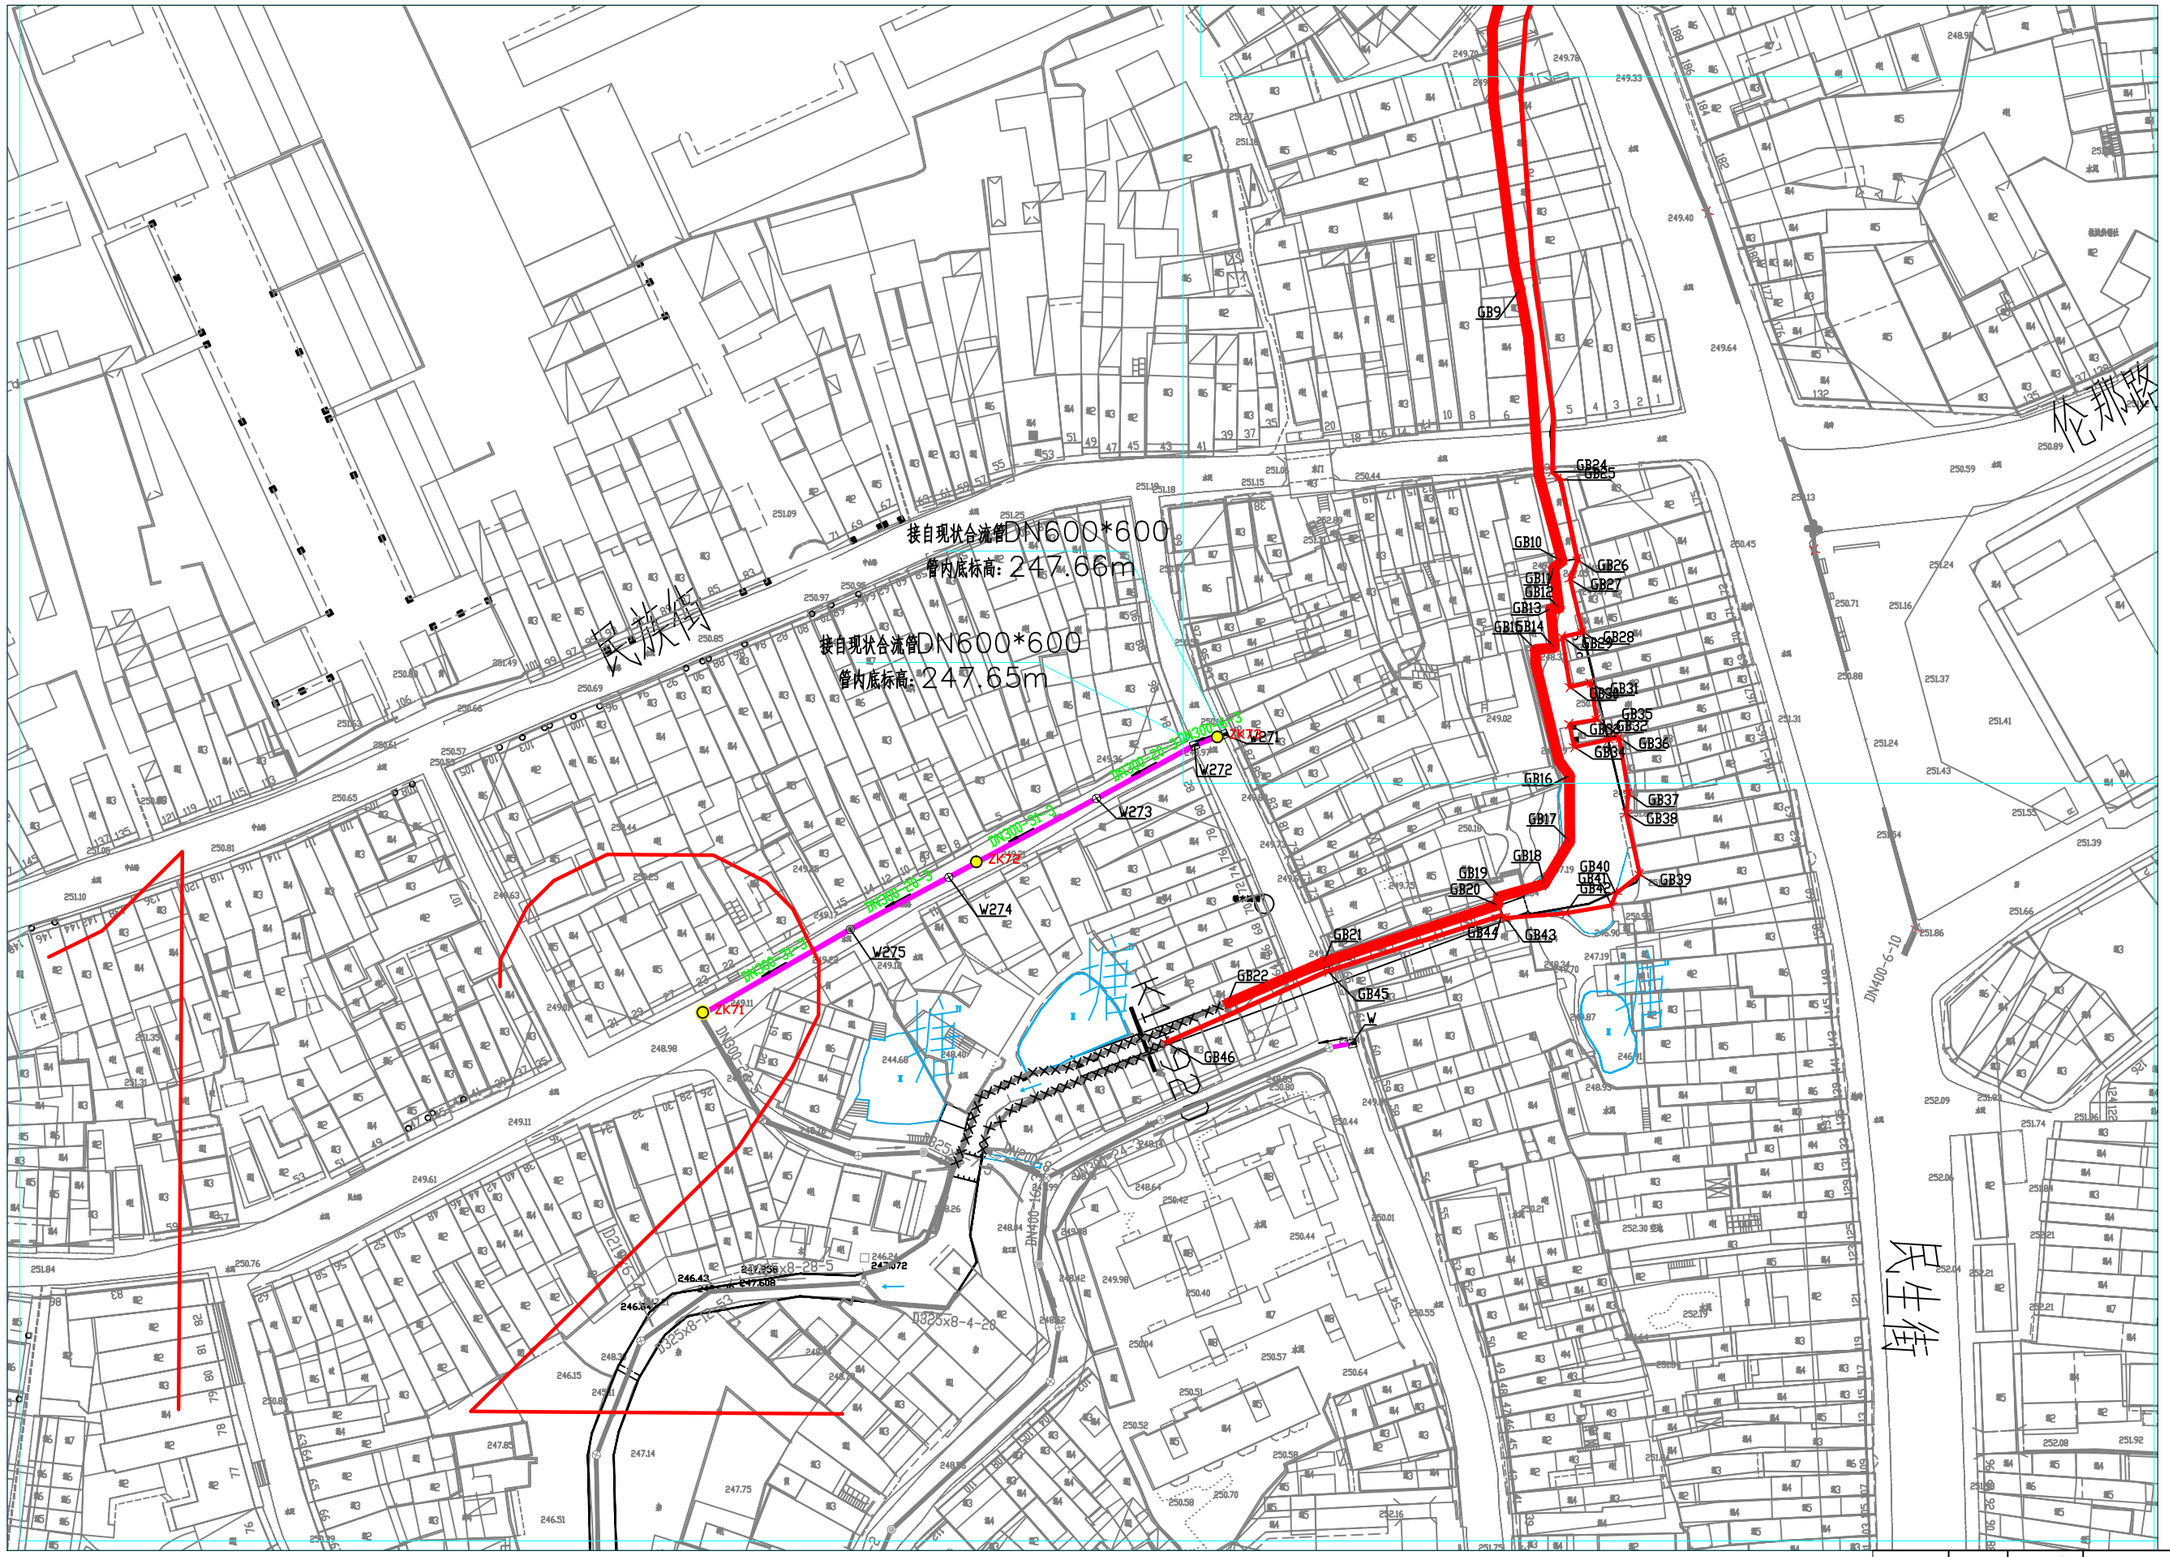
接自现状合流管DN600*600
管内底标高:247.66m
接自现状合流管DN600*600
管内底标高:247.65m
ZK71
ZK72
ZK73
W271
W272
W273
W274
W275
GB9
GB10
GB12
GB13
GB14
GB15
GB16
GB17
GB18
GB19
GB20
GB21
GB22
GB24
GB25
GB26
GB27
GB28
GB29
GB30
GB31
GB32
GB33
GB34
GB35
GB36
GB37
GB38
GB39
GB40
GB41
GB42
GB43
GB44
GB45
GB46
DN300-25-3
DN300-25-3
DN300-25-3
DN300-25-3
DN400-6-10
D225x8-28-5
D225x8-4-28
D225x8-4-53
D225x8-28-5
D225x8-4-28
D225x8-4-53
D225x8-28-5
D225x8-4-28
D225x8-4-53

建筑（构）物与勘探点平面位置图

比例尺 1:1100

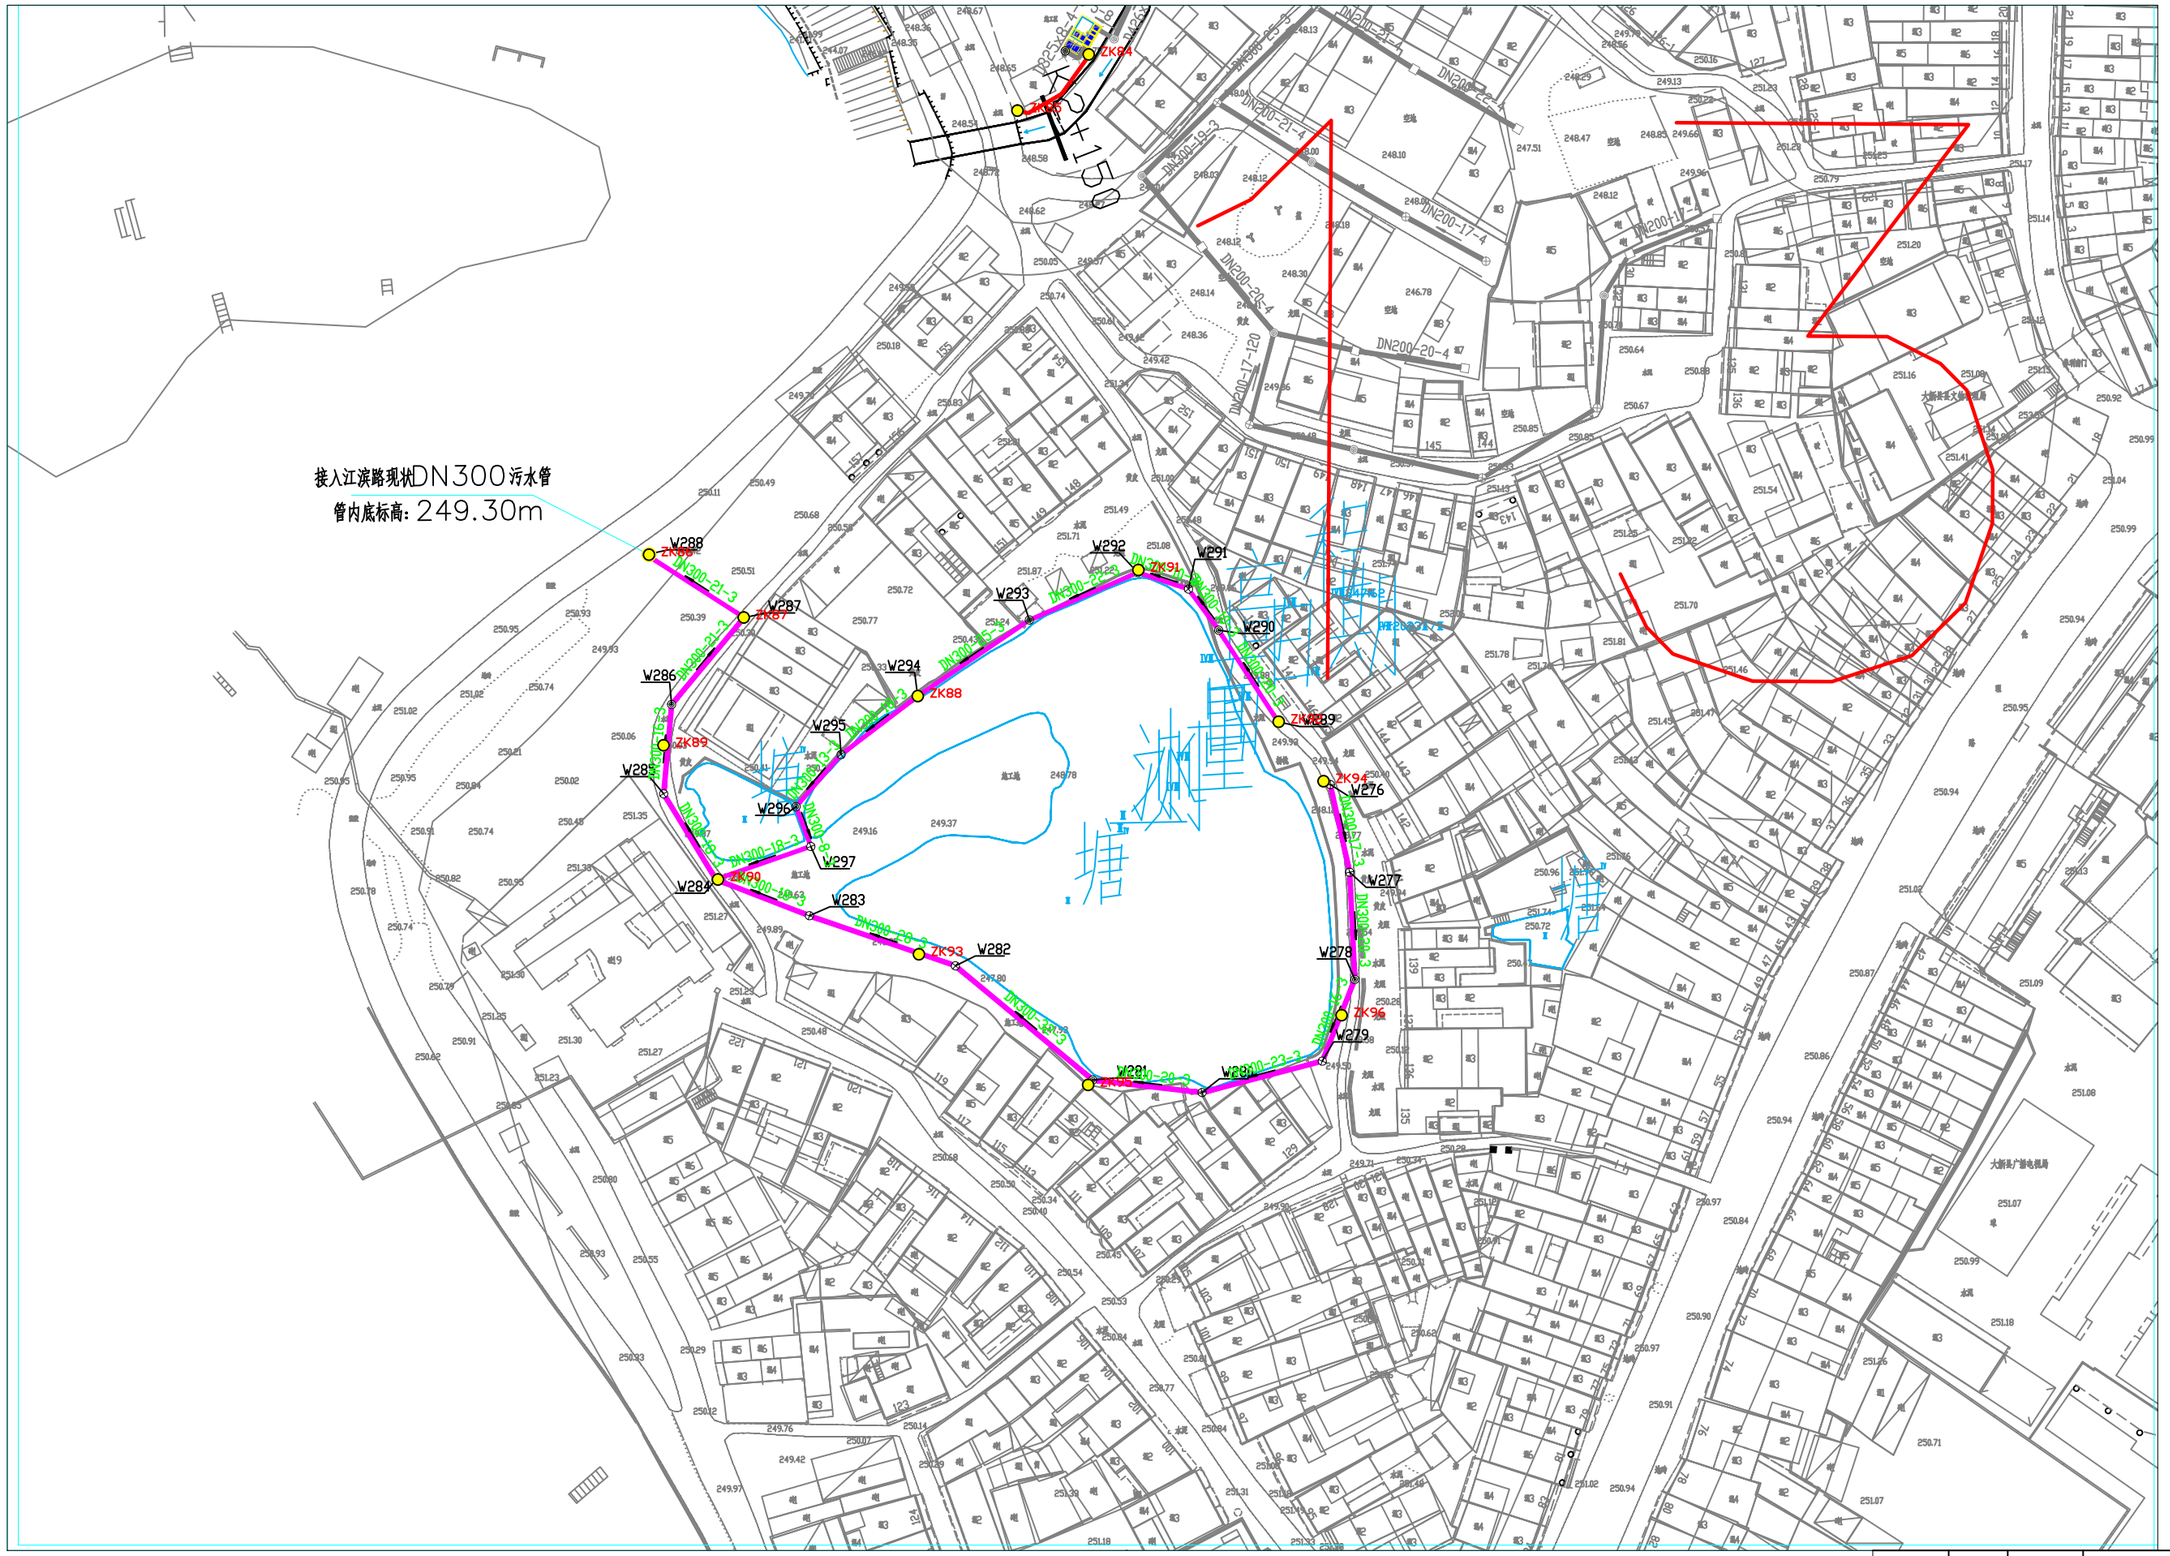

图例

ZK80 钻孔位置及编号

审　定	阮成清		广西昇龙工程勘察设计检测有限公司				
审　核	郑　义		资质等级：甲级　　证书编号：B245015689				
项目负责	覃　嵴		建设单位	大新县住房和城乡建设局			
校　对	李可茂		项目名称	大新县城区防洪排涝排水工程(镇园片区)工程一期			
制　图	莫家里		平面图	图号	13	日期	2025.09
