报告编号：SLTG26-0001

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司
土工试验报告（一）

（受控编号：SLBGKJ03-1-1）

委托单位	222001060436广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			收样日期	2026年1月3日	检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	
工程名称	宜州城区地下管网改造提升项目			试验日期	2026年1月4日	机构地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋4号～8号	
样品类别	土 样	样品状态	圆 柱 状	报告日期	2026年1月8日	检测地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋4号～8号	
检验类别	物理力学	检验项目	土工常规分析	样品数量	28组	电话：07782300550 传真：0778-2300550	
检验依据	GB/T50123-2019 JTG E40-2007						

试验编号	送样编号	取样深度	天然状态土的物理指标					比重	液限	塑限	塑性指数	液性指数	抗剪试验		三轴（uu）		压缩试验100-200kPa		含水比	液塑比	渗透系数	自由膨胀率	土样分类
			含水率	密度	干密度	孔隙比	饱和度						黏聚力	内摩擦角	黏聚力	内摩擦角	压缩系数	压缩模量					依据（GB50021-2001）（2009年版）
		—	ω_0	ρ_0	ρ_d	e_0	Sr	Gs	ω_L	ω_P	I_P	I_L	c	φ	c_u	φ_u	a_{1-2}	Es	α_w	I_r	k	δ_{ef}	
		m	%	g/cm³	g/cm³	—	%	—	%	%	—	—	kPa	(°)	kPa	(°)	MPa⁻¹	MPa			cm/s	%	--
SLTG26-0001-1	BK1-1	5.00-5.30	26.4	1.82	1.44	0.882	81	2.71	44.9	22.6	22.3	0.17	33.50	13.90	-	-	0.18	10.46	0.59	1.99	-	-	红黏土
SLTG26-0001-2	BK5-1	5.00-5.30	25.1	1.93	1.54	0.761	90	2.72	43.1	22.4	20.7	0.13	31.60	12.70	-	-	0.15	11.76	0.58	1.92	-	37	红黏土
SLTG26-0001-3	BK8-1	4.20-4.50	28.3	1.88	1.47	0.849	90	2.71	45.9	23.5	22.4	0.21	32.50	15.10	30.00	12.80	0.14	13.21	0.62	1.95	-	-	红黏土
SLTG26-0001-4	BK10-1	5.00-5.30	30.1	1.84	1.41	0.930	88	2.73	51.7	26.4	25.3	0.15	31.90	12.50	-	-	0.19	10.16	0.58	1.96	-	-	红黏土
SLTG26-0001-5	BK15-1	4.00-4.30	25.2	1.85	1.48	0.834	82	2.71	42.3	22.1	20.2	0.15	32.80	14.70	-	-	0.20	9.17	0.60	1.91	-	-	红黏土
SLTG26-0001-6	BK18-1	3.00-3.30	27.3	1.92	1.51	0.810	92	2.73	50.9	22.4	28.5	0.17	31.10	13.30	-	-	0.26	6.96	0.54	2.27	-	-	红黏土
SLTG26-0001-7	BK19-1	6.00-6.30	28.9	1.95	1.51	0.791	99	2.71	46.7	26.3	20.4	0.13	30.50	13.10	-	-	0.15	11.94	0.62	1.78	-	-	红黏土
SLTG26-0001-8	BK20-1	5.00-5.30	27.8	1.92	1.50	0.811	93	2.72	43.7	24.6	19.1	0.17	32.10	13.80	-	-	0.16	11.32	0.64	1.78	-	-	红黏土
SLTG26-0001-9	BK22-1	3.00-3.30	28.5	1.89	1.47	0.843	92	2.71	47.1	26.0	21.1	0.12	33.40	14.90	-	-	0.18	10.24	0.61	1.81	-	-	红黏土
SLTG26-0001-10	BK24-1	1.00-1.30	28.3	1.87	1.46	0.866	89	2.72	44.9	24.6	20.3	0.18	32.90	12.40	-	-	0.19	9.82	0.63	1.83	-	40	红黏土
SLTG26-0001-11	BK26-1	7.00-7.30	30.4	1.85	1.42	0.910	91	2.71	49.2	27.0	22.2	0.15	31.50	16.10	-	-	0.22	8.68	0.62	1.82	-	-	红黏土
SLTG26-0001-12	BK30-1	7.50-7.80	29.8	1.83	1.41	0.922	88	2.71	50.8	25.5	25.3	0.17	30.60	14.80	-	-	0.26	7.39	0.59	1.99	-	-	红黏土
SLTG26-0001-13	BK35-1	4.50-4.80	26.8	1.85	1.46	0.864	84	2.72	43.7	23.2	20.5	0.18	32.40	13.70	-	-	0.23	8.11	0.61	1.88	-	-	红黏土
SLTG26-0001-14	BK44-1	3.10-3.40	29.8	1.93	1.49	0.835	97	2.73	49.2	26.5	22.7	0.14	31.90	14.40	-	-	0.17	10.80	0.60	1.86	-	-	红黏土
SLTG26-0001-15	BK45-1	4.00-4.30	28.4	1.88	1.46	0.858	90	2.72	53.5	24.5	29.0	0.13	33.50	14.90	-	-	0.18	10.32	0.53	2.18	-	-	红黏土
SLTG26-0001-16	BK57-1	3.00-3.30	26.8	1.93	1.52	0.780	93	2.71	44.1	22.9	21.2	0.18	36.10	15.40	-	-	0.23	7.74	0.61	1.93	-	-	红黏土
SLTG26-0001-17	BK60-1	5.00-5.30	28.9	1.85	1.44	0.895	88	2.72	50.6	25.5	25.1	0.14	34.70	13.40	29.91	11.78	0.21	9.02	0.57	1.98	-	-	红黏土
SLTG26-0001-18	BK63-1	3.20-3.50	26.9	1.92	1.51	0.791	92	2.71	43.5	23.7	19.8	0.16	35.40	14.20			0.25	7.16	0.62	1.84	-	-	红黏土
SLTG26-0001-19	BK76-1	2.40-2.70	27.9	1.95	1.52	0.784	97	2.72	50.1	24.6	25.5	0.13	35.90	15.80			0.19	9.39	0.56	2.04	-	-	红黏土
SLTG26-0001-20	BK85-1	3.40-3.70	26.5	1.75	1.38	0.960	75	2.71	49.1	22.9	26.2	0.14	34.20	14.50	-	-	0.22	8.91	0.54	2.14	-	-	红黏土
SLTG26-0001-21	BK92-1	5.00-5.30	30.8	1.83	1.40	0.951	88	2.73	54.7	27.5	27.2	0.12	36.10	15.30	-	-	0.20	9.76	0.56	1.99	-	33	红黏土
SLTG26-0001-22	BK93-1	1.30-1.60	25.9	1.80	1.43	0.895	78	2.71	43.5	22.9	20.6	0.15	35.20	13.80	-	-	0.19	9.98	0.60	1.90	-	-	红黏土
SLTG26-0001-23	BK97-1	3.10-3.40	26.3	1.82	1.44	0.881	81	2.71	42.1	23.9	18.2	0.13	33.80	14.20	-	-	0.27	6.97	0.62	1.76	-	-	红黏土
SLTG26-0001-24	BK98-1	1.70-2.00	26.3	1.83	1.45	0.877	82	2.72	45.8	21.9	23.9	0.18	32.90	13.40	-	-	0.24	7.82	0.57	2.09	-	-	红黏土
SLTG26-0001-25	ZK4-1	5.00-5.30	24.7	1.88	1.51	0.801	84	2.72	43.7	20.8	22.9	0.17	32.40	12.80	-	-	0.18	10.02	0.57	2.10	-	-	红黏土
SLTG26-0001-26	ZK7-1	5.00-5.30	28.4	1.91	1.49	0.822	94	2.71	52.4	23.9	28.5	0.16	30.80	13.70	-	-	0.21	8.68	0.54	2.19	-	-	红黏土
SLTG26-0001-27	ZK11-1	5.00-5.30	27.5	1.83	1.43	0.889	84	2.71	49.6	23.3	26.3	0.16	31.30	14.50	-	-	0.23	8.21	0.56	2.13	-	31	红黏土
SLTG26-0001-28	ZK18-1	6.00-6.30	27.1	1.84	1.45	0.879	84	2.72	43.2	23.8	19.4	0.17	34.50	14.20	-	-	0.24	7.83	0.63	1.82	-	-	红黏土

1. 本公司对出具的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。2. 本公司仅对来样负责。3. 本报告无试验、审核、批准签名；或涂改、缺页；或未盖本公司公章和骑缝章则无效。4. 对本报告若有疑问，可向本公司查询。对试验结果若有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本公司提出复议申请。对于性能不稳定、不宜留样的样品，恕不受理复检。未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，不得用于广告宣传。

批准： 审核： 试验：

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

土工试验报告（二）

报告编号：SLTG26-0001

（受控编号：SLBGKJ03-1-1）

2220010244436

委托单位	广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			收样日期	2026年1月3日	检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司
工程名称	宜州城区地下管网改造提升项目			试验日期	2026年1月4日	机构地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋4号～8号
样品类别	土 样	样品状态	圆 柱 状	报告日期	2026年1月8日	检测地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋1号～8号
检验类别	物理力学	检验项目	土工常规分析	样品数量	28组	电话：07782300550　传真：0778-2300550
检验依据	GB/T50123-2019　JTG E40-2007					

试验编号	送样编号	取样深度	天然状态土的物理指标					比重	液限	塑限	塑性指数	液性指数	抗剪试验		三轴（uu）		压缩试验 100-200kPa		含水比	液塑比	渗透系数	自由膨胀率	土样分类
			含水率	密度	干密度	孔隙比	饱和度						黏聚力	内摩擦角	黏聚力	内摩擦角	压缩系数	压缩模量					依据（GB50021-2001）（2009年版）
		—	ω_0	ρ_0	ρ_d	e_0	Sr	Gs	ω_L	ω_P	I_P	I_L	c	φ	c_u	φ_u	a_{1-2}	Es	α_w	I_r	k	δ_{ef}	
		m	%	g/cm³	g/cm³	—	%	—	%	%	—	—	kPa	(°)	kPa	(°)	MPa⁻¹	MPa			cm/s	%	—
SLTG26-0001-29	ZK19-1	6.50-6.80	27.3	1.92	1.51	0.803	92	2.72	44.1	24.1	20.0	0.16	32.10	14.10	–	–	0.19	9.49	0.62	1.83	–	–	红黏土
SLTG26-0001-30	ZK22-1	6.00-6.30	28.9	1.94	1.50	0.801	98	2.71	45.2	26.2	19.0	0.14	34.60	14.80	–	–	0.22	8.19	0.64	1.73	–	–	红黏土
SLTG26-0001-31	ZK26-1	1.00-1.30	26.7	1.83	1.44	0.876	83	2.71	43.6	23.2	20.4	0.17	35.40	13.90	–	–	0.19	9.88	0.61	1.88	–	–	红黏土
SLTG26-0001-32	ZK34-1	4.00-4.30	28.6	1.82	1.42	0.922	84	2.72	49.2	24.5	24.7	0.17	38.50	12.50	–	–	0.20	9.61	0.58	2.01	–	–	红黏土
SLTG26-0001-33	ZK41-1	5.00-5.30	29.7	1.81	1.40	0.942	85	2.71	46.1	26.7	19.4	0.15	36.50	14.10	–	–	0.22	8.83	0.64	1.73	–	–	红黏土
SLTG26-0001-34	ZK44-1	3.50-3.80	29.8	1.91	1.47	0.842	96	2.71	45.2	27.5	17.7	0.13	39.10	15.40	–	–	0.19	9.69	0.66	1.64	–	–	红黏土
SLTG26-0001-35	ZK45-1	5.00-5.30	25.4	1.86	1.48	0.834	83	2.72	43.2	22.9	20.3	0.12	40.20	13.60	–	–	0.18	10.19	0.59	1.89	–	–	红黏土
SLTG26-0001-36	ZK46-1	3.00-3.30	26.8	1.88	1.48	0.828	88	2.71	46.5	22.8	23.7	0.17	51.30	13.50	–	–	0.24	7.62	0.58	2.04	–	–	红黏土
SLTG26-0001-37	ZK50-1	5.00-5.30	31.8	1.84	1.40	0.941	92	2.71	46.5	26.5	20.0	0.26	49.80	14.20	–	–	0.20	9.71	0.68	1.75	–	38	红黏土
SLTG26-0001-38	ZK53-1	5.00-5.30	28.3	1.92	1.50	0.818	94	2.72	48.2	22.7	25.5	0.22	43.20	15.10	–	–	0.26	6.99	0.59	2.12	–	–	红黏土
SLTG26-0001-39	ZK54-1	3.00-3.30	29.8	1.86	1.43	0.891	91	2.71	51.5	26.8	24.7	0.12	50.20	14.90	–	–	0.19	9.95	0.58	1.92	–	–	红黏土
SLTG26-0001-40	ZK56-1	4.00-4.30	28.5	1.95	1.52	0.786	98	2.71	52.7	24.6	28.1	0.14	37.60	13.80	33.08	12.04	0.22	8.12	0.54	2.14	–	–	红黏土
SLTG26-0001-41	ZK58-1	5.00-5.30	25.9	1.86	1.48	0.834	84	2.71	48.2	22.4	25.8	0.13	44.90	13.20	–	–	0.24	7.64	0.54	2.15	–	–	红黏土
SLTG26-0001-42	ZK61-1	3.10-3.40	29.6	1.91	1.47	0.839	96	2.71	44.7	26.6	18.1	0.17	35.90	14.60	–	–	0.18	10.22	0.66	1.68	–	–	红黏土
SLTG26-0001-43	ZK65-1	4.00-4.30	30.8	1.84	1.41	0.934	90	2.72	52.6	28.2	24.4	0.11	43.70	13.90	–	–	0.16	12.08	0.59	1.87	–	–	红黏土
SLTG26-0001-44	ZK69-1	6.00-6.30	29.8	1.82	1.40	0.933	87	2.71	54.8	25.4	29.4	0.15	40.50	14.20	–	–	0.19	10.17	0.54	2.16	–	–	红黏土
SLTG26-0001-45	ZK70-1	2.00-2.30	28.2	1.81	1.41	0.919	83	2.71	49.6	24.3	25.3	0.15	48.20	13.30	–	–	0.21	9.14	0.57	2.04	–	35	红黏土
SLTG26-0001-46	ZK72-1	3.30-3.60	26.7	1.91	1.51	0.801	90	2.72	44.1	22.9	21.2	0.18	51.30	15.50			0.23	7.84	0.61	1.93	–	–	红黏土
SLTG26-0001-47	ZK79-1	5.20-5.50	28.4	1.88	1.46	0.851	90	2.71	50.5	24.9	25.6	0.14	46.20	14.20			0.17	10.89	0.56	2.03	–	–	红黏土
SLTG26-0001-48	ZK80-1	3.00-3.30	24.8	1.83	1.47	0.848	79	2.71	42.8	22.3	20.5	0.12	43.30	13.60	–	–	0.15	12.32	0.58	1.92	–	–	红黏土
SLTG26-0001-49	BK105-1	3.10-3.40	25.3	1.82	1.45	0.866	79	2.71	43.8	21.9	21.9	0.16	42.10	14.30	–	–	0.16	11.66	0.58	2.00	–	–	红黏土
SLTG26-0001-50	BK106-1	3.10-3.40	25.2	1.95	1.56	0.746	92	2.72	48.3	20.8	27.5	0.16	49.60	15.10	–	–	0.18	9.70	0.52	2.32	–	–	红黏土
SLTG26-0001-51	BK107-1	1.50-1.80	28.2	1.84	1.44	0.888	86	2.71	48.2	24.5	23.7	0.16	44.80	14.80	–	–	0.21	8.99	0.59	1.97	–	–	红黏土
SLTG26-0001-52	ZK100-1	1.00-1.30	28.1	1.82	1.42	0.907	84	2.71	49.2	23.9	25.3	0.17	39.50	13.20	–	–	0.17	11.22	0.57	2.06	–	–	红黏土
SLTG26-0001-53	ZK102-1	1.50-1.80	26.4	1.81	1.43	0.893	80	2.71	43.6	23.5	20.1	0.14	46.90	12.70	–	–	0.19	9.96	0.61	1.86	–	–	红黏土
SLTG26-0001-54	ZK107-1	2.50-2.80	25.4	1.93	1.54	0.774	90	2.73	46.8	20.5	26.3	0.19	42.70	12.90	–	–	0.21	8.45	0.54	2.28	–	–	红黏土
SLTG26-0001-55	ZK112-1	2.10-2.40	29.1	1.89	1.46	0.851	93	2.71	47.3	26.4	20.9	0.13	39.50	14.20	34.60	10.16	0.26	7.12	0.62	1.79	–	–	红黏土
SLTG26-0001-56	ZK113-1	3.00-3.30	27.1	1.79	1.41	0.924	79	2.71	47.2	23.1	24.1	0.17	51.60	15.20	–	–	0.16	12.03	0.57	2.04	–	–	红黏土

1. 本公司对出具的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。2. 本公司仅对来样负责。3. 本报告无试验、审核、批准签名；或涂改、缺页；或未盖本公司公章和骑缝章则无效。4. 对本报告若有疑问，可向本公司查询。对试验结果若有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本公司提出复议申请。对于性能不稳定、不宜留样的样品，恕不受理复检。未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，不得用于广告宣传。

批准：　　审核：　　试验：

报告编号：SLTG26-0001

222001060436

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司
土工试验报告（三）

（受控编号：SLBGKJ03-1-1）

委托单位	广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			收样日期	2026年1月3日	检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司
工程名称	宜州城区地下管网改造提升项目			试验日期	2026年1月4日	机构地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区1-1栋1号～8号
样品类别	土 样	样品状态	圆 柱 状	报告日期	2026年1月8日	检测地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区1-1栋1号～8号
检验类别	物理力学	检验项目	土工常规分析	样品数量	29组	电话：07782300550　传真：0778-2300550
检验依据	GB/T50123-2019　JTG E40-2007					

试验编号	送样编号	取样深度	天然状态土的物理指标					比重	液限	塑限	塑性指数	液性指数	抗剪试验		三轴（uu）		压缩试验100-200kPa		含水比	液塑比	渗透系数	自由膨胀率	土样分类
			含水率	密度	干密度	孔隙比	饱和度						黏聚力	内摩擦角	黏聚力	内摩擦角	压缩系数	压缩模量					依据（GB50021-2001）（2009年版）
		—	ω_0	ρ_0	ρ_d	e_0	Sr	Gs	ω_L	ω_P	I_P	I_L	c	φ	c_u	φ_u	a_{1-2}	Es	α_w	I_r	k	δ_{ef}	
		m	%	g/cm³	g/cm³	—	%	—	%	%	—	—	kPa	(°)	kPa	(°)	MPa⁻¹	MPa			cm/s	%	--
SLTG26-0001-57	ZK124-1	3.50-3.80	29.7	1.82	1.40	0.931	86	2.71	47.0	27.1	19.9	0.13	37.90	14.00	-	-	0.25	7.72	0.63	1.73	-	-	红黏土
SLTG26-0001-58	ZK129-1	6.00-6.30	25.3	1.76	1.40	0.936	73	2.72	43.9	22.1	21.8	0.15	36.10	16.10	-	-	0.22	8.80	0.58	1.99	-	-	红黏土
SLTG26-0001-59	ZK163-1	4.20-4.50	30.2	1.86	1.43	0.897	91	2.71	48.2	26.7	21.5	0.16	35.90	13.80	-	-	0.17	11.16	0.63	1.81	-	-	红黏土
SLTG26-0001-60	ZK165-1	3.10-3.40	30.6	1.81	1.39	0.955	87	2.71	47.6	27.3	20.3	0.16	37.20	14.30	-	-	0.23	8.50	0.64	1.74	-	-	红黏土
SLTG26-0001-61	ZK166-1	5.20-5.50	26.4	1.84	1.46	0.869	83	2.72	48.0	22.3	25.7	0.16	40.20	15.20	32.24	12.84	0.22	8.50	0.55	2.15	-	-	红黏土
SLTG26-0001-62	ZK167-1	3.20-3.50	24.7	1.91	1.53	0.769	87	2.71	44.2	20.7	23.5	0.17	39.90	12.80	-	-	0.19	9.31	0.56	2.14	-	-	红黏土
SLTG26-0001-63	ZK169-1	4.20-4.50	28.2	1.88	1.47	0.848	90	2.71	47.1	23.9	23.2	0.18	46.30	13.20	-	-	0.24	7.70	0.60	1.97	-	-	红黏土
SLTG26-0001-64	ZK175-1	3.80-4.10	25.7	1.84	1.46	0.851	82	2.71	44.3	21.6	22.7	0.18	48.10	13.80	-	-	0.21	8.81	0.58	2.05	-	-	红黏土
SLTG26-0001-65	ZK181-1	3.00-3.30	27.5	1.86	1.46	0.865	87	2.72	44.8	24.6	20.2	0.14	49.70	14.80	-	-	0.19	9.81	0.61	1.82	-	-	红黏土
SLTG26-0001-66	ZK201-1	4.00-4.30	30.5	1.81	1.39	0.954	87	2.71	45.3	26.9	18.4	0.20	47.50	16.40	-	-	0.16	12.21	0.67	1.68	-	-	红黏土
SLTG26-0001-67	ZK202-1	3.00-3.30	29.1	1.94	1.50	0.803	98	2.71	46.2	26.3	19.9	0.14	46.30	12.50	-	-	0.24	7.51	0.63	1.76	-	-	红黏土
SLTG26-0001-68	ZK242-1	2.00-2.30	27.3	1.85	1.45	0.865	86	2.71	48.0	24.4	23.6	0.12	48.20	14.90	-	-	0.17	10.97	0.57	1.97	-	-	红黏土
SLTG26-0001-69	ZK249-1	2.70-3.00	26.4	1.81	1.43	0.899	80	2.72	45.3	21.6	23.7	0.20	45.50	14.60	-	-	0.26	7.31	0.58	2.10	-	-	红黏土
SLTG26-0001-70	ZK250-1	4.00-4.30	30.5	1.83	1.40	0.933	89	2.71	53.1	27.6	25.5	0.11	46.90	13.40	-	-	0.21	9.20	0.57	1.92	-	-	红黏土
SLTG26-0001-71	ZK251-1	5.00-5.30	27.5	1.92	1.51	0.800	93	2.71	47.8	22.6	25.2	0.19	45.80	13.20	-	-	0.18	10.00	0.58	2.12	-	-	红黏土
SLTG26-0001-72	ZK253-1	4.00-4.30	23.8	1.69	1.37	0.985	65	2.71	46.8	21.5	25.3	0.09	44.70	15.70	-	-	0.23	8.63	0.51	2.18	-	-	红黏土
SLTG26-0001-73	ZK255-1	3.00-3.30	28.2	1.96	1.53	0.779	98	2.72	48.2	23.7	24.5	0.18	49.20	13.30	37.14	11.61	0.27	6.59	0.58	2.03	-	-	红黏土
SLTG26-0001-74	ZK258-1	4.00-4.30	30.6	1.91	1.46	0.853	97	2.71	48.2	28.3	19.9	0.12	48.30	13.80	-	-	0.21	8.82	0.63	1.70	-	-	红黏土
SLTG26-0001-75	ZK259-1	2.10-2.40	26.5	1.88	1.49	0.823	87	2.71	46.3	22.4	23.9	0.17	47.40	14.20	-	-	0.23	7.93	0.57	2.07	-	-	红黏土
SLTG26-0001-76	ZK261-1	3.20-3.50	33.6	1.86	1.39	0.961	95	2.73	47.1	29.5	17.6	0.19	39.50	14.90	-	-	0.19	10.32	0.71	1.60	-	-	红黏土
SLTG26-0001-77	ZK264-1	1.50-1.80	26.8	1.85	1.46	0.857	85	2.71	46.3	23.4	22.9	0.15	48.60	13.10	-	-	0.22	8.44	0.58	1.98	-	-	红黏土
SLTG26-0001-78	ZK267-1	1.80-2.10	27.5	1.88	1.47	0.838	89	2.71	47.2	24.5	22.7	0.13	44.50	12.60	-	-	0.16	11.49	0.58	1.93	-	-	红黏土
SLTG26-0001-79	ZK270-1	1.70-2.00	26.9	1.95	1.54	0.764	95	2.71	46.3	23.6	22.7	0.15	37.20	14.70	-	-	0.22	8.02	0.58	1.96	-	-	红黏土
SLTG26-0001-80	ZK274-1	1.30-1.60	24.6	1.87	1.50	0.819	82	2.73	45.7	22.1	23.6	0.11	45.20	13.10	-	-	0.23	7.91	0.54	2.07	-	-	红黏土
SLTG26-0001-81	ZK104-1	3.20-3.50	23.7	1.88	1.52	0.790	82	2.72	44.2	21.4	22.8	0.10	47.50	15.90	-	-	0.21	8.52	0.54	2.07	-	-	红黏土
SLTG26-0001-82	ZK108-1	3.50-3.80	25.1	1.90	1.52	0.804	86	2.74	46.8	22.7	24.1	0.10	46.30	14.20	-	-	0.19	9.50	0.54	2.06	-	-	红黏土
SLTG26-0001-83	ZK110-1	3.30-3.60	30.6	1.92	1.47	0.857	97	2.73	45.6	25.3	20.3	0.26	35.70	15.30	-	-	0.22	8.44	0.67	1.80	-	-	红黏土
SLTG26-0001-84	ZK176-1	4.30-4.60	26.4	1.83	1.45	0.886	81	2.73	44.1	23.5	20.6	0.14	49.10	13.40	-	-	0.21	8.98	0.60	1.88	-	-	红黏土
SLTG26-0001-85	ZK278-1	2.80-3.10	24.6	1.75	1.40	0.936	71	2.72	44.2	22.4	21.8	0.10	36.70	14.30	-	-	0.17	11.39	0.56	1.97	-	-	红黏土

1. 本公司对出具的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。2. 本公司仅对来样负责。3. 本报告无试验、审核、批准签名；或涂改、缺页；或未盖本公司公章和骑缝章则无效。4. 对本报告若有疑问，可向本公司查询。对试验结果若有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本公司提出复议申请。对于性能不稳定、不宜留样的样品，恕不受理复检。未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，不得用于广告宣传。

批准：　　审核：　　试验：

222001060436

报告编号：SLTG26-0001

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司
土工试验报告（四）

（受控编号：SLBGKJ03-1-1）

委托单位	广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			收样日期	2026年1月3日	检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司
工程名称	宜州城区地下管网改造提升项目			试验日期	2026年1月4日	机构地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋4号～8号
样品类别	土 样	样品状态	圆 柱 状	报告日期	2026年1月8日	检测地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋4号～8号
检验类别	物理力学	检验项目	土工常规分析	样品数量	18组	电话：07782300550　传真：0778-2300550
检验依据	GB/T50123-2019　JTG E40-2007					

试验编号	送样编号	取样深度	天然状态土的物理指标					比重	液限	塑限	塑性指数	液性指数	抗剪试验		三轴（uu）		压缩试验100-200kPa		含水比	液塑比	渗透系数	自由膨胀率	土样分类
			含水率	密度	干密度	孔隙比	饱和度						黏聚力	内摩擦角	黏聚力	内摩擦角	压缩系数	压缩模量					依据（GB50021-2001）（2009年版）
		—	ω_0	ρ_0	ρ_d	e_0	Sr	Gs	ω_L	ω_P	I_P	I_L	c	φ	c_u	φ_u	a_{1-2}	Es	α_w	I_r	k	δ_{ef}	
		m	%	g/cm³	g/cm³	—	%	—	%	%	—	—	kPa	(°)	kPa	(°)	MPa⁻¹	MPa			cm/s	%	—
SLTG26-0001-86	BK64-1	5.30-5.60	32.2	1.89	1.43	0.904	97	2.72	45.3	21.7	23.6	0.44	28.00	12.30	24.83	9.93	0.30	6.32	0.71	2.09	-	-	红黏土
SLTG26-0001-87	BK94-1	2.30-2.60	33.8	1.90	1.42	0.937	99	2.75	46.8	22.6	24.2	0.46	28.70	12.30	-	-	0.29	6.59	0.72	2.07	-	36	红黏土
SLTG26-0001-88	BK110-1	3.50-3.80	33.8	1.88	1.40	0.949	97	2.73	44.3	19.6	24.7	0.57	31.00	12.40	25.64	10.67	0.33	5.99	0.76	2.26	-	40	红黏土
SLTG26-0001-89	BK111-1	5.50-5.80	32.5	1.91	1.44	0.887	99	2.71	43.6	20.6	23.0	0.52	30.30	12.90	-	-	0.29	6.59	0.75	2.12	-	32	红黏土
SLTG26-0001-90	BK112-1	3.50-3.80	33.8	1.88	1.40	0.936	98	2.72	48.7	22.8	25.9	0.42	31.80	13.60	27.15	10.63	0.29	6.74	0.69	2.14	-	32	红黏土
SLTG26-0001-91	ZK114-2	5.30-5.60	32.9	1.91	1.44	0.907	99	2.74	45.5	23.1	22.4	0.44	29.80	11.80	-	-	0.28	6.72	0.72	1.97	-	-	红黏土
SLTG26-0001-92	ZK117-3	5.30-5.60	32.1	1.88	1.42	0.922	95	2.73	44.3	23.0	21.3	0.43	31.30	13.50	26.57	10.27	0.32	6.09	0.72	1.93	-	-	红黏土
SLTG26-0001-93	ZK131-2	3.10-3.40	35.3	1.87	1.38	0.966	99	2.72	43.9	24.2	19.7	0.56	30.30	11.50	-	-	0.31	6.39	0.80	1.81	-	-	红黏土
SLTG26-0001-94	ZK145-1	5.20-5.50	33.2	1.91	1.43	0.913	100	2.74	45.7	21.3	24.4	0.49	30.20	11.70	-	-	0.30	6.28	0.73	2.15	-	-	红黏土
SLTG26-0001-95	ZK146-1	3.70-4.00	32.6	1.88	1.41	0.931	96	2.73	44.6	22.8	21.8	0.45	31.80	13.40	28.86	10.48	0.31	6.22	0.73	1.96	-	-	红黏土
SLTG26-0001-96	ZK189-1	3.00-3.30	33.5	1.89	1.42	0.919	99	2.72	44.6	20.8	23.8	0.53	31.70	12.50	-	-	0.29	6.56	0.75	2.14	-	-	红黏土
SLTG26-0001-97	ZK190-1	6.00-6.30	34.4	1.87	1.39	0.949	98	2.71	46.6	23.4	23.2	0.47	28.60	12.20	-	-	0.30	6.60	0.74	1.99	-	35	红黏土
SLTG26-0001-98	ZK191-1	3.50-3.80	34.7	1.88	1.39	0.955	99	2.72	45.3	23.1	22.2	0.52	29.40	11.60	-	-	0.30	6.46	0.77	1.96	-	37	红黏土
SLTG26-0001-99	ZK192-1	3.20-3.50	33.5	1.90	1.42	0.926	99	2.74	44.3	22.7	21.6	0.50	31.30	12.00	-	-	0.31	6.26	0.76	1.95	-	36	红黏土
SLTG26-0001-100	ZK141-2	8.70-9.00	32.7	1.89	1.43	0.900	99	2.71	45.7	22.1	23.6	0.45	28.40	14.00	-	-	0.30	6.40	0.72	2.07	-	-	红黏土
SLTG26-0001-101	ZK142-1	7.00-7.30	34.9	1.88	1.39	0.951	100	2.72	44.2	26.6	17.6	0.47	28.50	12.00	25.39	10.57	0.31	6.25	0.79	1.66			红黏土
SLTG26-0001-102	ZK114-1	4.50-4.80	45.3	1.72	1.18	1.315	94	2.74	49.3	25.8	23.5	0.83	5.07	2.10	-	-	0.91	2.54	-	-	-	-	淤泥
SLTG26-0001-103	ZK117-2	4.50-4.80	48.3	1.73	1.17	1.349	98	2.74	50.2	24.1	26.1	0.93	4.32	3.20	-	-	0.88	2.67	-	-	-	-	淤泥

1. 本公司对出具的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。2. 本公司仅对来样负责。3. 本报告无试验、审核、批准签名；或涂改、缺页；或未盖本公司公章和骑缝章则无效。4. 对本报告若有疑问，可向本公司查询。对试验结果若有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本公司提出复议申请。对于性能不稳定、不宜留样的样品，恕不受理复检。未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，不得用于广告宣传。

批准：　　审核：　　试验：

222001060436

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

土的易溶盐试验报告表

（受控编号：SLBGKJ02-1-1）

报告编号：SLTF26-0001

工程名称	宜州城区地下管网改造提升项目	收样日期	2026年1月3日	检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 机构地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋4号～8号 电话：0778-2300550 传真：0778-2300550
委托单位	广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	检测日期	2026年1月3日	
检测类别	土腐蚀性分析	报告日期	2026年1月6日	
样品类别	土样	样品数量	10	
检测依据	GB/T50123-2019			

来样编号	取样编号	取样深度(m)	土的名称	PH值 —	Ca^{2+} mg/kg	Mg^{2+} mg/kg	Cl^- mg/kg	SO_4^{2-} mg/kg	HCO^{3-} mg/kg	CO_3^{2-} mg/L	OH^- mg/L	易溶盐 mg/kg
SLTF26-0001-1	ZK131-1	1.00 - 1.50	素填土	7.20	56.43	22.75	20.68	200.34	62.72	<1.00	<1.00	390.46
SLTF26-0001-2	ZK160-1	1.50 - 2.00	素填土	6.70	38.75	26.84	25.35	195.83	75.23	<1.00	<1.00	382.83
SLTF26-0001-3	BK66-1	1.00 - 1.50	杂填土	6.90	46.28	31.73	31.76	150.74	77.54	<1.00	<1.00	360.94
SLTF26-0001-4	ZK117-1	2.00 - 2.50	杂填土	7.20	61.27	29.52	24.38	167.57	67.82	<1.00	<1.00	371.75
SLTF26-0001-5	ZK4-1	5.00 - 5.30	红黏土	7.00	89.23	50.46	33.48	122.85	80.43	<1.00	<1.00	388.72
SLTF26-0001-6	ZK100-1	1.00 - 1.30	红黏土	6.80	81.73	45.73	29.46	115.72	85.61	<1.00	<1.00	391.57
SLTF26-0001-7	ZK142-1	7.00 - 7.30	红黏土	7.40	71.43	43.56	33.82	127.82	78.55	<1.00	<1.00	387.37
SLTF26-0001-8	ZK146-1	3.70 - 4.00	红黏土	7.30	78.61	55.71	38.67	139.32	74.91	<1.00	<1.00	394.33
SLTF26-0001-9	ZK114-1	4.50 - 4.80	淤泥	6.80	150.32	60.48	50.34	150.32	88.76	<1.00	<1.00	610.75
SLTF26-0001-10	ZK117-2	4.50 - 4.80	淤泥	7.10	180.25	57.49	49.64	180.62	84.82	<1.00	<1.00	630.34

1. 本公司对出具的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。2. 本公司仅对来样负责。3. 本报告无试验、审核、批准签名；或涂改、缺页；或未盖本公司公章和骑缝章则无效。4. 对本报告若有疑问，可向本公司查询。对试验结果若有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本公司提出复议申请。对于性能不稳定、不宜留样的样品，恕不受理复检。未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，不得用于广告宣传。

批准：　　审核：　　试验：

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

水质简分析试验报告表

（受控编号：SLBGKJ01-1-1）

报告编号：SLSY26-0001

工程名称	宜州城区地下管网改造提升项目	收样日期	2026年1月3日	检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司 机构地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋4号～8号 电话：0778-2300550 传真：0778-2300550
委托单位	广西昇龙工程勘察设计检测有限公司	检测日期	2026年1月5日	
检测类别	水化学分析	报告日期	2026年1月8日	
样品类别	水样	样品数量	4	
检测依据	☐ DZ/T0064-1993 ☐ GB/T8538-2008 ☐GB/50021-2001			

分析编号	取样编号	取样深度(m)	pH值 —	Ca^{2+} mg/L	Mg^{2+} mg/L	Cl^- mg/L	SO_4^{2-} mg/L	HCO^{3-} mmol/L	CO_3^{2-} mg/L	OH^- mg/L	游离CO_2 mg/L	侵蚀CO_2 mg/L	总硬度 mg/L	总矿化度 mg/L	备注
SLSY26-0001-1	SYZK60	1.20	7.00	63.16	7.51	17.69	117.00	4.52	0.00	0.00	89.10	11.88	70.67	139.50	
SLSY26-0001-2	SYBK46	1.20	6.70	68.94	5.51	15.00	178.00	4.55	0.00	0.00	90.20	9.90	74.45	133.50	
SLSY26-0001-3	SY08	/	7.20	50.73	6.38	16.72	152.70	2.97	470.78	0.00	72.61	8.51	57.11	101.72	
SLSY26-0001-4	SY10	/	7.10	45.72	8.24	10.94	163.43	3.28	0.00	0.00	81.42	7.61	53.96	92.54	

1. 本公司对出具的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。2. 本公司仅对来样负责。3. 本报告无试验、审核、批准签名；或涂改、缺页；或未盖本公司公章和骑缝章则无效。4. 对本报告若有疑问，可向本公司查询。对试验结果若有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本公司提出复议申请。对于性能不稳定、不宜留样的样品，恕不受理复检。未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，不得用于广告宣传。

批准：　　审核：　　试验：

222001060436

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

颗粒分析试验报告表

（受控编号：SLBGKJ03-1-2）

报告编号：SLTG26-0001

委托单位	广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			收样日期	2026年1月3日	检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司
工程名称	宜州城区地下管网改造提升项目			试验日期	2026年1月3日	机构地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋4号～8号
样品类别	土样	样品状态	散粒状	报告日期	2026年1月6日	检测地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋4号～8号
检验类别	物理力学	样品类别	颗粒分析	样品数量	2组	电话：0778-2300550 传真：0778-2300550
检测依据	GB/T50123-1999 JTG E40-2007					

试验编号	送样编号	试样顶深度(m)	颗粒组成 % (mm)							土的名称 按GB50021-2001（2009年版）定名
			>60	>20	20-2	2-0.5	0.5-0.25	0.25-0.075	< 0.075	
SLTG26-0001-104	BK98-2	3.50 - 4.00	0.0	53.42	19.83	6.57	4.39	10.48	5.31	卵石
SLTG26-0001-105	ZK135-1	4.00 - 4.50	0.0	55.69	20.48	6.31	5.22	8.46	3.84	卵石

1. 本公司对出具的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。2. 本公司仅对来样负责。3. 本报告无试验、审核、批准签名；或涂改、缺页；或未盖本公司公章和骑缝章则无效。4. 对本报告若有疑问，可向本公司查询。对试验结果若有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本公司提出复议申请。对于性能不稳定、不宜留样的样品，恕不受理复检。未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，不得用于广告宣传。

批准： 审核： 试验：

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

岩石试验报告

（受控编号：SLBGKJ05-1-1）

工程名称：宜州城区地下管网改造提升项目　　第 1页共 3页

送样单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司　　检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

报告编号YZ2026Y--001　　送样日期：2026年1月3日　　实验室地址：河池市宜州区龙江社区建设电安置区L-1栋4号～8号

检测依据：GB/T50266-2013　　报告日期：2026年1月6日　　实验室电话：0778--2786177

样品编号			取样深度	岩性描述	试件状态	破坏荷载(kN)	单轴抗压强度(MPa)	平均值(MPa)	备注
野外编号	室内编号		(m)						
BK21YY1	YY	1	4.70 — 5.00	石灰岩	饱和	161.3	41.9	42.0	
						162.2	42.2		
						161.6	42.0		
BK22YY1	YY	2	5.00 — 5.30	石灰岩	饱和	158.8	41.3	41.2	
						158.4	41.2		
						158.2	41.1		
BK24YY1	YY	3	5.00 — 5.30	石灰岩	饱和	148.4	38.6	38.7	
						149.0	38.7		
						149.2	38.8		
BK25YY1	YY	4	4.00 — 4.30	石灰岩	饱和	151.4	39.3	39.4	
						152.5	39.6		
						151.5	39.4		
BK38YY1	YY	5	6.50 — 6.80	石灰岩	饱和	147.2	38.2	38.4	
						148.3	38.5		
						147.9	38.4		
BK39YY1	YY	6	6.50 — 6.80	石灰岩	饱和	152.0	39.5	39.6	
						152.4	39.6		
						152.9	39.7		
BK72YY1	YY	7	5.00 — 5.30	石灰岩	饱和	157.6	41.0	40.9	
						157.6	41.0		
						157.4	40.9		
BK76YY1	YY	8	6.40 — 6.70	石灰岩	饱和	152.2	39.5	39.8	
						153.8	40.0		
						153.2	39.8		
BK91YY1	YY	9	6.00 — 6.30	石灰岩	饱和	145.5	37.8	37.7	
						144.7	37.6		
						144.6	37.6		
BK103YY1	YY	10	6.50 — 6.80	石灰岩	饱和	143.3	37.2	37.5	
						145.0	37.7		
						144.7	37.6		
ZK16YY1	YY	11	4.00 — 4.30	石灰岩	饱和	155.6	40.4	40.3	
						154.6	40.2		
						155.5	40.4		
ZK55YY1	YY	12	7.20 — 7.50	石灰岩	饱和	142.9	37.1	37.1	
						142.9	37.1		
						142.8	37.1		

说明：1、本结果仅对来样负责；2、部分复制报告无效；3、对报告如有异议，应于收到报告15天内提出。

批　　审核：　　试验：

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

岩石试验报告

（受控编号：SLBGKJ05-1-1）

工程名称：宜州城区地下管网改造提升项目　　第 2页共3页

送样单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司　　检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

报告编号：YZ2026Y—001　　送样日期：2026年1月3日　　实验室地址：河池市宜州区龙江社区建设电安置区L-1栋4号～8号

检测依据：GB/T50266-2013　　报告日期：2026年1月6日　　实验室电话：0778--2786177

样品编号			取样深度 (m)	岩性描述	试件状态	破坏荷载 (kN)	单轴抗压强度 (MPa)	平均值 (MPa)	备注
野外编号	室内编号								
ZK59YY1	YY	13	7.30 — 7.60	石灰岩	饱和	150.9	39.2	39.4	
						151.9	39.5		
						152.4	39.6		
ZK61YY1	YY	14	5.00 — 5.30	石灰岩	饱和	155.8	40.5	40.5	
						154.5	40.2		
						156.7	40.7		
ZK62YY1	YY	15	4.50 — 4.80	石灰岩	饱和	152.9	39.7	39.8	
						153.2	39.8		
						153.6	39.9		
ZK100YY1	YY	16	6.50 — 6.80	石灰岩	饱和	149.8	38.9	38.8	
						149.6	38.9		
						149.0	38.7		
ZK103YY1	YY	17	6.00 — 6.30	石灰岩	饱和	145.4	37.8	37.5	
						144.4	37.5		
						142.7	37.1		
ZK116YY1	YY	18	11.00 — 11.30	石灰岩	饱和	141.7	36.8	36.8	
						140.8	36.6		
						142.8	37.1		
ZK121YY1	YY	19	6.00 — 6.30	石灰岩	饱和	144.5	37.6	37.4	
						143.6	37.3		
						143.7	37.4		
ZK139YY1	YY	20	6.00 — 6.30	石灰岩	饱和	138.3	35.9	36.2	
						139.6	36.3		
						139.8	36.3		
ZK181YY1	YY	21	5.30 — 5.60	石灰岩	饱和	147.0	38.2	38.3	
						147.2	38.3		
						147.8	38.4		
ZK183YY1	YY	22	6.70 — 7.00	石灰岩	饱和	136.7	35.5	35.5	
						137.0	35.6		
						136.2	35.4		
ZK184YY1	YY	23	6.00 — 6.30	石灰岩	饱和	157.5	40.9	40.9	
						157.3	40.9		
						157.6	41.0		
ZK206YY1	YY	24	7.00 — 7.30	石灰岩	饱和	152.4	39.6	39.6	
						151.4	39.3		
						153.2	39.8		

说明：1、本结果仅对来样负责；2、部分复制报告无效；3、对报告如有异议，应于收到报告15天内提出。

批　　审核：　　试验：

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

岩石试验报告

（受控编号：SLBGKJ05-1-1）

工程名称：宜州城区地下管网改造提升项目

送样单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司　　检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

报告编号YZ2026Y—001　　送样日期：2026年1月3日　　实验室地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋4号～8号

检测依据：GB/T50266-2013　　报告日期：2026年1月6日　　实验室电话：0778--2786177

样品编号		取样深度	岩性描述	试件状态	破坏荷载(kN)	单轴抗压强度(MPa)	平均值(MPa)	备注
野外编号	室内编号	(m)						
ZK242YY1	YY 25	7.00 — 7.30	石灰岩	饱和	149.1	38.7	39.2	
					154.1	40.0		
					149.9	39.0		
ZK246YY1	YY 26	6.00 — 6.30	石灰岩	饱和	152.6	39.7	39.0	
					149.2	38.8		
					148.2	38.5		
ZK274YY1	YY 27	7.00 — 7.30	石灰岩	饱和	148.3	38.5	39.1	
					153.4	39.9		
					149.5	38.8		

说明：1、本结果仅对来样负责；2、部分复制报告无效；3、对报告如有异议，应于收到报告15天内提出。

批　　审核：　　试验：

岩石点荷载试验报告

工程名称：宜州城区地下管网改造提升项目　　第 1页共3页

送样单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司　　检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

报告编号：SLDZ26-0001　　送样日期：2026年1月3日　　实验室地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋4号～8号

检测依据：GB/T50266-2013　　报告日期：2026年1月6日　　实验室电话：0778-2786177

室内编号	室外编号	取样深度（m）	试样名称	试件含水状态	点荷载强度 Is(MPa)	点荷载强度指数 $I_{s(50)}$(MPa)	换算单轴抗压强度 R_C(MPa)
DZ1	BK43YY1	4.50 —5.00	石灰岩	饱和	0.56 0.59 0.67 0.67 0.58	0.57	14.9
DZ2	BK50YY1	4.50 —5.00	石灰岩	饱和	0.73 0.65 0.70 0.63 0.72	0.64	16.4
DZ3	BK51YY1	4.50 —5.00	石灰岩	饱和	0.64 0.65 0.59 0.67 0.62	0.59	15.4
DZ4	BK73YY1	6.70 —7.20	石灰岩	饱和	0.69 0.64 0.61 0.60 0.62	0.58	15.1
DZ5	ZK44YY1	5.50 —6.00	石灰岩	饱和	0.73 0.60 0.64 0.69 0.56	0.58	15.3
DZ6	ZK47YY1	5.00 —5.50	石灰岩	饱和	0.64 0.70 0.74 0.70 0.55	0.62	15.9
DZ7	ZK48YY1	5.00 —5.50	石灰岩	饱和	0.59 0.70 0.61 0.57 0.59	0.57	15.0
DZ8	ZK49YY1	6.50 —7.00	石灰岩	饱和	0.74 0.59 0.72 0.74 0.73	0.66	16.6

说明：1、本结果仅对来样负责；2、部分复制报告无效；3、对报告如有异议，应于收到报告15天内提出。

批准：　　审核：　　试验：

岩石点荷载试验报告

工程名称：宜州城区地下管网改造提升项目

送样单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

报告编号：SLDZ26-0001436　　送样日期：2026年1月3日

实验室地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋4号～8号

检测依据：GB/T50266-2013　　报告日期：2026年1月6日

实验室电话：0778－2786177

室内编号	室外编号	取样深度（m）	试样名称	试件含水状态	点荷载强度 Is(MPa)	点荷载强度指数 $Is_{(50)}$(MPa)	换算单轴抗压强度 R_C(MPa)
DZ9	ZK70YY1	6.00 －6.50	石灰岩	饱和	0.60 0.56 0.57 0.65 0.63	0.56	14.7
DZ10	ZK133YY1	3.00 －3.50	石灰岩	饱和	0.70 0.67 0.72 0.73 0.64	0.64	16.4
DZ11	ZK134YY1	7.00 －7.50	石灰岩	饱和	0.74 0.67 0.63 0.73 0.58	0.62	16.0
DZ12	ZK135YY1	7.00 －7.50	石灰岩	饱和	0.60 0.58 0.63 0.59 0.74	0.58	15.1
DZ13	BK80YY1	2.20 －2.70	石灰岩	饱和	0.70 0.69 0.78 0.66 0.53	0.62	15.9
DZ14	BK96YY1	3.40 －3.90	石灰岩	饱和	0.63 0.58 0.59 0.64 0.76	0.60	15.5
DZ15	BK114YY1	6.50 －7.00	石灰岩	饱和	0.62 0.70 0.66 0.56 0.77	0.62	15.9
DZ16	BK120YY1	4.50 －5.00	石灰岩	饱和	0.63 0.77 0.59 0.53 0.80	0.62	15.9

说明：1、本结果仅对来样负责；2、部分复制报告无效；3、对报告如有异议，应于收到报告15天内提出。

批准：　　审核：　　试验：

岩石点荷载试验报告

工程名称：宜州城区地下管网改造提升项目　　第3页共3页

送样单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司　　检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

报告编号：SLDZ26-0001　　送样日期：2026年1月3日　　实验室地址：河池市宜州区龙江社区建设电安置区L-1栋4号～8号

检测依据：GB/T50266-2013　　报告日期：2026年1月6日　　实验室电话：0778--2786177

室内编号	室外编号	取样深度（m）	试样名称	试件含水状态	点荷载强度 Is(MPa)	点荷载强度指数 $Is_{(50)}$(MPa)	换算单轴抗压强度 R_C(MPa)
DZ17	ZK117YY1	7.00 —7.50	石灰岩	饱和	0.62 0.51 0.76 0.79 0.60	0.60	15.6
DZ18	ZK130YY1	5.50 —6.00	石灰岩	饱和	0.51 0.66 0.62 0.56 0.56	0.54	14.4
DZ19	ZK163YY1	6.50 —7.00	石灰岩	饱和	0.52 0.54 0.76 0.65 0.62	0.57	15.0
DZ20	ZK198YY1	5.50 —6.00	石灰岩	饱和	0.57 0.63 0.64 0.63 0.67	0.57	15.1
DZ21	ZK252YY1	7.00 —7.50	石灰岩	饱和	0.55 0.73 0.70 0.67 0.77	0.62	16.0
DZ22	ZK269YY1	9.00 —9.50	石灰岩	饱和	0.68 0.51 0.72 0.60 0.76	0.61	15.8
DZ23	ZK283YY1	2.00 —2.50	石灰岩	饱和	0.51 0.79 0.63 0.76 0.54	0.60	15.5

说明：1、本结果仅对来样负责；2、部分复制报告无效；3、对报告如有异议，应于收到报告15天内提出。

批准：　　审核：　　试验：


三轴压缩试验成果图

委托单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司　　检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

工程名称：宜州城区地下管网改造提升项目

土样编号：(BK8-1)　总应力：c=30.00kPa　φ=12.28°　取样深度：4.20-4.50m


试验方法：不固结不排水剪 UU　　土样定名：黏土

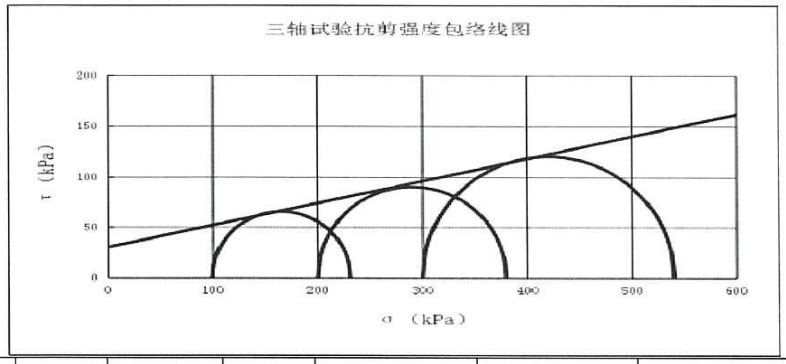

σ_3	σ_3'	σ_1	σ_1'	$(\sigma_1+\sigma_3)/2$	$(\sigma_1+\sigma_3')/2$	$(\sigma_1-\sigma_3)/2$
kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa
100		216.3		165.8		65.8
200		380.2		290.1		90.1
300		540.5		420.25		120.3

土样编号：(BK60-1)　总应力：c=29.91kPa　φ=11.78°　取样深度：5.00-5.30m

试验方法：不固结不排水剪 UU　　土样定名：黏土

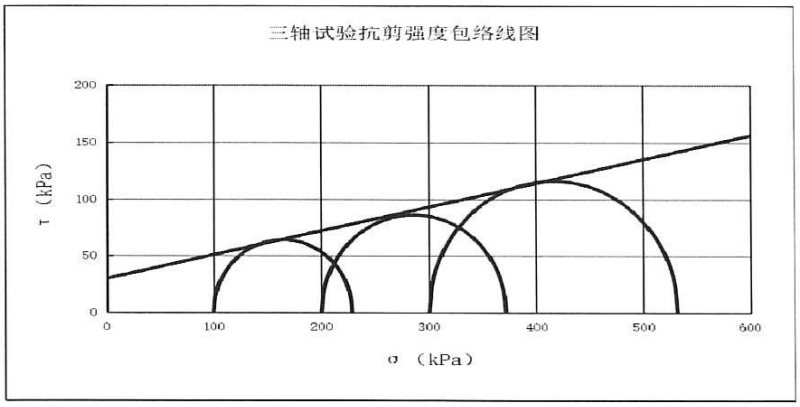

σ_3	σ_3'	σ_1	σ_1'	$(\sigma_1+\sigma_3)/2$	$(\sigma_1+\sigma_3')/2$	$(\sigma_1-\sigma_3)/2$
kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa
100		228.3		164.2		64.2
200		371.8		285.9		85.9
300		531.7		415.9		115.9


三轴压缩试验成果图

委托单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司　　检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

工程名称：宜州城区地下管网改造提升项目

土样编号：(ZK56-1)　总应力：c=33.08kPa　φ=12.04°　取样深度：4.00-4.30m


试验方法：不固结不排水剪 UU　　土样定名：黏土

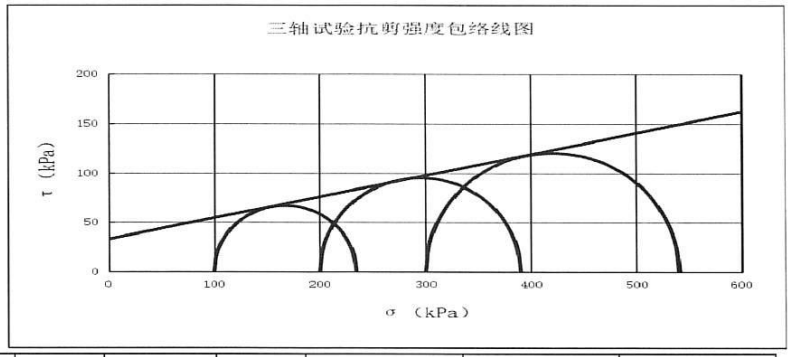

σ_3	σ_3'	σ_1	σ_1'	(σ_1+σ_3) /2	(σ_1+σ_3') /2	(σ_1.σ_3) /2
kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa
100		234.2		167.1		67.1
200		390.1		295.1		95.1
300		540.6		420.3		120.3

土样编号：(ZK112-1) 总应力：c=34.60kPa　φ=10.16°　取样深度：2.10-2.40m

试验方法：不固结不排水剪 UU　　土样定名：黏土

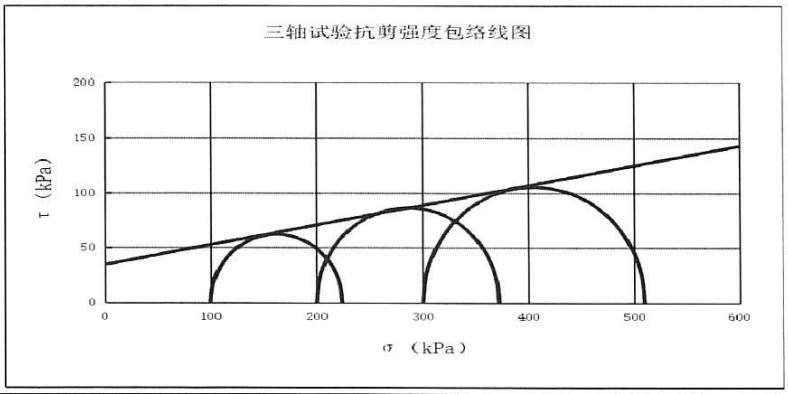

σ_3	σ_3'	σ_1	σ_1'	(σ_1+σ_3) /2	(σ_1+σ_3') /2	(σ_1.σ_3) /2
kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa
100		224.1		162.1		62.1
200		372.6		286.3		86.3
300		510.2		405.1		105.1


三轴压缩试验成果图

委托单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司　　检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

工程名称：宜州城区地下管网改造提升项目

土样编号：（ZK166-1）　总应力：c=32.24kPa　φ=12.84°　取样深度：5.20-5.50m


试验方法：不固结不排水剪 UU　　土样定名：黏土

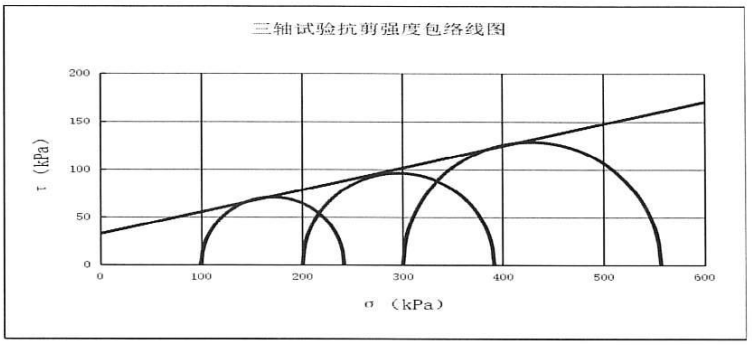

σ_3	σ_3'	σ_1	σ_1'	$(\sigma_1+\sigma_3)/2$	$(\sigma_1+\sigma_3')/2$	$(\sigma_1-\sigma_3)/2$
kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa
100		241.3		170.6		70.7
200		391.6		295.8		95.8
300		556.7		428.6		138.4

土样编号：(ZK255-1) 总应力：c=37.14kPa　φ=11.61°　取样深度：3.00-3.30m

试验方法：不固结不排水剪 UU　　土样定名：黏土

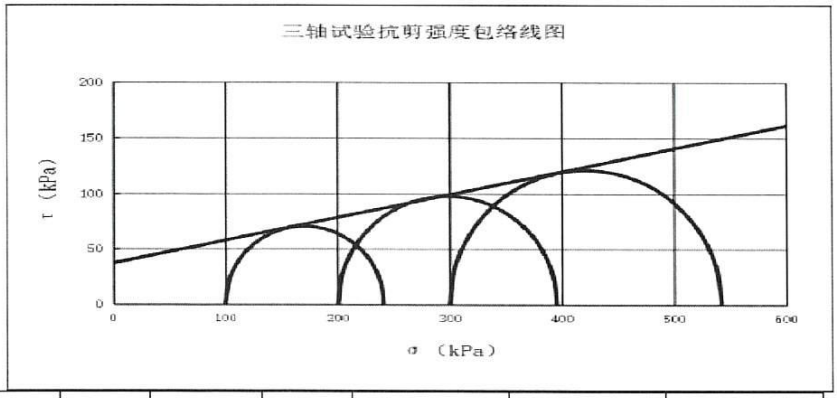

σ_3	σ_3'	σ_1	σ_1'	$(\sigma_1+\sigma_3)/2$	$(\sigma_1+\sigma_3')/2$	$(\sigma_1-\sigma_3)/2$
kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa
100		221.9		160.9		60.9
200		371.5		285.8		85.8
300		503.8		401.9		101.9


三轴压缩试验成果图

委托单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司　　检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

工程名称：宜州城区地下管网改造提升项目

土样编号：（BK64-1）　总应力：c=24.83kPa　φ=9.93°　取样深度：5.30-5.60m


试验方法：不固结不排水剪 UU　　土样定名：黏土

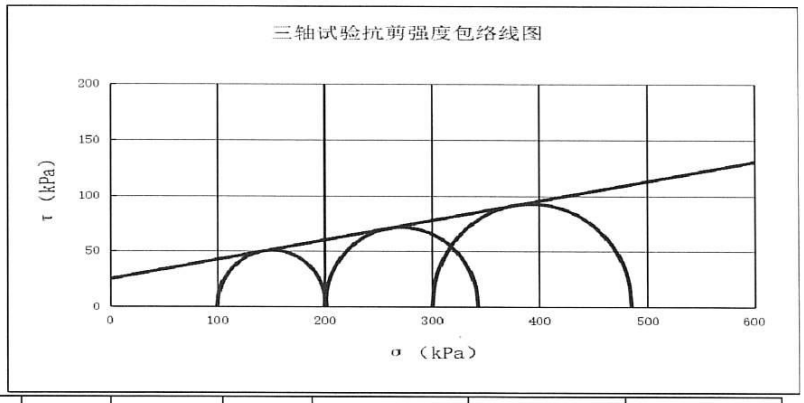

σ_3	σ_3'	σ_1	σ_1'	$(\sigma_1+\sigma_3)/2$	$(\sigma_1+\sigma_3')/2$	$(\sigma_1.\sigma_3)/2$
kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa
100		201.3		150.7		50.7
200		342.7		271.4		71.4
300		485.2		392.6		92.6

土样编号：(BK110-1) 总应力：c=25.64kPa　φ=10.67°　取样深度：3.50-3.80m

试验方法：不固结不排水剪 UU　　土样定名：黏土

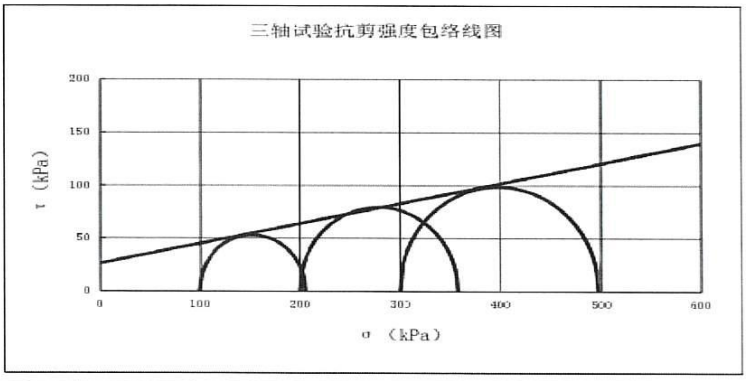

σ_3	σ_3'	σ_1	σ_1'	$(\sigma_1+\sigma_3)/2$	$(\sigma_1+\sigma_3')/2$	$(\sigma_1.\sigma_3)/2$
kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa
100		205.4		152.7		52.7
200		358.1		279.1		79.1
300		496.8		398.4		98.4


三轴压缩试验成果图

委托单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司　　检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

工程名称：宜州城区地下管网改造提升项目

土样编号：（BK112-1）　总应力：c=27.15kPa　φ=10.63°　取样深度：3.50-3.80m


试验方法：不固结不排水剪 UU　　土样定名：黏土

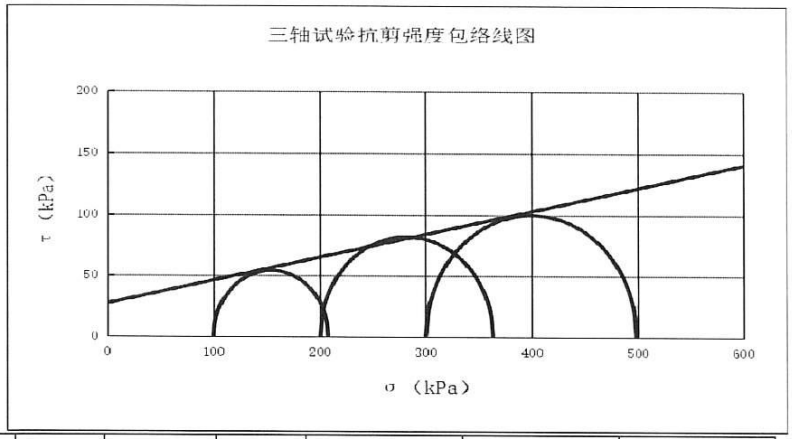

σ_3	σ_3'	σ_1	σ_1'	$(\sigma_1+\sigma_3)/2$	$(\sigma_1+\sigma_3')/2$	$(\sigma_1-\sigma_3)/2$
kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa
100		207.8		153.9		53.9
200		363.4		281.7		81.7
300		498.6		399.3		99.3

土样编号：(ZK117-3) 总应力：c=26.57kPa　φ=10.27°　取样深度：5.30-5.60m

试验方法：不固结不排水剪 UU　　土样定名：黏土

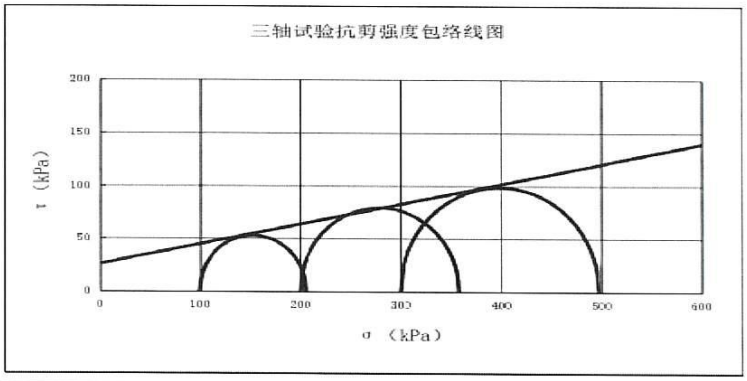

σ_3	σ_3'	σ_1	σ_1'	$(\sigma_1+\sigma_3)/2$	$(\sigma_1+\sigma_3')/2$	$(\sigma_1-\sigma_3)/2$
kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa
100		203.4		151.7		51.7
200		359.4		279.7		79.7
300		490.3		395.15		95.2


三轴压缩试验成果图

委托单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司　　检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

工程名称：宜州城区地下管网改造提升项目

土样编号：（ZK146-1）　总应力：c=28.86kPa　φ=10.48°　取样深度：3.70-4.00m


试验方法：不固结不排水剪 UU　　土样定名：黏土

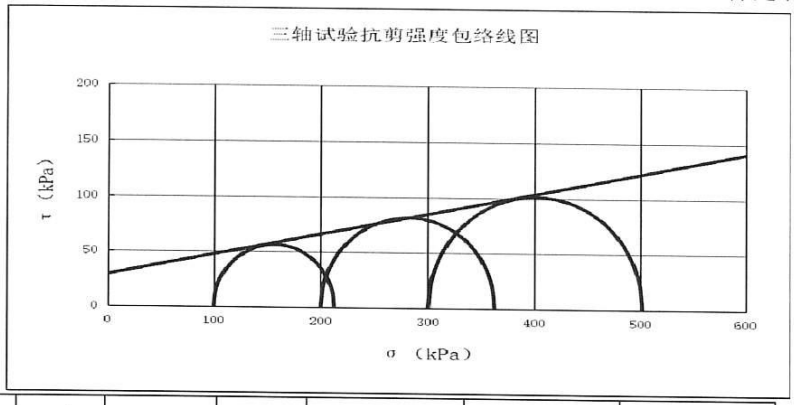

σ_3	σ_3'	σ_1	σ_1'	$(\sigma_1+\sigma_3)/2$	$(\sigma_1+\sigma_3')/2$	$(\sigma_1-\sigma_3)/2$
kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa
100		212.4		156.2		56.2
200		362.8		281.4		81.4
300		501.9		401.0		101.0

土样编号：(ZK142-1) 总应力：c=25.39kPa　φ=10.57°　取样深度：7.00-7.30m

试验方法：不固结不排水剪 UU　　土样定名：黏土

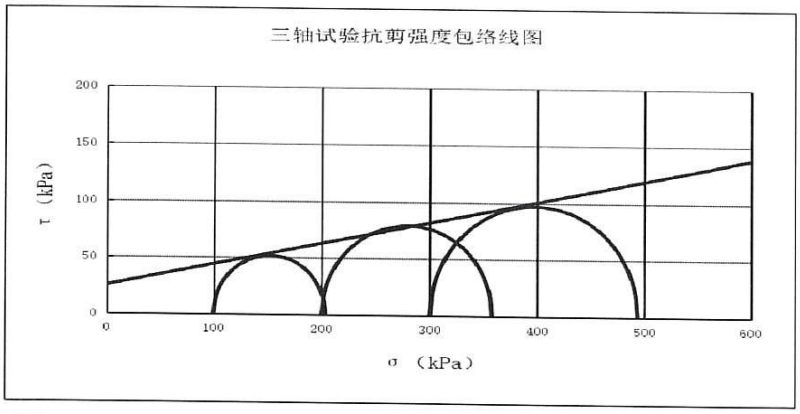

σ_3	σ_3'	σ_1	σ_1'	$(\sigma_1+\sigma_3)/2$	$(\sigma_1+\sigma_3')/2$	$(\sigma_1-\sigma_3)/2$
kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa	kPa
100		203.4		151.7		51.7
200		357.9		279.0		78.9
300		493.6		396.8		96.8

膨胀性实验

报告编号：222001060436 SLTG26-0001

委托单位	广西昇龙工程勘察设计检测有限公司			收样日期	2026年1月3日	检测单位：广西昇龙工程勘察设计检测有限公司
工程名称	宜州城区地下管网改造提升项目			试验日期	2026年1月4日	机构地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋4号～8号
样品类别	土 样	样品状态	圆 柱 状	报告日期	2026年1月8日	检测地址：河池市宜州区龙江社区建设屯安置区L-1栋4号～8号
检验类别	物理力学	检验项目	土工常规分析	样品数量	12 组	电话：07782300550 传真：0778-2300550
检验依据	□GB/T50123-1999 □JTG E40-2007					

试验编号	送样编号	土样状态	自由膨胀率	收缩试验				膨胀力	50kpa相对膨胀率	不同荷载膨胀率试验								膨胀总率	备注
				线缩率	体缩率	缩限	收缩系数			压力为零时膨胀率	膨胀限				压力指数	压系力数折减			
											0kPa	50kPa	100kPa	200kPa					
		—	δ_{ef}	δ_{si}	δ_v	ω_s	λ_S	P_e	δ_{xep50}	δ_{e0}	ω_{z0}	ω_{z50}	ω_{z100}	ω_{z200}	b	a		δ_{xs}	—
			%	%	%	%	—	kPa	%	%	%	%	%	%	—	—		%	—
SLTG26-0001-106	BK5-1	原状	37	2.11	10.46	19.23	0.27	25.95	0.33	0.93	25.90	25.30	24.90	24.60	0.24	0.28		2.44	
SLTG26-0001-107	BK24-1	原状	40	2.09	10.52	16.58	0.27	31.50	0.27	1.04	31.30	30.90	30.50	30.30	0.27	0.24		2.36	
SLTG26-0001-108	BK92-1	原状	33	1.95	10.27	21.82	0.30	20.10	0.42	0.92	29.70	29.30	28.90	28.70	0.19	0.22		2.37	
SLTG26-0001-109	ZK11-1	原状	31	1.87	9.82	19.56	0.29	17.60	0.22	1.02	28.40	27.90	27.50	27.20	0.23	0.20		2.09	
SLTG26-0001-110	ZK50-1	原状	38	1.99	10.50	19.63	0.26	57.40	0.45	0.97	32.60	32.10	31.70	31.40	0.18	0.18		2.44	
SLTG26-0001-111	ZK70-1	原状	35	1.93	10.92	20.42	0.25	42.60	0.28	1.12	27.40	27.00	26.70	26.40	0.18	0.21		2.21	
SLTG26-0001-112	BK94-1	原状	36	1.83	12.18	13.34	0.27	25.70	0.44	1.48	34.30	33.80	33.40	33.00	0.26	0.33		2.27	
SLTG26-0001-113	BK110-1	原状	40	1.90	10.23	11.18	0.26	37.90	0.53	0.88	34.60	34.10	33.70	33.30	0.31	0.30		2.43	
SLTG26-0001-114	BK111-1	原状	32	1.96	10.82	13.20	0.25	28.70	0.45	0.87	33.10	32.50	32.10	31.70	0.30	0.28		2.41	
SLTG26-0001-115	ZK190-1	原状	35	2.06	11.20	9.93	0.27	61.30	0.44	1.57	34.90	34.40	33.90	33.50	0.28	0.33		2.50	
SLTG26-0001-116	ZK191-1	原状	37	2.23	10.53	9.16	0.27	22.90	0.41	1.23	35.20	34.60	34.10	33.70	0.35	0.31		2.64	
SLTG26-0001-117	ZK192-1	原状	36	2.27	10.97	11.25	0.27	31.90	0.43	1.59	34.20	33.70	33.30	32.90	0.33	0.29		2.70	
以 下 空 白																			

1. 本公司对出具的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。2. 本公司仅对来样负责。3. 本报告无试验、审核、批准签名；或涂改、缺页；或未盖本公司公章和骑缝章则无效。4. 对本报告若有疑问，可向本公司查询。对试验结果若有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本公司提出复议申请。对于性能不稳定、不宜留样的样品，恕不受理复检。未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，不得用于广告宣传。

批准： 审核： 试验
