广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

# 土 工 试 验 报 告（固结试验e-p曲线）

报告编号:SLYTG25-047




委托单位 广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

**工程名称：** 阳光幸福里 **收样日期** 2025年10月4日 **试验日期** 2025年10月5日 **报告日期** 2025年10月9日

SLYTG25-047-01 ZK2-QT1

| p | e |
|---|---|
| 0 | 0.862 |
| 50 | 0.824 |
| 100 | 0.806 |
| 200 | 0.785 |
| 300 | 0.774 |


| 压缩系数 | 压缩模量 |
|---|---|
| 0.39 | 9.04 |

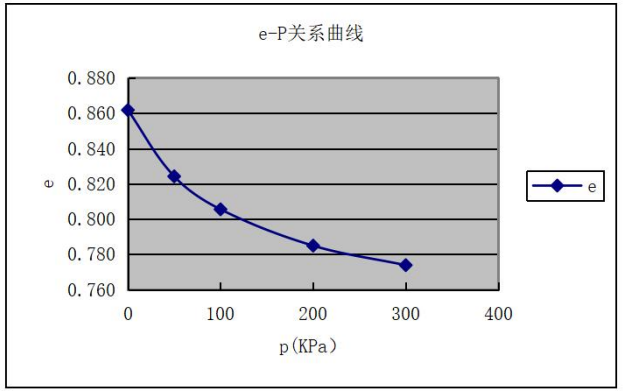


SLYTG25-047-02 ZK3-QT1

| p | e |
|---|---|
| 0 | 0.824 |
| 50 | 0.796 |
| 100 | 0.765 |
| 200 | 0.739 |
| 300 | 0.733 |


| 压缩系数 | 压缩模量 |
|---|---|
| 0.27 | 9.39 |

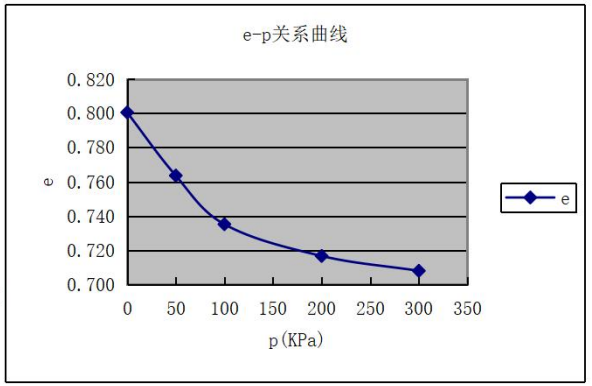


SLYTG25-047-03 ZK11-QT1

| p | e |
|---|---|
| 0 | 0.799 |
| 50 | 0.773 |
| 100 | 0.747 |
| 200 | 0.715 |
| 300 | 0.696 |


| 压缩系数 | 压缩模量 |
|---|---|
| 0.21 | 10.44 |

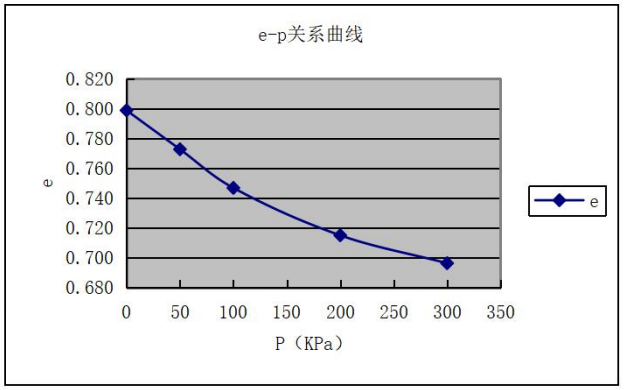


SLYTG25-047-04 ZK12-QT1

| p | e |
|---|---|
| 0 | 0.813 |
| 50 | 0.768 |
| 100 | 0.744 |
| 200 | 0.714 |
| 300 | 0.709 |

| 压缩系数 | 压缩模量 |
|---|---|
| 0.26 | 11.87 |

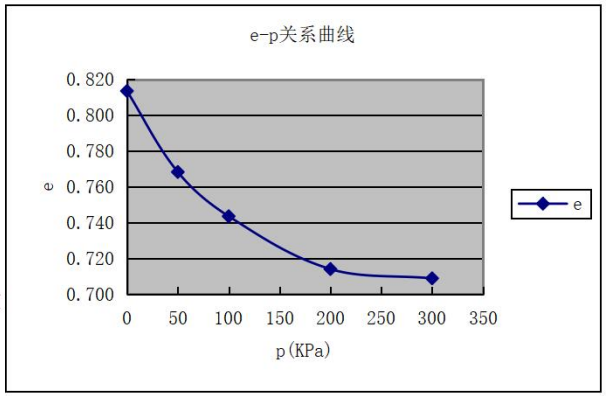


批准：颜平 审核：阮成清 试验：谭子幸

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

# 土 工 试 验 报 告（固结试验e-p曲线）




委托单位 广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

**工程名称：** 阳光幸福里 **收样日期** 2025年10月4日 **试验日期** 2025年10月5日 **报告日期** 2025年10月9日

SLYTG25-047-05 ZK15-QT1

| p | e |
|---|---|
| 0 | 0.761 |
| 50 | 0.723 |
| 100 | 0.694 |
| 200 | 0.668 |
| 300 | 0.651 |


| 压缩系数 | 压缩模量 |
|---|---|
| 0.18 | 10.92 |

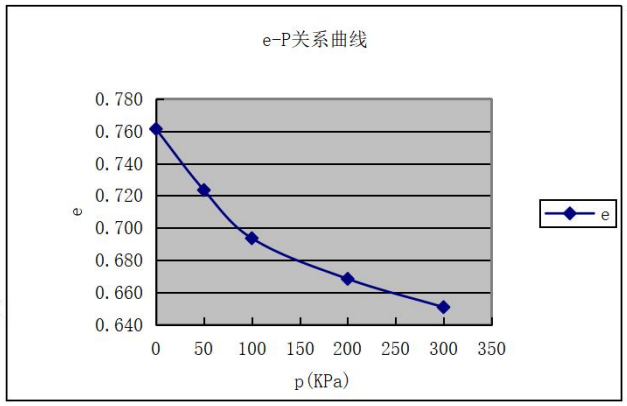


SLYTG25-047-06 ZK18-QT1

| p | e |
|---|---|
| 0 | 0.804 |
| 50 | 0.750 |
| 100 | 0.720 |
| 200 | 0.702 |
| 300 | 0.699 |


| 压缩系数 | 压缩模量 |
|---|---|
| 0.18 | 11.03 |

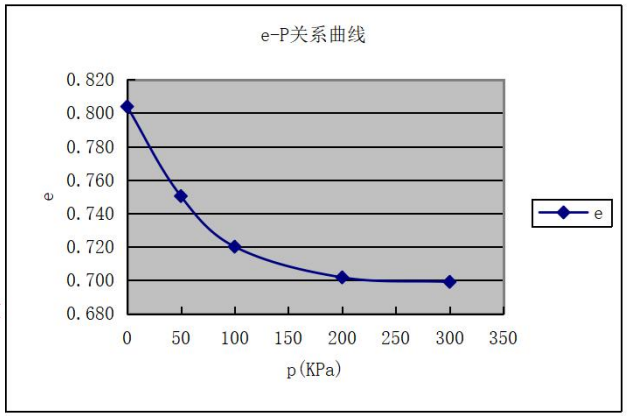


SLYTG25-047-07 ZK23-QT1

| p | e |
|---|---|
| 0 | 0.859 |
| 50 | 0.825 |
| 100 | 0.802 |
| 200 | 0.779 |
| 300 | 0.763 |


| 压缩系数 | 压缩模量 |
|---|---|
| 0.26 | 11.87 |

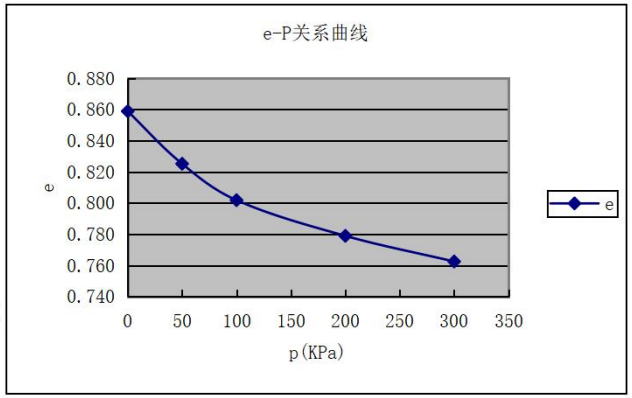


SLYTG25-047-08 ZK26-QT1

| p | e |
|---|---|
| 0 | 0.807 |
| 50 | 0.763 |
| 100 | 0.733 |
| 200 | 0.714 |
| 300 | 0.705 |

| 压缩系数 | 压缩模量 |
|---|---|
| 0.20 | 10.92 |

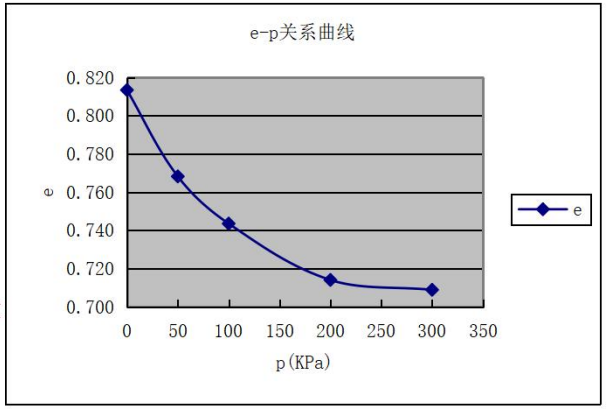


批准：颜平 审核：阮成清 试验：谭子幸

广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

# 土 工 试 验 报 告（固结试验e-p曲线）




委托单位 广西昇龙工程勘察设计检测有限公司

**工程名称：** 阳光幸福里 **收样日期** 2025年10月4日 **试验日期** 2025年10月5日 **报告日期** 2025年10月9日

SLYTG25-047-09 ZK32-QT1

| p | e |
|---|---|
| 0 | 0.776 |
| 50 | 0.751 |
| 100 | 0.727 |
| 200 | 0.696 |
| 300 | 0.665 |


| 压缩系数 | 压缩模量 |
|---|---|
| 0.36 | 7.88 |

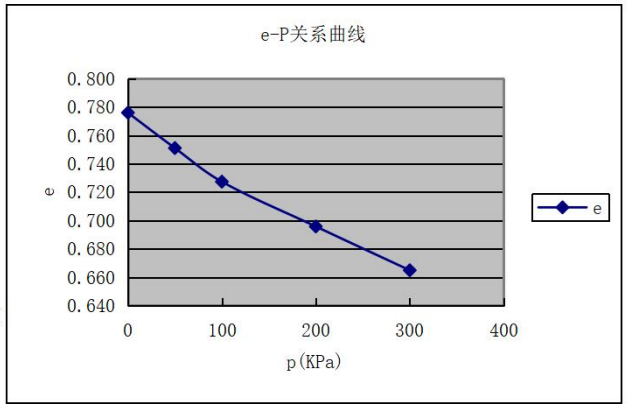


SLYTG25-047-10 ZK33-QT1

| p | e |
|---|---|
| 0 | 0.758 |
| 50 | 0.728 |
| 100 | 0.705 |
| 200 | 0.667 |
| 300 | 0.649 |


| 压缩系数 | 压缩模量 |
|---|---|
| 0.31 | 9.67 |

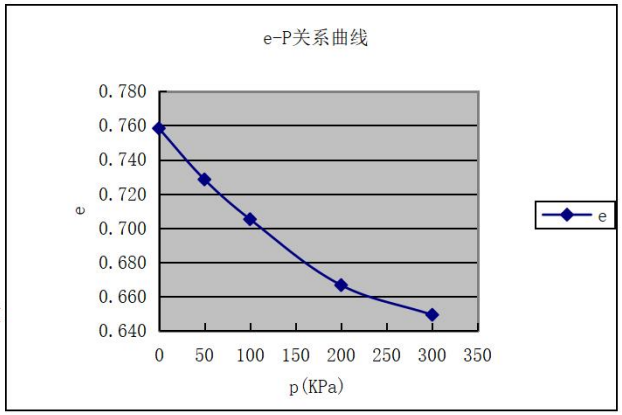


SLYTG25-047-11 ZK35-QT1

| p | e |
|---|---|
| 0 | 0.805 |
| 50 | 0.779 |
| 100 | 0.750 |
| 200 | 0.711 |
| 300 | 0.700 |


| 压缩系数 | 压缩模量 |
|---|---|
| 0.34 | 9.57 |

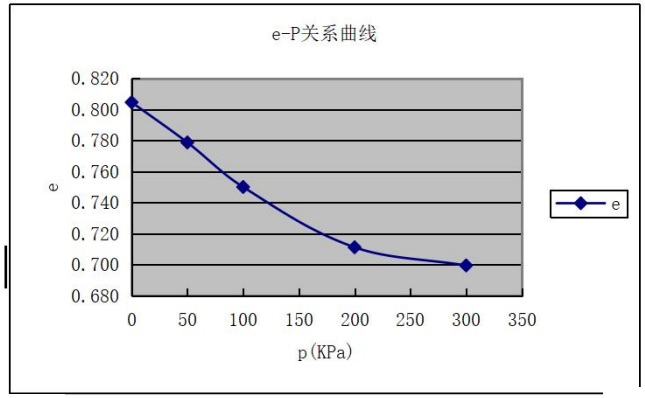


SLYTG25-047-12 ZK36-QT1

| p | e |
|---|---|
| 0 | 0.784 |
| 50 | 0.760 |
| 100 | 0.735 |
| 200 | 0.708 |
| 300 | 0.685 |

| 压缩系数 | 压缩模量 |
|---|---|
| 0.30 | 9.87 |

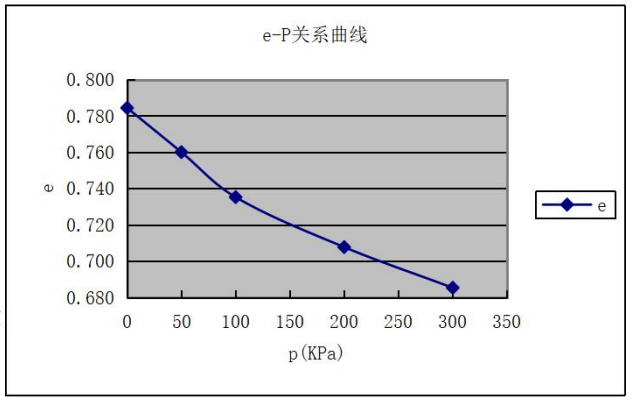


批准：颜平 审核：阮成清 试验：谭子幸
